



ผลการ

ติดตาม

ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

โทร/โทรสาร 0 4424 3090
ส.ป.มท. 36601

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถนน
มหาตมาคานธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000

เว็บไซต์ : <http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/>
E-mail : osm_ne1@moi.go.th

เนื้อหา

ความเป็นมา	3
ผลการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (ผลการท่อนี้,ผลการเบิกจ่าย)	4
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560	6
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	9
ผลการดำเนินงานจังหวัดนครราชสีมา	11
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560	12
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	14
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	15
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	19
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	20
- การติดตามในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา	22
ผลการดำเนินงานจังหวัดชัยภูมิ	26
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560	27
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	28
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	29
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	31
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	32
- การติดตามในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ	34
ผลการดำเนินงานจังหวัดบุรีรัมย์	43
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560	44
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	45
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	46
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	49
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	51
- การติดตามในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์	54
ผลการดำเนินงานจังหวัดสุรินทร์	60
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560	61
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	62
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	63
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	67
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	68
- การติดตามในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์	70
คณะผู้ติดตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	78

“แนวทางการออกติดตาม”
 เกร็ดการจัจัดซื้อจัดจ้าง
 งบลงทุน ผลการดำเนินงาน
 ผลการเบิกจ่าย รับทราบ
 ปัญหาและอุปสรรค และ
 หาแนวทางแก้ไข รับฟัง
 ข้อเสนอแนะ เกร็ดการ
 ดำเนินงาน และการ
 เบิกจ่าย งบประมาณทั้งใน
 รูปแบบเอกสารและใน
 ระบบ padme พร้อมลง
 พื้นที่ที่ประสบปัญหาการ
 ดำเนินงาน และอื่น ๆ

ความเป็นมา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้กำหนดให้จังหวัดภายในกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ หรือที่เรียกกันภายในกลุ่มว่า “กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์” รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ยังไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) เป็นประจำทุกวันที 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน จนกว่าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณจะแล้วเสร็จ

เพื่อเป็นการกระตุ้นการเร่งรัดการดำเนินงาน การก่อกนนี้ และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ๆ ให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ จึงกำหนดการติดตามการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2561 ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ ตามลำดับ

เป้าหมายการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภท	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รายจ่ายประจำ	33	55	77	98
รายจ่ายลงทุน	22	43	65	88
ภาพรวม	30	52	74	96

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในไตรมาสที่ 3 ภาพรวม ร้อยละ 74 ในรายจ่ายประจำร้อยละ 77 และรายจ่ายลงทุนไว้ ร้อยละ 65

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาตรา 60 งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด โดยตั้งงบประมาณให้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณ จำนวน 389,503,400 บาท ดังนี้

	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น
จังหวัดนครราชสีมา	113,155,200	67,683,210	35,632,390	9,839,600
จังหวัดชัยภูมิ	95,691,700	74,465,800	19,725,900	1,500,000
จังหวัดบุรีรัมย์	116,771,800	101,312,800	14,959,000	500,000
จังหวัดสุรินทร์	60,884,700	47,010,400	13,374,300	500,000
งบบริหาร ฯ	3,000,000	-	-	3,000,000
รวมทั้งสิ้น	389,503,400	290,472,210	83,691,590	15,339,600

หมายเหตุ : งบบริหารจังหวัดละ 500,000 บาท

การจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน

ผลการก่อหนี้ลงทุน ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำปีวงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณหลังปรับลด งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 389,503,400 บาท มีผลการก่อหนี้ลงทุนจำนวน 178,694,100 บาท และผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 106,289,452.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.99 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ที่กำหนดเนื่องจากโครงการที่เป็นงบรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่มีการก่อหนี้ผูกพันล่าช้าและ รายการ ที่โอนเปลี่ยนแปลงโดยใช้เงินยกเล็ก และเงินเหลือจ่ายที่ต้องขออนุมัติ จากส่วนกลางและ รอการทำ ความตกลงกับสำนักงบประมาณทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อหนี้ผูกพัน จำแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัด	งบจัดสรร	ก่อหนี้ลงทุน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เหลือจ่าย	ยังไม่เบิกจ่าย
นครราชสีมา	113,155,200	53,609,500	13,307,227.28	12.77	8,973,710	90,874,162.72
ชัยภูมิ	95,691,700	20,711,800	45,935,172.09	48.26	526,000	49,230,527.91
บุรีรัมย์	116,771,800	65,299,600	42,484,540.91	36.39	11,300	74,254,059.09
สุรินทร์	60,884,700	39,073,200	3,239,152.2	5.34	9,288.03	57,442,059.77
กลุ่มจังหวัดฯ	3,000,000	-	1,323,359.61	44.11	-	1,676,640.39
รวมทั้งสิ้น	389,503,400	178,694,100	106,289,452.09	27.99	9,520,298.03	273,477,449.88

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2561 กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณหลังปรับลดงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 389,503,400 บาท จำนวน 3 โครงการ 11 กิจกรรม มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 106,289,452.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.99 จำแนกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	303,045,968	86,268,189.25	29.39	207,086,462.78
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	145,809,268	52,492,771.73	36.35	91,902,480.30
	1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	107,586,000	24,288,000	24.40	75,235,000
	1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	21,936,960	3,014,480	13.74	18,922,480
	1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	17,310,840	918,460.24	5.31	16,198,079.76
	1.5 ส่งเสริมและพัฒนากาเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	10,402,900	5,554,477.28	53.50	4,828,422.72
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	58,677,132	12,769,321.94	21.77	45,871,900
	2.1 ยกกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	20,074,242	5,846,831.94	29.15	14,191,500
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	10,000,000	2,545,000	25.45	7,455,000
	2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นัก ท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	14,102,890	4,377,490	31.04	9,725,400
	2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	14,500,000	-	-	14,500,000
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	22,780,300	5,269,329.29	23.14	17,501,699
	3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่ นครชัยบุรีรินทร์	9,835,900	4,146,534	42.16	5,689,366
	3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรีรินทร์	12,944,400	1,122,795	8.68	11,812,333
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	5,000,000	1,982,611.61	39.65	3,017,388
	รวมทั้งสิ้น	389,503,400	106,289,452.09	27.99	273,477,449.88

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2561 กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 350,273,100 บาท สำนักงบประมาณปรับลด งบประมาณไม่จัดสรรจำนวน 1,274,000 บาท คงเหลืองบประมาณได้รับจัดสรรจำนวน 348,999,100 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 285,092,255.72 บาท มีเงินเหลือจ่ายทั่วไปจำนวน 41,656,164.60 คิดเป็นร้อยละ 92.76 จำแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้

	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณทั่วไป
จังหวัดนครราชสีมา	84,599,878	64,052,642	100	-	20,547,236
จังหวัดชัยภูมิ	82,971,382	75,207,189.07	94.36	4,491,015.68	3,273,177.25
จังหวัดบุรีรัมย์	91,824,800	90,390,566.64	100	-	1,434,233.36
จังหวัดสุรินทร์	86,603,040	53,446,178.47	95.06	17,759,664	15,397,197.53
กลุ่มจังหวัด ฯ	3,000,000	1,995,679.54	100	-	1,004,320.46
รวมทั้งสิ้น	348,999,100	285,092,255.72	92.76	22,250,679.68	41,656,164.60

ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 จังหวัด คือจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 จังหวัด คือจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ ในส่วนที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จเหตุผลที่ทำให้เกิดความล่าช้า ดังนี้

(1) จังหวัดชัยภูมิ ยังมีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการ คือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 3 รายการ

- รายการปรับปรุงการกักเก็บน้ำแก้มลิงกุดไข่นุ่นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ งบประมาณ 4,389,680 บาท ยังคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 2,926,651.18 ขณะนี้ผลงาน ร้อยละ 80 ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากมีน้ำท่วมขังช่วงพฤษภาคม คาดว่าในช่วงปลายมิถุนายนจะดำเนินการแล้วเสร็จ

- รายการปรับปรุงการกักเก็บน้ำแก้มลิงหนองสำโรงพร้อมอาคารประกอบ บ้านไร่ ตำบลลำชี อำเภอบ้านเขว้า งบประมาณ 2,448,000 บาท ยังคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 437,400 บาท ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 65 การดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากเป็นพื้นที่เกษตร ในช่วง พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2560 เกษตรกรไม่ไ้ระบายน้ำเนื่องจากเกรงว่าจะไม่มีน้ำ ทำการเกษตร ยังคงเหลืองานดินที่จะขุดอีก ร้อยละ 30 ซึ่งเป็นงาน จ้างเหมา ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

- รายการปรับปรุงฝายหินทิ้งบ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า งบประมาณ 9,726,000 บาท ยังคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 1,126,964.50 บาท ปลายมิถุนายนนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จ

(2) จังหวัดสุรินทร์ ยังมีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 3 รายการ

- รายการก่อสร้างสถานีด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชายทุ่ง ตำบลพรหมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 15,740,000 บาท เบิกจ่ายไป 7,229,256 บาท คงเหลือ 8,510,744 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

- รายการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 7,660,920 บาท อยู่ระหว่างแก้ไขงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจการจ้าง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน 2561

- รายการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ ค.อ.ร.ชนิดกลมพร้อมบ่อพัก สายถนนเส้นนิคมปราสาท ซอย 3 บ้านคุณसार ตำบลปรี้อ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร งบประมาณ 1,588,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย

ผลการออกติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14 โครงการ จำแนกเป็นรายโครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพับไป
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	25,525,628	24,766,260	100	-	759,368
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	8,295,200	8,257,162	100	-	38,038
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	6,709,104	6,709,104	100	-	-
4	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	78,149,002	54,935,805.87	73.91	20,662,679.68	2,550,516.45
5	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	17,945,000	5,424,540	100	-	12,520,460
6	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม	5,011,400	4,172,380	100	-	839,020
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่สู่สากล	6,631,800	6,079,370	100	-	552,430
8	โครงการเสริมศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กลางการซื้อขายผ้าไหมแห่งอาเซียน	1,260,000	1,258,000	100	-	2,000

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณทั่วไป
9	โครงการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัด นครชัยบุรีรินทร์	-	-	-	-	-
10	โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ	3,826,223	3,318,997	100	-	507,226
11	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนของภาครัฐและเอกชน	2,000,000	1,739,300	100	-	260,700
12	โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน	3,883,373	3,809,900	100	-	73,473
13	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม เพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน	103,230,110	100,333,137.31	98.44	1,588,000	1,306,774.69
14	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนระบบรางและเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์	81,532,260	60,406,575	100	-	21,125,685
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ	5,000,000	3,881,724.54	100	-	1,118,275.46
	รวมทั้งสิ้น	348,999,100	285,092,255.72	92.76	22,250,679.68	41,656,146.60

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ประจำปีงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2561 กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรจำนวน 6 โครงการ งบประมาณหลังปรับลดงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,826,670,500 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 2,311,954,210.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.40 ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 1,118,336,590.87 บาท เป็นรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัด	งบจัดสรรหลังปรับลด	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพบไป
นครราชสีมา	1,359,016,300	886,899,337.53	75.79	283,309,958.59	188,807,003.88
ชัยภูมิ	756,559,800	524,853,281.43	74.05	183,960,440.30	47,746,078.27
บุรีรัมย์	831,693,400	528,577,967.52	70.38	222,430,030.77	80,685,401.71
สุรินทร์	879,401,000	371,623,624.27	46.44	428,636,161.21	79,141,214.52
รวมทั้งสิ้น	3,826,670,500	2,311,954,210.75	67.40	1,118,336,590.87	396,379,698.38

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการคือ โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทยแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน และโครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย 1 โครงการคือโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำซู้ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (เหลือจ่ายน้ำท่วม งบประมาณ 2,963,300 บาท) โครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ส่วนใหญ่ดำเนินงานไปแล้วกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากเป็นรายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงใช้เงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิก นอกจากนี้โครงการด้านชลประทานมีลักษณะเป็นงาน ดำเนินการเองหลายรายการจึงทำให้ล่าช้า ประกอบกับสภาพของภูมิอากาศฝนตกน้ำท่วมขัง บางแห่งต้องรอให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกหรือใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อไป

ผลการออกติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) จำนวน 6 โครงการ จำแนกเป็นรายโครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพบไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์	2,841,070,800	1,651,812,008.03	67.14	808,262,245.65	311,885,246.32
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	114,686,100	103,844,371.20	96.50	3,764,092.30	1,478,736.50

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณทั่วไป
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	38,937,500	23,725,214.41	100	-	4,247,285.59
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	631,676,100	493,718,772.81	70.74	204,185,897.22	59,653,598.97
5	โครงการตามพระราชดำริ: ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีนทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	200,300,000	35,890,544.30	26.00	102,124,355.70	19,114,831
6	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วย บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนนอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแม่็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (เหลือจ่ายน้ำท่วม งบประมาณ 2,963,300 บาท)	(เงินเหลือจ่าย)	-	-	2,963,300	-
	รวมทั้งสิ้น	3,826,670,500	2,311,954,210.75	67.40	1,118,336,590.87	396,379,698.38

จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ออกติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 3 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 จังหวัดนครราชสีมา



งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา มีโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 69,927,698 บาท และได้รับสมทบจากจังหวัด 14,672,180 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับ 84,599,878 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500,000 บาท) ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 64,052,642 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.71 งบประมาณพบไป 20,547,236 บาท ร้อยละ 24.29 ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ยกเลิกดำเนินการ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 12,000,000 บาท เนื่องจากได้รับการทักท้วงกรณีหน่วยดำเนินการไม่มีการกิจกรรมตรงตามอำนาจหน้าที่ และได้นำงบประมาณ ที่ยกเลิกไปดำเนินการในกิจกรรมอื่นแล้ว

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพบไป
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิ คุณภาพดีสู่สากล	1,660,000	1,558,448	100	-	101,552
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตมันสำปะหลัง	150,000	125,152	100	-	24,848
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	1,352,000	1,352,000	100	-	-
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล	1,843,500	1,777,740	100	-	65,760
5	โครงการเสริมศักยภาพ การดำเนินงานศูนย์กลาง การซื้อขายผ้าไหมแห่งอาเซียน	1,260,000	1,258,000	100	-	2,000
6	โครงการแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัด นครชัยบุรีรินทร์	(12,000,000)	-	-	-	ยกเลิก
7	โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านการคมนาคม	20,552,198	20,547,802	100	-	4,396

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณฟัไป
	เพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน					
8	โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ทางบกสนับสนุนระบบรางและ เชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์	57,282,180 (341,160,000)	36,933,575	100	-	20,348,605
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน กลุ่มจังหวัด ฯ	500,000	499,925	100	-	75
	รวมทั้งสิ้น	84,599,878	64,052,624	100	-	20,547,236



งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560) จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรร งบประมาณดำเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 1,359,016,300 บาท ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 886,899,337.55 บาท ร้อยละ 75.79 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 283,309,958.59 บาท งบประมาณพันไป 188,807,003.88 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพันไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรีรินทร์	880,044,700	622,321,653.28	80.60	149,786,528.59	131,137,618.13
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	45,770,500	39,005,567.70	91.20	3,764,092.30	135,540
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	19,512,900	9,538,531.50	100	-	1,054,168.50
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มี คุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	213,388,200	180,143,040.75	86.70	27,634,982	37,364,846.25
5	โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิง สุนัขจรจัด นครชัยบุรีรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	200,300,000	35,890,544.30	26.00	102,124,355.70	19,114,831
	รวมทั้งสิ้น	1,359,016,300	886,899,337.53	75.79	283,309,958.59	188,807,003.88

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ มี 36 รายการหลัก งบประมาณ 391,382,300 บาท และรายการที่เป็นการขอใช้เงินยกเลิกรายการดำเนินงาน เงินเหลือจากการจัดสรร และจากเงินเหลือจ่ายอีก 6 รายการ เป็นงานดำเนินการเอง และจ้างเหมา มีการยกเลิกค่าความคุมงาน 2 รายการ เนื่องจากซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณ 516,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย 311,424,988.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.70 ยังคงเหลือที่ยังไม่แล้วเสร็จ 4 รายการคือ แก้มลิงหนองไผ่ 1, 2 แก้มลิงคลองอีสานเขียวพร้อมอาคารประกอบ อำเภอเมืองยาง และ แก้มลิงหนองบัวใหญ่ งานล่าช้า เนื่องจากผู้ควบคุมงานโยกย้าย ทำให้งานก่อสร้างชะงักไปชั่วระยะ สำหรับงานปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ติดขัดเรื่องการใช้พื้นที่ป่าเนื่องจากหมดอายุสัญญาการขอใช้พื้นที่ป่า ทำให้งานหยุดชะงักไม่สามารถดำเนินการได้ ขณะนี้ปัญหาได้แก้ไขโดยกรมชลประทานได้ขอต่ออายุสัญญาการขอใช้พื้นที่ป่าต่อกรมป่าไม้ สำหรับงานบริหารจัดการน้ำอีก 3 รายการ ซึ่งมีที่ทำการปกครองอำเภอเป็นหน่วยดำเนินงานยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐ นครชัยบุรีรินทร์ มี กิจกรรมที่ดำเนินการ 4 รายการ งบประมาณ 218,264,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 104,164,383.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.25 งานการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิ 200 แปลง เนื่องจากไม่ทันฤดูกาลผลิต จึงทำให้ไม่มีข้าวตรวจ ได้ยกเลิกและคืนงบประมาณ จำนวน 228,460 บาท สำหรับกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณภาพดีแบบครบวงจร เนื่องจากวัสดุที่ตั้งไว้เป็นครุภัณฑ์ ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ จัดซื้อได้เฉพาะไปสเตอร์ อยู่ระหว่างการส่งเอกสารเบิกจ่าย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพรวบรวมและแปรรูปข้าวในสหกรณ์การเกษตรยังคงเหลืองานเงินเหลือจ่าย ได้แก่เครื่องชั่ง ขนาด 100 ตัน ลานตาก ฉากเก็บพืชผล ของสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ มี 3 รายการ งบประมาณ 56,659,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 35,745,165 บาท ร้อยละ 73.50 งานส่วนใหญ่แล้วเสร็จและมีการส่งเงินคืน ยังคงมีกิจกรรมเพิ่มศักยภาพแปรรูปมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มมูลค่า งานก่อสร้างลานอบแห้งประสงค์ อาคารซังพร้อมเครื่องชั่งขนาดกลาง โรงเรือนสำหรับเก็บมันเส้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม

1.4 กิจกรรมปฏิรูปภาคการเกษตร มี 2 กิจกรรม งบประมาณ 195,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 170,100,117 บาท ร้อยละ 99.71 อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพื่อเบิกจ่าย



1.5 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม บูรณะสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทกภัย ตลอดจนป้องกันเหตุอุทกภัย เป็นกิจกรรมซ่อมแซมถนน และงานขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน 45 รายการ เป็นกิจกรรมการใช้จ่ายเงินช่วยเหลือจ่าย เงินยกเล็ก ก่อหนี้ผูกพัน 54,181,000 บาท เบิกจ่าย 887,000 บาท ร้อยละ 1.64 มีที่ทำการปกครองอำเภอเป็นหน่วยดำเนินการ

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีนครบวงจร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีนครบวงจรงบประมาณ 45,770,500 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 38,510,100 บาท ผลการเบิกจ่าย 31,848,440 บาท ร้อยละ 89.69 ยังคงค้างการส่งมอบน้ำเชื้อจากต่างประเทศเป็นเงิน 3,447,000 บาท ส่วนรายการฝึกอบรมยังคงค้างค่าวัสดุในการจัดการฝึกอบรม จำนวน 316,377.70 บาท ซึ่งเบิกไม่ทันปีงบประมาณและไม่สามารถกันเงินในปีดังกล่าว

2.2 กิจกรรมปรับรูปแบบการเลี้ยงแพะ งบประมาณ 4,604,400 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,501,127.70 บาท ร้อยละ 97.76 ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.3 กิจกรรมพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 200,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 200,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.4 กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรีนครบวงจร งบประมาณ 2,456,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง งบประมาณ 19,512,900 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่

3.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง (400 ราย) งบประมาณ 250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 183,324.00 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 809,900 บาท ผลการเบิกจ่าย 777,136.00 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5 รายการ ก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 5 แห่ง เจาะบ่อบาดาล 5 แห่ง รวมทั้งหมด 15 รายการ งบประมาณ 4,913,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,804,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.4 กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME 3 กลุ่ม งบประมาณ 12,900,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,133,071.50 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการยกเลิก



รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 12 รายการ งบประมาณ 5,307,100 บาท เนื่องจากมีข้อทักท้วงและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ

3.5 กิจกรรมจัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 640,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานงบประมาณ 213,388,200 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 7 กิจกรรม ได้แก่

4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 34,921,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 34,915,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นงานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญมีทั้งหมด 11 รายการ

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม งบประมาณ 107,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 100,964,120.75 บาท ร้อยละ 82.27 เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 6 สายทาง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีรายการเพิ่มเติมจากเงินยกเล็ก เงินเหลือจ่ายอีก 18 รายการ แล้วเสร็จ 9 รายการ และอยู่ระหว่างการตรวจรับและเบิกจ่ายอีก 5 รายการ

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน งบประมาณ 45,900,000 บาท ผลการ เบิกจ่าย 41,727,920 บาท ร้อยละ 87.65 เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 3 สายทาง และมีรายการเพิ่มเติมจากเงินยกเล็ก เงินเหลือจ่ายอีก 3 รายการ แล้วเสร็จ 2 รายการและอยู่ระหว่างการตรวจรับและเบิกจ่ายอีก 1 รายการ

4.4 กิจกรรม Amazing Thai Host งบประมาณ 2,500,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 200,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.5 กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของภาครัฐ งบประมาณ 12,000,000 บาท ผลการ เบิกจ่าย 2,100,000 บาท เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 14 รายการ ยกเลิกไป 11 รายการ ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

4.6 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 8,097,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 236,000 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

4.7 กิจกรรมมหกรรมการบินและการแข่งขันการบินนานาชาติ 2017 งบประมาณ 2,970,000 บาท ยกเลิกดำเนินการ เนื่องจากดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ และได้นำงบประมาณไปดำเนินการกิจกรรมอื่น

5. โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประมาณ 200,256,500 บาท สำหรับงาน ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ มูลค่าโครงการ 129,500,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 20 งวด จาก 90 งวด จำนวน 35,890,544.30 บาท ร้อยละ 26 สัญญาเริ่ม 28 กรกฎาคม 2560 จะสิ้นสุดสัญญาภายใน 22 กรกฎาคม 2561 ผลงาน 83% ประกอบด้วย

- 1. อาคารศูนย์พักพิงสุนัข (DC 01) จำนวน 1 หลัง
- 2. อาคารร้านอาหารและของที่ระลึก (DC 02, DC 03) จำนวน 1 หลัง
- 3. อาคารส่วนจัดแสดงสุนัข (DC) จำนวน 1 หลัง
- 4. อาคารคลินิกสุนัข (DC 05) จำนวน 1 หลัง
- 5. อาคารสำนักงานแผนกช่าง (DC 06) จำนวน 2 หลัง
- 6. อาคารเก็บอาหารสัตว์ (DC 07) จำนวน 2 หลัง
- 7. อาคารพักพิงสุนัข (DC 08) จำนวน 2 หลัง
- 8. อาคารที่พักอาศัย 32 ยูนิต (DC) จำนวน 1 หลัง
- 9. อาคารที่พักอาศัย 32 ยูนิต (DC) จำนวน 1 ชุด และ ผังบริเวณ



งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดนครราชสีมาได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 113,155,200 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 13,307,227.28 บาท ร้อยละ 12.77 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 90,874,163 บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน 35,632,390 บาท เบิกจ่าย 7,217,687.23 บาท งบรายจ่ายอื่น 9,839,600 บาท เบิกจ่าย 147,040 บาท งบลงทุน 67,683,210 บาท เบิกจ่าย 5,942,500 บาท งานส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีกิจกรรมที่ยกเลิกดำเนินการ ได้แก่ กิจกรรมก่อสร้างฝายนิคมเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมอาคารประกอบ บ้านคลองบง ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 9,800,000 บาท กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างดินในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง (การระเบิดดินดาน) งบประมาณ 3,500,000 บาท กิจกรรมสนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) งบประมาณ 5,775,100 บาท และการจัดงานรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว 1,568,000 บาท ซึ่งได้นำงบประมาณไปดำเนินกิจกรรมอื่นแล้ว

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	83,052,400	3,223,777.28	77.40	70,857,523
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	3,854,000	967,000	32.60	1,999,000
	1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	58,831,000	-	-	50,768,000
	1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	7,694,900	583,200	7.58	7,111,700
	1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	8,191,700	29,200	0.36	8,162,400
	1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	4,480,800	1,644,377.28	36.86	2,816,423
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	27,615,600	8,247,490	29.87	19,365,400
	2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	3,562,710	3,560,000	100	-
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	7,750,000	310,000	4.00	7,440,000
	2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	4,802,890	4,377,490	91.14	425,400
	2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	11,500,000	-	-	11,500,000
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	1,987,200	1,688,920	84.99	298,280
	3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่นครชัยบุรีรินทร์	1,737,200	1,438,920	82.83	298,280
	3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรินทร์	250,000	250,000	100	-
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	500,000	147,040	29.41	352,960
	รวมทั้งสิ้น	113,155,200	13,307,227.28	12.77	90,874,163

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 5 กิจกรรมได้แก่

1.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มี 1 รายการหลัก กิจกรรมก่อสร้างฝายนิคมเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม อาคารประกอบ บ้านคลองบง ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 9,800,000 บาท ต่อมาได้ยกเลิกดำเนินการ และมีรายการที่เป็นการขอใช้เงินยกเลิกการดำเนินงาน เงินเหลือจากการจัดสรร หรือจากเงินเหลือจ่ายเพิ่มเติมอีก 3 รายการ งบประมาณรวม 23,854,000 บาท เป็นงานดำเนินการเอง และจ้างเหมา มีผลการเบิกจ่าย 967,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.60

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 42,140,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย และต่อมามีรายการที่เป็นการขอใช้เงินยกเลิกการดำเนินงาน เงินเหลือจากการจัดสรร หรือจากเงินเหลือจ่ายเพิ่มเติมอีก 9 รายการ รวมเป็นงบประมาณสำหรับกิจกรรมนี้ 58,831,000 บาท

1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 14,300,900 บาท ต่อมาได้ยกเลิกดำเนินการ กิจกรรมสนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) งบประมาณ 5,775,100 บาท และการจัดงานรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว 1,568,000 บาท (งบประมาณเฉลี่ยจากจังหวัดบุรีรัมย์) รวมงบประมาณสำหรับกิจกรรมนี้ 7,694,900 บาท ผลการเบิกจ่าย 583,200 บาท ร้อยละ 7.58 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม

1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง งบประมาณ 6,127,000 บาท ต่อมาได้ยกเลิกกิจกรรมปรับปรุง โครงสร้างดินในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง (การระเบิดดินดาน) งบประมาณ 3,500,000 บาท(งบประมาณเฉลี่ยจากจังหวัดบุรีรัมย์) รวมงบประมาณสำหรับกิจกรรมนี้ 8,191,700 บาท ผลการเบิกจ่าย 29,200 บาท ร้อยละ 0.36

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 4,480,800 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,644,377.28 บาท ร้อยละ 36.86 ยังคงเหลือวัสดุวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะส่งมอบภายในมิถุนายน และงานจ้างที่ปรึกษานวัตกรรมอาหารนครชัยบุรีรินทร์

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 25,315,600 บาท ต่อมาได้มีการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายเพิ่มเติม รวมงบประมาณที่ได้รับ 27,615,600 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่



2.1 ยกกระต๊อบมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 3,762,000 บาท เบิกจ่าย 3,560,000 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ เป็นงานก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัด จำนวน 10 ชุด

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 7,750,000 บาท ผลการ เบิกจ่าย 310,000 บาท ร้อยละ 4.00 ปัญหาอุปสรรคเนื่องจากหน่วยงานมีบุคลากรจำนวนน้อย ต้องขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากจังหวัดในกลุ่มเพื่อให้ครบองค์ประกอบคณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง ซึ่งเพิ่งได้ครบจะได้ดำเนินการแต่งตั้งเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการต่อไป

2.3 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 2,303,600 บาท ต่อมาได้รับงบประมาณเหลือจ่ายเพิ่มเติม อีกจำนวน 2,499,200 บาท รวมเป็น งบประมาณ 4,802,890 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,377,490 บาท ร้อยละ 91.14 เป็นงานอบรม อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการโรมแรม หอพัก สถานบริการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนนี้

2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 11,500,000 บาท อยู่ ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการ เช่นเดียวกับข้อ 2.2 สำหรับกิจกรรมการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ปั่นจักรยาน Tour of Nakhonchaiyaburi ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 1,737,200 บาท ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน 250,000 บาท รวมเป็น งบประมาณสำหรับกิจกรรมนี้ 1,987,200 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่

3.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่นครชัยบุรีรินทร์ การผลิตเส้นไหมที่ดีและได้ มาตรฐาน งบประมาณ 1,737,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,438,920 บาท ร้อยละ 82.83

3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรินทร์ (การพัฒนา cluster ใหม่ นครชัยบุรีรินทร์ ซึ่ง เป็นงบประมาณที่ได้รับการเฉลี่ยจากจังหวัดชัยภูมิ) จำนวน 250,000 บาท ผล การเบิกจ่าย 250,000 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ


กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 โครงการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ดังนี้

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัย กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งานศูนย์ควบคุมคุณภาพน้ำเชื้อและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ งบประมาณ 1,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 533,177.28 บาท ร้อยละ 53.32 การจัดตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้ว ที่ชั้นล่าง อาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมายังคงค้างวัสดุวิทยาศาสตร์ (ได้แก่น้ำเชื้อโค เช่น พันธุ์รามันนาทิว แองกัส จากต่างประเทศ) ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบภายในมิถุนายน และมีครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ดังนี้

- ตู้เก็บของขนาด 1.20 x 0.58 x 1.80 เมตร
- โต๊ะอเนกประสงค์ขนาด 0.65 x 1.10 x 0.70 เมตร
- เก้าอี้สำนักงาน
- กล้องจุลทรรศน์ชนิดตัดแสงพร้อมอุปกรณ์
- ถังบรรจุไนโตรเจน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร
- ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร
- เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของน้ำเชื้อ
- เครื่องอุ่นแผ่นสไลด์บนกล้องจุลทรรศน์ (สเตตอวอร์มเมอร์)
- เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้





งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

2. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีนรินทร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ งานแก้มลิงบ้านเขว้า ระยะ 2 พร้อมอาคารประกอบและระบบเชื่อมโยงน้ำ ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา งบประมาณ 17,710,000 บาท (เงินเหลือจ่าย) ผลการเบิกจ่าย 5,524,533.18 บาท ร้อยละ 18.66 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากรายการพัฒนาระบบเชื่อมโยงน้ำระหว่างแก้มลิงบึงกระเสียว – แก้มลิงบ้านเขว้า และแก้มลิงพิมาน ตำบลก่าบัง อำเภอโนนไทย ซึ่งกิจกรรมนี้จะทำการขุดลอกบึงบ้านเขว้าที่ตื้นเขิน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถผันน้ำจากบึงพุดซาเข้ามายังแก้มลิงบึงกระเสียว บึงบ้านเขว้า และสามารถส่งต่อไปยังบึงพิมาน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่อำเภอโนนไทย ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างยังไม่ได้ลงงานเพื่อทำการขุดลอกบึงบ้านเขว้า สำหรับงานดำเนินการเอง เป็นงานวางท่อคอนกรีตเพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่เกษตรกรรมความยาว 1,140 เมตร เป็นงานท่อ box convert ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จและถมดินจะมีการปูหินบดอัดรถยนต์สามารถวิ่งบนแนวท่อได้ ปัจจุบันมีปัญหาบางช่วงที่ประชาชนไม่ยอมให้ใช้พื้นที่ โครงการชลประทานจะได้ประสานพื้นที่เพื่อทำการประชาคมกับราษฎรต่อไป





จังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ออกติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเมื่อ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมตาดโตน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ



งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 82,971,382 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500,000บาท) ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 75,207,189.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.36 ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4,491,015.68 บาท งบพับไป 3,273,117.25 บาท มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการ คือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 3 รายการ ได้แก่

- รายการปรับปรุงการกักเก็บน้ำแก้มลิงกุดไข่นุ่นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ งบประมาณ 4,389,680 บาท ยังคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 2,926,651.18 ขณะนี้ผลงาน ร้อยละ 80 ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากมีน้ำท่วมขังช่วงพฤษภาคม คาดว่าในช่วงปลายมิถุนายนจะดำเนินการแล้วเสร็จ

- รายการปรับปรุงการกักเก็บน้ำแก้มลิงหนองสำโรงพร้อมอาคารประกอบ บ้านไร่ ตำบลลำชี อำเภอบ้านเขว้า งบประมาณ 2,448,000 บาท ยังคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 437,400 บาท ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 65 การดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากเป็นพื้นที่เกษตร ในช่วง พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2560 เกษตรกรไม่ให้ระบายน้ำเนื่องจากเกรงว่าจะไม่มีน้ำทำการเกษตร ยังคงเหลืองานดินที่จะขุดอีก ร้อยละ 30 ซึ่งเป็นงาน จ้างเหมา ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

- รายการปรับปรุงฝายหินทิ้งบ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า งบประมาณ 9,726,000 บาท ยังคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 1,126,964.50 บาท ปลายมิถุนายนนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพับไป
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	5,871,800	5,863,800	100	-	8,000
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	2,582,000	2,571,400	100	-	10,600
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	1,270,200	1,270,200	100	-	-
4	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	42,719,002	35,665,789.07	91.93	4,491,015.68	1,562,197.25
5	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์	945,000	945,000	100	-	-
6	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก และ แหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม	525,000	0	-	-	525,000
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่สู่สากล	4,308,300	3,918,000	100	-	390,300
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ทางบกสนับสนุนระบบรางและเชื่อมต่อระบบ ไลจิสติกส์	24,250,080	23,473,000	100	-	777,080
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ	500,000	500,000	100	-	-
	รวมทั้งสิ้น	82,971,382	75,207,189.07	94.36	4,491,015.68	3,273,177.25

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560) จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 4 โครงการงบประมาณ 756,559,800 บาท ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เบิกจ่าย 524,853,281.43 บาท ร้อยละ 74.05 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 183,960,440.30 บาท เงินพับไป 47,746,078.27 บาท มีโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร และโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนที่เหลือยังอยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งกิจกรรม ที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย/เงินยกเลิก

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพับไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรินทร์	571,376,300	412,424,635.65	75,78	131,828,225.08	26,626,239.27
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ นครชัยบุรินทร์ครบวงจร	17,169,200	16,672,140	100	-	104,460
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	7,137,300	4,933,321	100	-	2,198,479
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล (รวมเงินเหลือจ่าย)	160,877,000	90,823,184.78	63.53	52,132,215.22	18,816,900
	รวมทั้งสิ้น	756,559,800	524,853,281.43	74.05	183,960,440.30	47,746,078.27



1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ มี 23 รายการหลัก งบประมาณ 407,308,700 บาท และรายการที่เป็นการขอใช้เงินเหลือจ่ายอีก 2 รายการ เป็นงานดำเนินการเอง และจ้างเหมา มีผลการเบิกจ่าย 265,226,876.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.86 ยังไม่เบิกจ่าย 131,828,225.08 บาท มี 13 รายการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 8 รายการ

1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีรินทร์ มี กิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 40,792,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 26,697,665.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.70 ยังไม่เบิกจ่าย 352,000 บาทยังคงค้างการส่งเบิกค่าชุดนิทรรศการ จำนวน 352,000 บาท

1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีรินทร์ มี 3 กิจกรรม งบประมาณ 19,275,600 บาท ผลการเบิกจ่าย 16,515,046 บาท ร้อยละ 100 กิจกรรมส่วนใหญ่แล้วเสร็จ

1.4 กิจกรรมปฏิรูปภาคการเกษตร มี 2 กิจกรรม งบประมาณ 104,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 103,985,047 บาท ร้อยละ 100 กิจกรรมส่วนใหญ่แล้วเสร็จ

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร งบประมาณ 17,169,200 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 15,551,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 15,162,520 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.2 กิจกรรมพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 320,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 312,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.3 พัฒนาตลาดโคเนื้อมีชีวิตและเนื้อโคคุณภาพ งบประมาณ 1,130,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,029,620 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.4 กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 168,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 168,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว



3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนงบประมาณ 7,137,300 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

3.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงใหม่ให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังใหม่สูง งบประมาณ 250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 250,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวใหม่ให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 1,334,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,305,936 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5 รายการ ก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 5 แห่ง เจาะบ่อบาดาล 2 แห่ง รวมทั้งหมด 12 รายการ งบประมาณ 4,913,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,070,485 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.4 กิจกรรมจัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 306,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน งบประมาณ 160,877,000 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่

4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 15,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 14,940,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นงานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญมีทั้งหมด 5 รายการ

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม งบประมาณ 22,500,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 11,810,000 บาท ร้อยละ 38.51 เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 2 สายทาง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการตรวจรับและเบิกจ่ายอีก 1 รายการ

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน งบประมาณ 116,977,000 บาท ผลการ เบิกจ่าย 61,709,184.78 บาท ร้อยละ 66.58 เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 3 สายทาง และมีรายการเพิ่มเติมจากเงินยกเล็ก เงินเหลือจ่ายอีก 4 รายการ แล้วเสร็จ 2 รายการและอยู่ระหว่างการตรวจรับ และเบิกจ่ายอีก 2 รายการ และยังมีงานที่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการอีก 2 รายการ สำหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4.4 กิจกรรม พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของภาครัฐ งบประมาณ 6,000,000 บาท บาท ผลการเบิกจ่าย 1,964,000 บาท ร้อยละ 46.11 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน 1 รายการ

4.5 กิจกรรมก่อสร้างอาคารที่พักบริการประชาชนของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 400,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 95,691,700 บาท ซึ่งต่อมาได้มีการเกลี่ยงบประมาณไปให้จังหวัดในกลุ่มดำเนินการ จึงคงเหลืองบประมาณที่ดำเนินการจริง 95,691,700 บาท ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เบิกจ่าย 45,935,172.09 บาท ร้อยละ 48.27 ยังไม่ได้เบิก 49,230,528 บาท สรุปได้ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	86,691,568.06	41,036,430.15	47.63	45,129,138
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	70,458,968.06	39,276,230	56.16	30,656,737.91
	1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	10,573,000	646,000	6.11	9,927,000
	1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	3,734,400	-	-	3,734,400
	1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	1,925,200	1,114,200	57.87	811,000
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	4,036,831.94	3,036,832	75.23	1,000,000
	2.1 ยกกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	2,286,831.94	2,286,831.94	100	-
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	750,000	750,000	100	-
	2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	1,000,000	-	-	1,000,000
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	4,463,300	1,675,050	37.53	2,788,250
	3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่ นครชัยบุรีรินทร์	3,213,300	1,425,050	44.35	1,788,250
	3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรีรินทร์	1,250,000	250,000	20.00	1,000,000
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ	500,000	186,860	37.37	313,140
	รวมทั้งสิ้น	95,691,700	45,935,172.09	48.27	49,230,528

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรมได้แก่

1.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มี 8 รายการ งบประมาณ 70,560,000 บาท และมีรายการที่เป็นการขอ ใช้เงินเหลือจ่ายเพิ่มเติมอีก 1 รายการ งบประมาณ 7,000,000 บาท รวมมีงบประมาณที่ดำเนินการจริงในกิจกรรมนี้ 70,458,968.06 เป็นงานดำเนินการเอง และจ้างเหมา มีผลการเบิกจ่าย 39,276,230.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.10 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 30,656,737.91 บาท

1.2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 11,515,000 บาท ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การจัดงานรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว ไปให้จังหวัดในกลุ่ม คงเหลือ งบประมาณในกิจกรรมนี้ 10,573,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 646,000 บาท ร้อยละ 6.11

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง งบประมาณ 2,645,000 บาท ต่อมาได้รับ เปลี่ยนงบประมาณจาก จังหวัดในกลุ่มเพื่อดำเนินการ รวมงบประมาณสำหรับกิจกรรมนี้ 3,734,400 บาทอยู่ในระหว่างเริ่มดำเนินการ

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 1,141,200 บาท ต่อได้รับสนับสนุนเงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินการเพิ่มเติม รวมงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมนี้ 1,925,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,114,200 บาท ร้อยละ 57.87 ยังคงเหลืองานจากงบเหลือจ่ายที่กำลังดำเนินการ

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 4,719,800 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

2.1 ยกกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 2,969,800 บาท เบิกจ่าย 2,286,831.94 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในสายทาง จำนวน 4 สายทาง

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 750,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 750,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.3 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 1,000,000 บาท อยู่ ระหว่างการดำเนินการหาผู้รับจ้าง เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ปั่นจักรยาน Tour of Nakhonchaiburin ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ครั้ง ไม่มีผู้มาเสนอราคา



3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 5,213,300 บาท ต่อมา มีการเกลี่ยงบประมาณไปให้จังหวัดในกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนา cluster ไหมนครชัยบุรีรินทร์งบประมาณสำหรับโครงการ 4,463,300 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่

3.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรีรินทร์ การผลิตเส้นไหมที่ดีและได้มาตรฐาน งบประมาณ 3,213,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,425,050 บาท ร้อยละ 44.35

3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์การพัฒนา cluster ไหมนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 2,000,000 บาท ต่อมา มีการเกลี่ยงบประมาณไปให้จังหวัดในกลุ่มคงเหลืองบประมาณสำหรับกิจกรรมนี้ 1,250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 250,000 บาท ร้อยละ 20


กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพรวบรวมและแปรรูปข้าวในสหกรณ์การเกษตรของสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ งบประมาณ 7,043,800 บาท ผลงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย

- เครื่องปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวขนาด 2 ตัน/วัน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,043,800 บาท
- โรงสีข้าวขนาด 6 – 8 ตัน/วัน พร้อมโรงคลุม งบประมาณ 3,000,000 บาท



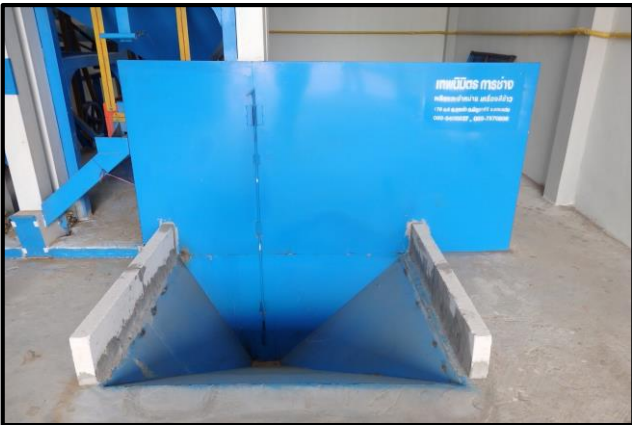

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

2. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีนทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 1,141,200 บาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะ แกะ อยู่ที่ หมู่ 11 บ้านบึงสง่า ตำบลตะหนักน อ.โนนสง่า จังหวัดชัยภูมิ มีสมาชิก 10 คน มีตลาดรองรับ มีพ่อค้าคนกลางรับซื้อแพะ ราคา ลูกขุนต่ำกว่า 10 กิโล ราคา กิโลละ 120 บาท มารับซื้ออาทิตย์ละ 2 ครั้ง เพื่อส่งไปขายสู่ลาว และ เวียดนาม โดยสมาชิกแต่ละคนจะได้รับ แพะ 11 ตัว ตัวผู้ 1 ตัว ตัวเมีย 10 ตัว เลี้ยงด้วยต้นกระถิน แพะกินทั้งใบและเปลือกลำต้น และหญ้าเนเปียร์ แพะต้องการสร้างคอกยกพื้นสำหรับนอนให้มี อากาศถ่ายเท มีการป้องกันแมลง เลี้ยงประมาณ 3 เดือน ก็สามารถขายได้ ประมาณ 20 – 30 กิโล ๆ ละ 130 บาท โดยประมาณ

สายพันธุ์แพะเนื้อและลักษณะประจำพันธุ์

การเลี้ยงแพะเนื้อเป็นการเลี้ยงแพะที่ค่อนข้างแพร่หลายในกลุ่มเกษตรกร เพราะเป็น ระบบการเลี้ยงที่ง่าย ต่อการจัดการเลี้ยงดูเอาใจใส่ และให้ผลตอบแทนเป็นเนื้อเพื่อจำหน่ายที่มีความ คุ่มค่าทางเศรษฐกิจสูง และพันธุ์ แพะเนื้อที่นิยมเลี้ยงกันในเขตประเทศไทยมีอยู่หลากหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์บอร์ พันธุ์แองโกรา พันธุ์แคชเมียร์ พันธุ์ แบล็คเบงกอล เป็นต้น



แพะพันธุ์บอร์เพศผู้



แพะพันธุ์บอร์เพศเมีย

พันธุ์บอร์ (Boer) ปัจจุบันประเทศไทยนิยมเลี้ยงแพะพันธุ์นี้เพื่อผลิตเป็นแพะเนื้อมาก ขึ้น เพราะเป็นแพะ เนื้อที่มีขนาดรูปร่างใหญ่ ลำสัน มีลำตัวใหญ่ยาวและกว้าง มีกล้ามเนื้อมาก และมีลักษณะของกระดูกโครงร่างใหญ่ แข็งแรง ลักษณะสีลำตัวเป็นสีขาวมีสีน้ำตาลแดงที่หัวและ คอหัวโหนกนูน ตั้งจุกโตน่งและงุ้มลง เขาเอนไปด้านหลัง และงอโค้งลงด้านล่าง ใบหูยาวและห้อยลง มีเครา แต่ไม่มีติ่ง (Wattle) ที่ใต้คอ น้ำหนักตัวเฉลี่ยของตัวผู้อยู่ที่ ประมาณ ๗๐-๘๐ กิโลกรัม ส่วนตัว เมียมี่น้ำหนักตัวเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๐-๖๕ กิโลกรัม แม่แพะมีอัตราการให้ลูก แผลดสูง โดยมีจำนวนลูก ๒-๓ ตัวต่อครอกแพะพันธุ์นี้มีข้อดีในการเลี้ยงเป็นแพะเนื้อเพราะมีขนาดใหญ่ ให้เนื้อมาก หนึ่งจะมีคุณภาพดี อัตราการเจริญเติบโตดีหากมีการดูแลให้อาหารชั้นเสริมแต่มีข้อด้อยในเรื่องของการที่ แม่แพะให้นม น้อยไม่เพียงพอในการเลี้ยงลูกแฝด



แพะพันธุ์แองโกราเทศผู้



แพะพันธุ์แองโกราเทศเมีย

พันธุ์แองโกรา (Angora) เป็นแพะที่มีลักษณะรูปร่างขนาดเล็ก มีความสูงจากหัวไหล่ประมาณ ๕๐- ๖๐ เซนติเมตร มีขนค่อนข้างยาวเมื่อเทียบกับพันธุ์อื่นๆ เส้นขนเป็นปุยละเอียดอ่อนนุ่ม ในต่างประเทศจึงนิยม เลี้ยงเพื่อเป็นแพะขน หัวมีลักษณะแบน ตั้งจมูกลาดตรง มีเขาเอนไปด้านหลัง หูตก มีเครา แต่ไม่มีติ่ง (Wattle) ใต้คอ น้ำหนักตัวในเพศผู้เฉลี่ยอยู่ที่ ๓๕- ๕๕ กิโลกรัม น้ำหนักตัวในเพศเมียเฉลี่ยอยู่ ๓๐-๔๐ กิโลกรัม จำนวนลูก ๑ ตัวต่อครอก แพะพันธุ์นี้มีข้อด้อยในแง่ที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักตัวน้อย หากปล่อยให้แพะเล็มอยู่ในแปลงหญ้าจะหากินไม่เก่ง แต่ชอบหากินตามพุ่มไม้ป่าละเมาะมากกว่า และจากการที่เป็นแพะที่มีขนยาว หากเลี้ยงในเขตที่มีอากาศร้อน มากแพะจะเครียดจากความร้อน ขนพันกันทำให้สกปรกง่ายจึงต้องตัดขนปีละ ๒ ครั้ง



แพะพันธุ์แคชเมียร์

พันธุ์แคชเมียร์ (Cashmere) เป็นแพะที่มีรูปร่างขนาดใหญ่ มีความสูงจากหัวไหล่เฉลี่ย ๖๐-๘๐ เซนติเมตร ขนยาวเป็นมันละเอียดมีสีขาว หัวมีลักษณะแบน ตั้งจมูกลาดตรงมีเขายาวเอนไปด้านหลัง ใบหูตั้งตรง และขนานไปกับพื้น ไม่มีติ่งใต้คอ น้ำหนักตัวเฉลี่ยของตัวผู้อยู่ที่ ๕๐-๖๐ กิโลกรัม ตัวเมียอยู่ที่ ๔๐-๕๐ กิโลกรัม แพะพันธุ์นี้มีข้อดีในการเลี้ยงเป็นแพะเนื้อที่มีขนาดกลางหนังจะมีคุณภาพดีใช้ทำกระเป๋า เครื่องหนังได้ดี ขนยาวละเอียดใช้ทอเป็นเครื่องนุ่งห่มได้ แต่มีข้อด้อยในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีอากาศ ร้อนได้ยากเพราะเป็นแพะที่ชอบอยู่ในสภาพอากาศหนาวมากกว่า และพันธุ์นี้จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้าคือประมาณ ๒๐-๒๔ เดือนขึ้นไป



แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล

พันธุ์แบล็คเบงกอล (Black Bengal) เป็นแพะที่มีขนาดเล็ก มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย บังกลาเทศ มีสีดำสนิทตลอดลำตัวซึ่งพบเป็นส่วนมากในแพะพันธุ์นี้ แต่อาจจะพบสีอื่นได้บ้างคือ สีขาว สีน้ำตาล สีขาวปน ดำ หรือสีน้ำตาลปนดำ ลักษณะขนสั้นเป็นมันเงาตั้งมูกลาดตรง หน้าเล็กสั้น มีเขาและมีเคราทั้งตัวผู้และตัวเมีย ใบหูมีขนาดเล็กสั้น มีความสูงจากหัวไหล่เฉลี่ย ๕๐-๖๐ เซนติเมตร น้ำหนักตัวเฉลี่ยของตัวผู้อยู่ที่

ที่ ๒๐-๓๕ กิโลกรัม ตัวเมียอยู่ที่ ๑๕-๒๐ กิโลกรัม แพะพันธุ์นี้มีการให้ลูกแฝดสองแฝดสามสูงมาก และบางครั้งอาจได้ลูกแฝดถึงสี่ตัวก็ได้ แพะพันธุ์นี้มีข้อดีเด่นในเรื่องของการเลี้ยงเป็นแพะเนื้อที่มีขนาดเล็ก และให้หนังที่นุ่มมีคุณภาพดีเลิศและมี มูลค่าสูง ใช้ทำกระเป๋า เครื่องหนังได้ดี ประเทศไทยรู้จักกับแพะพันธุ์นี้เพิ่มมากขึ้นเมื่อซึ่งรัฐบาลประเทศ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศที่ได้น้อมเกล้าถวายพ่อแม่พันธุ์แพะพันธุ์แบล็คเบงกอลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ พระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลให้แก่กรมปศุสัตว์นำไปศึกษาวิจัย และปรับปรุงพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้แก่เกษตรกรต่อไป ในปัจจุบันนี้ได้มีการศึกษาและขยายพันธุ์แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและคุณค่าทางเศรษฐกิจต่างๆได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตของลูกแพะ ซึ่งมีการเจริญเติบโตที่ดีและรวดเร็ว ศักยภาพ ระบบสืบพันธุ์ดี มีความสามารถผสมติดสูง การให้ผลผลิตเนื้อซึ่งเป็นเนื้อคุณภาพดี มีความนุ่ม มีกลิ่นและรสชาติดี ไขมันน้อย และให้ปริมาณน้ำนมมากพอเพื่อใช้สำหรับการเลี้ยงลูกที่มีจำนวนมากได้ แพะพันธุ์บอร์เพคผู้ แพะพันธุ์บอร์เพคเมีย แพะพันธุ์เอกราเพคผู้ แพะพันธุ์เอกราเพคเมีย แพะพันธุ์แคชเมียร์ แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

แพะพื้นเมือง (Native goats) แพะพันธุ์พื้นเมืองที่


เลี้ยงในประเทศไทยจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เป็นแพะที่มีขนาดเล็ก มีการเลี้ยงและขยายพันธุ์กันอย่างแพร่หลายในแถบชนบทในเขตภาคใต้ของประเทศไทย โดยมากแพะพื้นเมืองที่มีอยู่มีการสันนิษฐานว่าการนำแพะเข้ามาเลี้ยงนั้น ได้มาจากสายพันธุ์แพะในประเทศอินเดีย และประเทศมาเลเซีย แพะพันธุ์พื้นเมืองในภาคใต้มีลักษณะคล้ายกับแพะพันธุ์กัตจังหรือแกมบิง กัตจัง (Katjang หรือ Kacang หรือ Kambing Katjang) ของประเทศ



แพะพื้นเมือง

มาเลเซีย ซึ่งแพะทางภาคใต้เมื่อโตเต็มวัยจะมีน้ำหนักประมาณ 20-25 กิโลกรัม ความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร โดยมากกว่าร้อยละ 65 ของแพะในภาคใต้จะมีสีดำ น้ำตาล หรือน้ำตาลสลับดำที่เหลืองมีสีขาวหรือเหลือง มีเขาและขนเกรียน มีตั้งได้คอ แพะเพศเมียเมื่อโตเต็มวัยจะมีปมที่ขาหน้าอยู่สูงจากขาประมาณ 48.5 เซนติเมตร ส่วนแพะในแถบภาคตะวันตก เป็นแพะมาจากประเทศอินเดีย หรือปากีสถาน มีลักษณะรูปร่างใหญ่ แพะเพศเมียอายุ 1 ปี จะมีน้ำหนักประมาณ 12-13 กิโลกรัม ด้วยเหตุผลของการเผยแผ่ศาสนาและวัฒนธรรม การเลี้ยงแพะของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม การเลี้ยงแพะในเขตภาคใต้ของประเทศไทยนั้น มักจะเป็นการ เลี้ยงแบบปล่อยให้หากินไปตามพื้นที่ที่รกร้าง เรียกวสวนไร่เนา ทุ่งหญ้าสาธารณะ เขตสวนยาง หรือป่าพรุ เป็นต้น

แพะพื้นเมืองเป็นแพะที่มีขนาดเล็ก ลักษณะของแพะมักจะค่อนข้างแปรผันมาก ทั้งในส่วนของขนาด รูปร่าง และสีขนของลำตัวแพะ คือมีมากมายหลายสีตั้งแต่ สีเหลือง แดง น้ำตาลแดง น้ำตาลเข้ม ดำ หรืออาจมี ลักษณะแบบสีผสม เช่น ขาวน้ำตาล ขาวดำ น้ำตาลดำ อาจพบลำตัวแพะมีลายจุดหรือลายเป็นวง เป็นแต้ม หรือมี ลายกระด้างกระดำ มีการผสมสีกันจนสีของลำตัวดูประอะไปทั้งตัว เป็นต้น ลักษณะนิสัยแพะพื้นเมืองจะค่อนข้างร่าเริงและมีความอดทนสูงต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหลาย อย่าง เช่น สภาพอากาศร้อน หรือความชื้นที่มีมากจากสภาพฝนตกชุกในเขตภาคใต้ของไทย แพะพื้นเมืองมีขนาดเล็กจึงทำให้ปราดเปรียว คล่องตัวในการชอกแซกหากินใบไม้ตามพุ่มไม้และปีนป่ายคล่องแคล่ว เชื่อง ไม่ตื่นคน หากินเก่ง กินอาหารได้หลากหลายทั้งผลพลอยได้ทางการเกษตร เศษพืชผัก หรือเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน แพะพื้นเมืองจะค่อนข้างเป็นสัตว์เร็ว สามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดปี แม่แพะจะให้ลูกประมาณ 2 ตัว/การตั้งท้อง และบางตัวสามารถให้ลูกได้ถึง 2 ครั้ง/ปี ให้ผลผลิตทั้งเนื้อและนมต่ำ แต่ก็เลี้ยงลูกเก่ง สอนลูกให้หากินได้เร็ว ซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของแพะ พื้นเมืองนั่นเอง



แพะลูกผสมพันธุ์แพะเนื้อ



แพะลูกผสมพันธุ์แพะนม

แพะลูกผสม (Mixed breed) เป็นลูกแพะที่เกิดจากการผสมพันธุ์ของพ่อแม่แพะต่างพันธุ์ซึ่งอาจเป็นการ ผสมพันธุ์กันระหว่างพันธุ์ชาเนกกับพันธุ์แองโกลนูเบียน พันธุ์ชาเนกกับพันธุ์พื้นเมือง หรือพันธุ์ชาเนกกับพันธุ์บอร์ เป็นต้น การปรับปรุงพันธุ์ ให้ได้ลูกผสมระหว่างสายพันธุ์แท้ทั้งของแพะเนื้อและแพะนมเข้าด้วยกันทำขึ้นเพื่อ จุดประสงค์ในแง่ของการใช้ประโยชน์จากข้อดี และลดข้อด้อยของสายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์แท้แต่ละพันธุ์ ดัง ตัวอย่างเช่น การผสมพันธุ์ระหว่างแพะเนื้อกับแพะนมจะทำให้ได้ลูกที่มีขนาดใหญ่ใช้เป็นแพะเนื้อจะให้คุณภาพดีมี เนื้อมาก และยังเกิดลักษณะเด่นของแพะนมที่ให้นมมากทำให้มีน้ำนมเลี้ยงลูกได้ดี และมีนมเพียงพอที่จะใช้ในการ เลี้ยงดูลูกที่เกิดเป็นลูกแฝดสองหรือแฝดสามในแต่ละครอก ช่วยให้ลูกที่เกิดมาได้กินนมมากเพียงพอ ทำให้ลูกมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีและรวดเร็ว และยังช่วยให้ลูกแพะ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง อีกทั้งหากมีการผสมพันธุ์ แพะสายพันธุ์แท้กับแพะพื้นเมือง ลูกผสมที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในเขตร้อนได้ดี มีความทนต่อโรค และแมลงที่มักพบได้ในพื้นที่เขตร้อนชื้น รวมถึงแพะยังจะมีการเป็นหนุ่มเป็นสาวได้เร็วตามลักษณะเด่นในเรื่องของ ระบบสืบพันธุ์ที่มีในแพะพื้นเมือง สามารถช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่เป็นตัวลูกแพะที่เพิ่มจำนวนขึ้นในฝูงได้อย่าง รวดเร็วในระยะเวลาไม่นาน อีกทั้งแม่แพะจะเลี้ยงลูกเก่ง มีการดูแลลูกได้ดีทำให้ลูกมีน้ำหนักตัวที่ดี เมื่อถึงช่วงอายุ หย่านม

สมาชิกเกษตรกรกลุ่มโนนสง่า ประกอบด้วย

1. นายสิน อาชา 353/2 ม.8 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ (ประธานกลุ่ม)
2. นางละออ ตาไม้ 353/3 ม.8 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
3. นายชัชวาล สร้อยสกุลวงศ์ 176/2 ม.8 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
4. นายอุทัย มูนลาด 363/8 ม.8 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
5. นายวสันต์ หมั่นคำ 127 ม.11 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
6. นส.สมหมาย กอแก้วกลาง 134 ม.8 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
7. นส.ณิชาภา ธรรมณีย์ 44 ม.8 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
8. นายมีชัย มะโนราษฎร์ 112 ม.7 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
9. นางจำปี ธนาวร 144 ม.14 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
10. นายภาสกร แก้วกำเนิด 39 ม.11 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ





งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์ กิจกรรมหลักที่ 6 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 2,969,800 บาท รายการก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว สายทาง ชบ 3002 แยกทางหลวง 201 – บ้านเขว้า อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย

- 1) ป้าย Over Hang Sign (ชนิดฐานแม่) เป็นป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 4 ชุด ตั้งอยู่ที่ กม 15+000.000 กม ที่ 13+700.000 กม.ที่ 0+250.000 และ กม. ที่ 0+300.000
- 2) ป้าย น.2 (3 แผ่น/ชุด) จำนวน 6 ชุด ตั้งอยู่ที่ กม. ที่ 14+750.000กม. ที่ 13+850.000 กม. ที่ 9+750.000กม. ที่ 11+000.000กม. ที่ 5+500.000กม. ที่ 4+500.000กม.



จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามระดับพื้นที่รายจังหวัด โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีก่อนที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จเมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมฝายคำ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์



งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดบุรีรัมย์ มีโครงการ ที่ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 91,824,800 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500,000 บาท) ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 90,390,566.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.44 งบประมาณ 1,434,233.36 บาท ร้อยละ 1.56 จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพับไป
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	8,052,500	7,961,224	100	-	91,276
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	5,563,200	5,560,610	100	-	2,590
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	3,256,104	3,256,104	100	-	-
4	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	12,000,000	11,040,760.80	100	-	959,239.20
5	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	3,500,000	3,484,540	100	-	15,460
6	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม	3,524,400	3,398,400	100	-	126,000
10	โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ	1,576,223	1,456,223	100	-	120,000
12	โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน	3,883,373	3,809,900	100	-	73,473
13	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน	49,969,000	49,922,804.84	100	-	46,195.16
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ	500,000	500,000	100	-	-
	รวมทั้งสิ้น	91,824,800	90,390,566.64	100	-	1,434,233.36

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการจัดสรร งบประมาณดำเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 831,693,400 บาท ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 528,577,967.52 บาท ร้อยละ 70.38 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 222,430,030.77 บาท งบประมาณพบไป 80,685,401.71 บาท ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่แล้วเสร็จ ยังคงเหลืองานพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ และยังคงเหลืองานที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย เงินยกเล็ก ซึ่งอยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพบไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรีรินทร์	681,798,200	385,151,018.43	72.16	148,560,330.77	77,868,750.80
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	22,580,300	21,204,677.50	100	-	222.50
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	6,314,900	3,252,752.29	100	-	678,147.71
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	121,000,000	116,006,219.30	61.10	73,869,700	2,138,280.70
5	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วย บ้านหัวหนองหมู่ที่ 8 ตำบลดอนนอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (เหลือจ่ายน้ำท่วม งบประมาณ 2,963,300 บาท)	(เหลือจ่าย)	2,963,300	100	-	-
รวมทั้งสิ้น		831,693,400	528,577,967.52	70.38	222,430,030.77	80,685,401.70



1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ มี 4 กิจกรรมหลัก งบประมาณรวม 681,798,200 บาท เบิกจ่ายไป 385,151,018.43 คิดเป็นร้อยละ 72.16 งบประมาณพับไป 77,868,750.80 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ มีจำนวน 33 รายการ งบประมาณรวม 466,918,200 บาท ก่อหนี้ผูกพันและดำเนินการเองรวม 404,509,428.18 บาท เบิกจ่ายดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 14,954,636.78 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 45,842,484.6 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 22 รายการ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกรายการ 255,949,097.41 คิดเป็นร้อยละ 63.27 ผลงานส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละประมาณ 70 – 90 มี 1 รายการที่ดำเนินการล่าช้าที่สุด คือรายการ อาคารบังคับน้ำบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 6,90,000 บาท ผลงานอยู่ที่ร้อยละ 62 เนื่องจาก มีฝนตกชุก จึงทำให้งานดำเนินการล่าช้า

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีรินทร์ มี 4 กิจกรรม งบประมาณ 99,743,180 บาท มีผลการเบิกจ่าย 43,552,019.17 บาท

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีรินทร์ มี 2 กิจกรรม งบประมาณ 11,131,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย 10,535,600 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร มี 2 กิจกรรม งบประมาณ 104,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 75,114,301.85 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร มี 2 กิจกรรมหลัก งบประมาณรวม 22,580,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 21,204,677.50 งบประมาณพับไป 222.50 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 22,312,300 บาท เบิกจ่ายไป 20,936,900 บาท

2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ่ายไป 99,777.50 บาท



3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน มี 4 กิจกรรมหลัก งบประมาณรวม 6,314,900 บาท เบิกจ่ายไป 3,252,752.29 บาท งบประมาณพับไป 678,147.71 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง งบประมาณ 250,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 234,840 บาท

3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 779,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย 637,842.29 บาท

3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่ด้วยพลังงานทดแทน งบประมาณ 2,087,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 890,000 บาท

3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาดันแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME 3 กลุ่ม งบประมาณ 2,558,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 908,000 บาท

3.5 กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 582,070 บาท

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล มี 4 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 121,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 116,006,219.30 บาท งบประมาณพับไป 2,183,280.70 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มี 4 รายการ งบประมาณรวม 15,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 13,189,504.04 บาท งบประมาณพับไป 1,810,495.96 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

4.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม มี 2 รายการ งบประมาณ 74,650,600 บาทดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1 รายการ งบประมาณ 30,000,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 29,962,000 บาท งบประมาณพับไป 38,000 บาท และเป็นรายงานที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย 1 รายการ งบประมาณ 44,650,600 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลงานคิดเป็นร้อยละ 18

4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน มี 3 รายการ งบประมาณรวม 96,232,815.26 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1 รายการ งบประมาณ 70,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 69,355,415.26 บาท งบประมาณพันไป 130,784.74 บาท และเป็นรายงานที่ใช้เงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิกโอนเปลี่ยนแปลง 3 รายการ มีผลความคืบหน้า ดังนี้ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 1 รายการ งบประมาณ 13,946,400 บาท อยู่ระหว่างตรวจรับ 1 รายการ งบประมาณ 5,490,000 บาท อีก 1 รายการ งบประมาณ 7,441,000 บาท ยังไม่สามารถ ก่อหนี้ผูกพันได้เนื่องจาก ผู้รับจ้างได้เปลี่ยนสถานภาพจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นนิติบุคคล ขณะนี้ อยู่ระหว่างขออนุมัติผ่อนผัน ไม่ยกเลิกผลการประกวดราคาและดำเนินการต่อไปในนามบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

4.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอพระราชรัฐ รายการ ก่อสร้างป้ายหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนพร้อมตกแต่งบริเวณ ติดตั้งโคมไฟเสาหงส์ ชุมชนสายยาว ตำบลลุดงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 1,900,000 บาท ขณะนี้ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียน และอยู่ระหว่างวินิจฉัยของกรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างรอการแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงจากกรมการพัฒนาชุมชน

5.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำซุง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำซุง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร งบประมาณ 2,963,300 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 116,771,800บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 42,484,540.91 บาท ร้อยละ 36.42 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 74,162,059.09 บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน 14,959,000 บาท เบิกจ่าย 4,870,474.33 บาท งบรายจ่ายอื่น 500,000 บาท เบิกจ่าย 210,000 บาท งบลงทุน 101,312,800 บาท เบิกจ่าย 37,404,066.58 บาท ขณะนี้งานส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน ซึ่งยังอยู่ระหว่าง การก่อสร้างผูกพัน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ไม่ขอรับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์	94,488,200	-	39,884,306.82	42.99	52,885,993.18
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	39,200,000	-	12,180,066.58	33.16	24,547,033.42
	1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง	49,000,000	-	24,288,000	49.82	24,467,000
	1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	2,286,100	-	1,139,280	49.84	1,146,820
	1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	3,614,400	-	889,260.24	24.60	2,725,139.76
	1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	1,387,700	-	1,387,700	100	-
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์	16,644,700	21,900	750,000	4.51	15,861,500
	2.1 ยกกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	9,594,700	21,900	-	-	9,561,500
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว นครชัยบุรีรัมย์	750,000	-	750,000	100	-
	2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว นครชัยบุรีรัมย์ (เหลือจ่าย)	(เหลือจ่าย)	-	-	-	5,300,000

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ไม่ขอรับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
	2.4 ส่งเสริมการตลาดและ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	1,000,000	-	-	-	1,000,000
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	6,856,800	-	1,640,234.09	23.92	5,216,565.91
	3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต และแปรรูปใหม่ นครชัยบุรีรินทร์	3,606,800	-	1,258,167.09	34.88	2,348,632.91
	3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรีรินทร์	3,250,000	-	382,067	11.76	2,867,933
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	500,000	-	210,000	42.00	290,000
	รวมทั้งสิ้น	116,771,800	21,900	42,484,540.91	36.39	74,254,059.09

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ งบประมาณรวม 95,488,200 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 39,884,306.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.99 มี 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร งบประมาณ 39,200,000 บาท เบิกจ่ายแล้วดำเนินการโดย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ มี 3 รายการ เป็นงานดำเนินการและมีจ้างเหมา ผลงานส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 50 เบิกจ่ายไป 12,180,066.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.16

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดำเนินการโดย แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ มี 2 รายการ งบประมาณรวม 49,000,000 บาท รายการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางหลวงหมายเลข 3308 (ถนนสุริยะวิถี) อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ – อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 24,500,000 บาท ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากผู้รับจ้างมีการเปลี่ยนสภาพไปเป็นนิติบุคคล จึงต้องหารือกับกรมบัญชีกลาง และรายการก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสายโท 6 ใต้ – ช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 24,288,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 2,286,100 บาท ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ มี 4 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ คือ รายการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด งบประมาณ 1,127,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 รายการ คือ รายการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น งบประมาณ 27,100 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน รายการติดตามผลการดำเนินงาน การถอดบทเรียน การประชาสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินโครงการ งบประมาณ 636,000 บาท เบิกจ่ายไปเพียง 12,280 บาท และรายการตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ งบประมาณ 496,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างคัดเลือกเกษตรกร ยังไม่ดำเนินการ คือรายการ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพหลักในการยืมเงินเพื่อนำมาดำเนินการ จึงต้องรอการจัดสรรจากจังหวัดนครราชสีมา

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง งบประมาณรวม 3,614,400 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 3,614,400 บาท ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ มี 3 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รายการ คือรายการสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เอง งบประมาณ 480,000 บาท และดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเบิกจ่าย รายการ ปรับปรุงโครงสร้างดินในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง (การระเบิดดินดาน) งบประมาณ 2,500,000 บาท และรายการติดตามผลการดำเนินงาน การถอดบทเรียนการประชาสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินโครงการ งบประมาณ 634,400 บาท ผลการเบิกจ่าย 409,260.24



1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ดำเนินการโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มี 2 รายการ งบประมาณ 1,387,700 บาท คือรายการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณรวม 704,500 บาท และรายการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืชอาหารสัตว์ 683,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณรวม 13,926,800 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 750,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.63 มี 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่

2.1 กิจกรรมหลักที่ 6 การยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 14 รายการ งบประมาณรวม 12,176,800 บาท ดำเนินการโดย แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป็นการก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวตามถนนสายต่างๆ ขณะนี้มีรายการที่ดำเนินการก่อสร้างฐานการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 9 รายการ และอยู่ระหว่างทดสอบป้าย ที่สำนักทางหลวงที่ 5 นครราชสีมา ผลงานภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 60

2.2 กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 750,000 บาท รายการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (2 หลักสูตร) ดำเนินการโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2.3 กิจกรรมหลักที่ 8 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ มี 1 รายการ งบประมาณ 1,000,000 บาท คือ รายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา : ปั่นจักรยาน Tour of Nakhonchai Burin ดำเนินการโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะดำเนินการต่อจากจังหวัดนครราชสีมาที่จัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 มีกำหนดจัดงานในวันที่ 10 มิถุนายน 2561

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณรวม 6,856,800 บาท เบิกจ่ายไป 1,640,234.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.25 มี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

3.1 กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 3,606,800 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,258,167.09 บาท ดำเนินการโดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์

- 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนักออกแบบชุดผ้าไหมแห่งนครชัยบุรีรินทร์
- การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนักออกแบบชุดผ้าไหมแห่งนครชัยบุรีรินทร์
- การจ้างเหมาตัดเย็บเสื้อผ้าไหม
- ประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2561

- การสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลทุกไตรมาส และสรุปรายงานประจำปี งบประมาณรวม 1,083,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการเบิกจ่ายไป จำนวน 306,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.11



2) ต้นแบบผ้าไหมลดโลกร้อนหรือผ้าคลุมไหมด (Cool Mode) เพื่อการค้า

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในพื้นที่
- การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตผ้า Cool Mode เพื่อการค้าในพื้นที่เป้าหมาย
- จัดหามาเกษตรกรทอผ้า Cool Mode ต้นแบบ 4 ต้นแบบ
- ระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างชิ้นงานต้นแบบ แบบบูรณาการ
- สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลทุกไตรมาส และสรุปรายงานประจำปี

งบประมาณรวม 967,800 บาท เบิกจ่ายไป 126,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.05

3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาด้านตลาดลายผ้าไหมและการทอผ้าไหม นครชัยบุรีรัมย์

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงมือปฏิบัติ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอแนวทางการพัฒนาสิ่งทอพื้นบ้านเกษตรกรในโครงการ
- จัดหามาเกษตรกรทอผ้าต้นแบบ
- ประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์
- การสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลทุกไตรมาส และสรุปรายงานประจำปี

งบประมาณรวม 1,556,000 บาท มีการเบิกจ่ายไป 825,217.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.03 3.2

3.2 กิจกรรมหลักที่ 10 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรัมย์ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 3,250,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 382,067 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.10ดำเนินการโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

1) พัฒนา Cluster ไหมนครชัยบุรีรัมย์ เป็นการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตไหมนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 250,000 บาท เบิกจ่ายไป 203,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.36

2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรัมย์สู่สากล เป็น ค่าจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ บริหารโครงการและติดตามประเมินผล ซึ่งจะจัดเป็นนิทรรศการทางคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงาน เสนอแนะว่า ควรจะไปบูรณาการกิจกรรมร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ ที่จะกำหนดจัดงานประชาสัมพันธ์ เช่นกัน งบประมาณรวม 3,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 178,667 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.14

โครงการที่ใช้เงินเหลือจ่าย


โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์ กิจกรรมหลัก สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยววนนครชัยบุรีรัมย์ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 5,300,000 บาท โดยเป็นการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณชุมชน ถนนสายบุรีรัมย์ – สุรินทร์ ตั้งแต่โค้งโรงเรียนบ้านโคกวัด ถึงแยกเข้าศาลเขาวงกตและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 2,470,000 บาท และ บริเวณชุมชน ถนนสายบุรีรัมย์ – นางรอง ตั้งแต่ทางแยกเทศบาลตำบลลิสาณ ถึงที่กัลบริถ บริเวณทางเข้าบ้านตราดตรวน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 2,830,000 บาท ยังไม่มีผลเบิกจ่าย ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

- รายการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ตำบลสะแกชำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 40,700,000 บาท เมิกจ่ายไปแล้ว 17,840,852.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.47 พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ตั้งที่ บ้านตลาดควาย ตำบลสะแกชำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเมื่อปี พ.ศ. 2535 จากการสำรวจพบว่าในแต่ละปีมีนกชนิดต่าง ๆ มาอาศัยอยู่โดยรอบ จำนวนกว่า 100 ชนิด บริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำ มีบ้านของคุณสวัสดิ์ คชเสนีย์ ได้จัดทำเป็นสวนนก และเป็นสถานที่พักผ่อนด้วย อ่างเก็บน้ำเดิมมีประตูปรับน้ำแต่มีขนาดเล็ก จึงปรับปรุงใหม่ และมีกิจกรรมที่ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

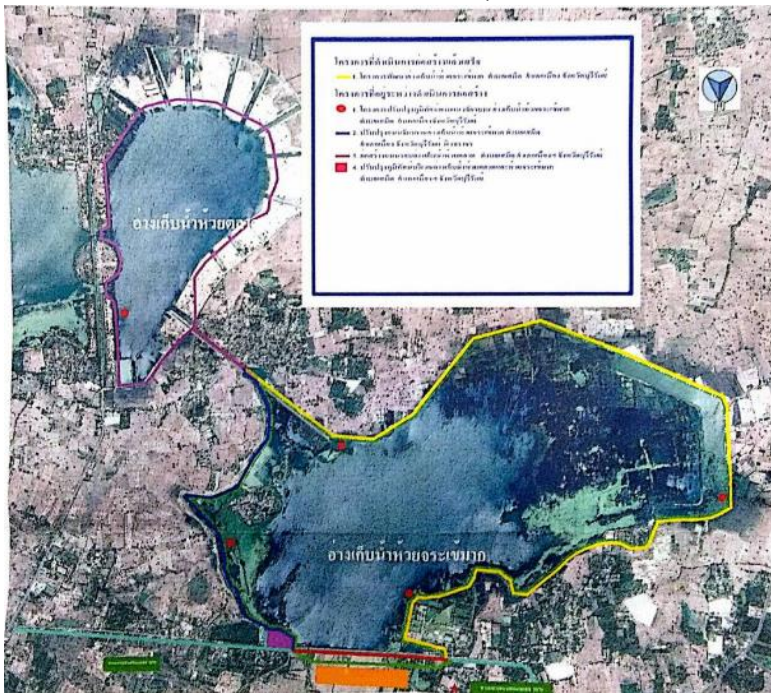

1. อาคารระบายน้ำฉุกเฉิน 1 แห่ง
2. ปรับปรุงยกระดับการกักเก็บน้ำ
3. ประตูระบายน้ำ 1 จุด
4. อาคารรองรับน้ำรอบอ่างเก็บน้ำ 5 จุด
5. ปรับปรุงถนนหินคลุก เป็นงานจ้างเหมา
6. ก่อสร้างสะพานคอนกรีต (เดิมสะพานไม้) ระยะทางยาว 40 เมตร



การปรับปรุงยกระดับการกักเก็บน้ำ ทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เดิมอ่างเก็บน้ำมีความจุ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นเป็น 40 ล้านลูกบาศก์เมตร





- แก้มลิงกุดเตา ตำบลบ้านจาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 10,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 5,760,251.70 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 229,478.30 บาท เป็นเงินเหลือจ่าย 4,010,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย มีกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่

1. อาคารบังคับน้ำ 1 แห่ง
2. ท่อระบายน้ำ
3. บันได
4. ถนนลงหินคลุก

แก้มลิงกุดเตา ตำบลบ้านจาน มีจำนวน 10 หมู่บ้าน 1,408 หลังคาเรือน มีลำสาแหรก และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและบุรีรัมย์ใช้กักเก็บน้ำเวลาน้ำหลาก มาจากลำสาแหรก และปล่อยน้ำคืนสู่ลำสาแหรกในฤดูแล้ง



- รายการอาคารบังคับน้ำคลองม่วง ตำบลบ้านจาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณ 19,742,600 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้

1. อาคารบังคับน้ำ ขนาด 6x3 เมตร
2. บันได 2 แห่ง
3. ท่อลอด 3 แห่ง
4. ถนนหินคลุก


เดิมไม่ได้เป็นพื้นที่ชลประทาน แต่เพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำ จึงใช้ที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านชุดเป็นสระเพื่อกักเก็บน้ำลำสะเทอด โดยในฤดูน้ำหลากจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเบี่ยงน้ำ จากอำเภอพุนพิน จังหวัดนครศรีธรรมราช มาลงลำสะเทอด





ทั้งรายการแก้มลิงกุดเตา ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และรายการอาคารบังคับน้ำคลองม่วง ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นรายการที่เชื่อมโยงลำน้ำธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก และนำไปไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ลำน้ำธรรมชาติเป็นลำน้ำที่ไหลผ่านสองจังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ เกิดการบูรณาการและบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ

ตรวจดูพื้นที่จากโครงการที่เป็นข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขอรับการสนับสนุนในเรื่องระบบแสงสว่าง ปรับปรุงทำนบดิน ลานกิจกรรมและนันทนาการ และอาคารเอนกประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาบรรจุในแผนอารยธรรมอีสานใต้ แต่การดำเนินการจะต้องให้ทางชลประทานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน สามารถดำเนินการได้เอง อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก มีการก่อสร้างเส้นทางจักรยานแล้ว และมีศาลาสำหรับพักผ่อน

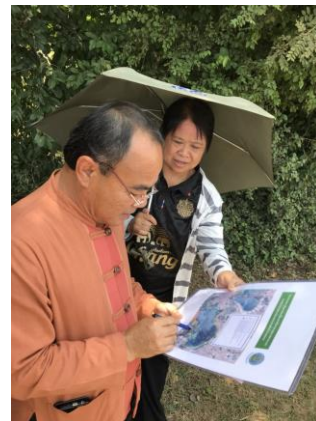

จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามระดับพื้นที่รายจังหวัด โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีก่อนที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์



งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสุรินทร์มีโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 86,603,040 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500,000 บาท) ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 53,446,178.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.06 ยังไม่เบิกจ่าย 17,759,664 บาท งบประมาณพันไป 15,397,197.53 บาท โครงการที่ยังดำเนินการที่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 3 รายการ

- รายการก่อสร้างสถานีด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชายทุ่ง ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 15,740,000 บาท เบิกจ่ายไป 7,229,256 บาท คงเหลือ 8,510,744 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

- รายการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 7,660,920 บาท อยู่ระหว่างแก้ไขงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจการจ้าง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน 2561

- รายการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ ค.อ.ร.ชนิดกลมพร้อมบ่อพัก สายถนนเส้นนิคมปราสาท ซอย 3 บ้านคุณसार ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร งบประมาณ 1,588,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาพันไป
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	9,941,328	9,382,788	100	-	558,540
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	830,800	830,800	100	-	-
4	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	23,430,000	7,229,256	30.89	16,171,664	29,080
5	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	13,500,000	995,000	100	-	12,505,000
6	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม	962,000	773,980	100	-	188,020
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่สู่สากล	480,000	383,630	100	-	96,370
10	โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ	2,250,000	1,862,774	100	-	387,226
11	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนของภาครัฐและเอกชน	2,000,000	1,739,300	100	-	260,700
13	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน	32,708,912	29,862,530.4	94.95	1,588,000	1,258,381.53
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ	500,000	386,120	100	-	113,880
	รวมทั้งสิ้น	86,603,040	53,446,178.47	77.29	17,759,664	15,397,197.53

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จังหวัดสุรินทร์ มีโครงการที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 4 โครงการงบประมาณ 879,401,000 บาท ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 มีผลการเบิกจ่าย 371,623,624.27 บาท ร้อยละ 46.44 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 428,636,161.21 บาท เงินพับไป 79,141,214.52 บาท มีโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรัมย์ กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ และโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล ที่เหลือยังอยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งกิจกรรมที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย /เงินยกเลิก

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพับไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรัมย์	707,851,600	231,914,700.67	38.02	378,087,161.21	76,252,638.12
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรัมย์ครบวงจร	29,166,100	26,961,986	100	-	1,238,514
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทยแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	5,972,400	6,000,609.62	100	-	316,490.38
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	136,410,900	106,746,327.98	67.86	50,549,000	1,333,572.02
	รวมทั้งสิ้น	879,401,000	371,623,624.27	46.44	428,636,161.21	79,141,214.52



1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ จำนวน 21 รายการ และเป็นรายการเหลือจ่าย และรายการที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 7 รายการ รวมทั้งสิ้น 28 รายการ งบประมาณรวม 444,718,200 บาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 465,151,405.88 บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 1,473,150 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 36,591,618.86 บาท สำหรับการดำเนินงานที่ล่าช้า เนื่องจาก จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีหน่วยงานด้านชลประทาน เพียงหน่วยเดียวคือ โครงการชลประทานสุรินทร์ แล้งงานด้านพัฒนาชลประทาน เป็นงานที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะส่วนใหญ่จึงเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ต้องกระจายกำลังไปดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ และมีจำนวน 3 รายการที่แบ่งเนื้องานให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการเป็นรายเดียวกัน แต่รายการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านนาทอง ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ยังเบิกจ่ายไม่ได้ค่า และผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาดำเนินการต่อ ซึ่งทำให้มีค่าปรับที่ประชุมคณะติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ได้เสนอความเห็น ว่า หากค่าปรับเกินร้อยละ 10 ของเงินงบประมาณที่จ้าง ให้เสนอเป็นผู้ทำงาน เนื่องจากเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้วเสร็จในสัญญาจ้างแล้ว รายการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำฝายโชคชัย (ราแดง) ตำบลกุดหวาย อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ (ใช้เงินเหลือจ่าย) ซึ่งมีผู้รับจ้างรายเดียวกัน และยังไม่เข้ามาดำเนินการ ทางผู้จ้างคือโครงการชลประทานสุรินทร์ ได้เร่งรัดให้เข้ามาดำเนินการแล้ว และมีหนังสือตักเตือน

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหม่ ประชากรฐานนครชัยบุรีรินทร์ มี 6 กิจกรรม งบประมาณรวม 135,281,800 บาท มีผลเบิกจ่าย 61,278,523 บาท งบประมาณพันไป 13,066,177 บาท ยังมีกิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 1 รายการ คือ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการแปรรูปข้าวในนาแปลงใหญ่ประจักษ์ ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 6,314,950 บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,645,700 บาท อยู่ระหว่างตรวจรับงานและส่งมอบ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน 2561

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ประชากรฐานนครชัยบุรีรินทร์ มี 3 กิจกรรม งบประมาณ 7,851,600 บาท มีผลเบิกจ่าย 7,239,090 บาท งบประมาณพันไป 612,510 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร มี 2 กิจกรรม งบประมาณรวม 117,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 25,037,734 บาท งบประมาณพันไป 58,707,266 บาท มีกิจกรรมที่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ดังนี้

กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ รายการสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิต งบประมาณ 30,000,000 บาท อยู่ระหว่างเสนอเบิก จำนวน 18,420,000 บาท มีเงินเหลือจ่ายพันไป 11,580,000 บาท



กิจกรรมย่อยที่ 2 ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำการเกษตรอื่น รายการสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิต งบประมาณ 37,500,000 บาท อยู่ระหว่างเสนอเบิก จำนวน 14,835,000 บาท มีเงินเหลือจ่ายไป 22,665,000 บาท

1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร เป็นรายการใหม่ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 2 รายการ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 17,986,100 บาท มีผลงานอยู่ที่ร้อยละ 75

- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตระแบก หมู่ที่ 6 ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร งบประมาณ 8,014,000 บาท จะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561

- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านซำสมิง - บ้านโคกระเวียง ตำบลบ้านขบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีนครบวงจร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีนครบวงจร มี 6 กิจกรรมหลัก งบประมาณรวม 29,166,100 บาท เบิกจ่ายไป 26,961,986 บาท งบประมาณพบบัไป 1,238,514 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ 663,500 บาท ยกเลิกไม่ดำเนินการ งบประมาณพบบัไป

2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 16,514,600 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วมีผลเบิกจ่าย 16,280,986 บาท เงินพบบัไป 14 บาท

2.3 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ งบประมาณ 10,719,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 9,999,000 บาท เงินพบบัไป 18,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาระบบขนส่งเนื้อเยื่อคุณภาพ งบประมาณ 817,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 260,000 บาท เงินพบบัไป 557,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2.5 กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 284,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 284,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2.6 กิจกรรมหลักที่ 6 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรีนครบวงจร งบประมาณ 168,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 156,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน มี 5 กิจกรรมหลัก และกิจกรรมที่ใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณรวม 6,455,900 บาท และเบิกจ่ายไป 6,000,609.62 บาท มีงบประมาณพื้ไป 316,490.38 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง งบประมาณ 250,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 248,000 บาท

3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 809,900 บาท มีผลเบิกจ่าย 753,659.10 บาท

3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่ด้วยพลังงานทดแทน งบประมาณ 2,087,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 1,925,000 บาท

3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME 3 กลุ่ม และมีรายการที่ใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณรวม 2,669,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 2,548,450.52 บาท

3.5 กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 540,500 บาท

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล มี 4 กิจกรรมหลัก งบประมาณรวม 136,410,900 บาท เบิกจ่ายไป 106,746,327.98 คิดเป็นร้อยละ 67.86 มีงบประมาณพื้ไป 1,333,572.02 บาท

4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มี 5 รายการ งบประมาณรวม 13,430,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย 13,330,000 บาท งบประมาณพื้ไป 100,900 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

4.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2 รายการ งบประมาณรวม 28,800,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 25,145,000 บาท งบประมาณพื้ไป 146,000 บาท รายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 รายการ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ใช้เงินเหลือจ่าย ดังนี้

- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดเขาเขาโต๊ะ ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.4000 กิโลเมตร งบประมาณ 12,359,000 บาท มีผลดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 65 สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านคำผาง หมู่ที่ 1 - บ้านนาแก่น ตำบลคำผาง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร งบประมาณ 3,400,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน และคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน 2561

- ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเสม็ด หมู่ที่ 7 - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร งบประมาณ 6,745,000 บาท มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 60 สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2561

4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการค้าชายแดน ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 8 รายการ งบประมาณรวม 88,180,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 65,354,367.98 บาท งบประมาณพันไป 1,003,632.02 บาท ยังมีรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 2 รายการ เป็นรายการที่ใช้เงินยกเลิกรายละเอียด ดังนี้

- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านละหุ่ง ตำบลนาบัว - บ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร งบประมาณ 17,050,000 บาท มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 20 หน่วยงานการคือแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ได้เร่งรัดผู้รับจ้าง ให้นำเครื่องจักรเข้าไปเพิ่มเติม เพื่อเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้น โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตระมุง - บ้านขาม ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 20 หน่วยงานการคือแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ได้เร่งรัดผู้รับจ้าง ให้นำเครื่องจักรเข้าไปเพิ่มเติม เพื่อเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้น โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

4.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชาชน งบประมาณ 6,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 2,916,960 บาท งบประมาณพันไป 83,040 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้ 1) พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 3,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 2,916,960 บาท 2) พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 3,000,000 บาท ยกเลิกดำเนินโครงการ และโอนเปลี่ยนแปลงไปทำรายการใหม่

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 60,884,700 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,239,152.20 บาท ร้อย 5.34 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 57,442,059.77 บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน 13,844,000 บาท เบิกจ่าย 1,847,325 บาท งบรายจ่ายอื่น 500,000 บาท เบิกจ่าย 115,352 บาท งบลงทุน 46,540,700 บาท เบิกจ่าย 1,276,475 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ไม่ขอรับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	เหลือจ่าย
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	40,531,700	194,200	2,123,675	5.26	38,213,809	16.03
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	34,769,200	-	69,475	0.20	34,699,708.97	16.03
	1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	1,382,960	-	646,000	46.71	736,960	-
	1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	1,770,340	194,200	-	-	1,576,140	-
	1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	1,990,200	-	1,408,200	70.76	582,000	-
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	10,380,000	-	735,000	7.08	9,645,000	-
	2.1 ยกกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	4,630,000	-	-	-	4,630,000	-
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว นครชัยบุรีรินทร์	750,000	-	735,000	98.00	15,000	-
	2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว นครชัยบุรีรินทร์	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	9,473,000	-	265,125.20	2.80	9,198,602.80	9,272
	3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่ นครชัยบุรีรินทร์	1,278,600	-	24,397.20	1.91	1,254,202.80	-
	3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรีรินทร์	8,194,400	-	240,728	2.94	7,944,400	9,272
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	500,000	-	115,352	23.07	384,648	
	รวมทั้งสิ้น	60,884,700	194,200	3,239,152	5.34	57,442,059.77	9,288.03

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ มี 5 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ดำเนินการโดย โครงการชลประทานสุรินทร์

กิจกรรมหลักที่ 2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์

กิจกรรมหลักที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์

กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ดำเนินการโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์ (ใช้เงินเหลือจ่าย) ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ งบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างก่อนนี้ผูกพันรวม 40,531,700 บาท แต่มีการเบิกจ่ายในภาพรวมได้ค่อนข้างต่ำ จำนวน 2,123,675 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.26 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มี 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เบิกจ่ายไป จำนวน 1,408,200 บาท คงเหลือรายการงบดำเนินงาน และกิจกรรมที่ใช้เงินเหลือจ่าย กิจกรรมหลักอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินงาน กิจกรรมที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายคือกิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง ซึ่งรายการครุภัณฑ์ 5 รายการ ได้จัดซื้อและส่งมอบแล้วและกิจกรรมหลัก การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์ (ใช้เงินเหลือจ่าย) อยู่ระหว่างจัดเตรียมเรื่องการฝึกอบรมและทำเรื่องยืมเงินงบประมาณ

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ มี 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

กิจกรรมหลักที่ 6 การยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 13 รายการ งบประมาณรวม 4,630,000 บาท ดำเนินการโดย แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป็นการก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวตามถนนสายต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคคือมีบางช่วงสายถนนที่อยู่ระหว่างปรับปรุงขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร จึงทำให้ ยังไม่สามารถเข้าไปติดตั้งป้ายแบบ Overhang (ป้ายแบบแขวน) จะต้องรอให้ดำเนินการแล้วเสร็จ



กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ เป็นการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณโครงการพิเศษสุรินทร์ “ซแรย์อติตยา” อ่างเก็บน้ำอำปี้ล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 4,000,000 บาท ดำเนินการโดย ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เป็นรายการที่ใช้เงินเหลือจ่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ

กิจกรรมหลักที่ 8 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ มี 1 รายการ คือ รายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา : ปั่นจักรยาน Tour of Nakhonchaiburin ดำเนินการโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ดำเนินการ 45 วัน มีกำหนดจัดงานวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรีรินทร์ ดำเนินการโดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ งบประมาณ 1,278,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ งบประมาณ 1,176,000 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย โดยจะเบิกงบประมาณจำนวน 1,170,000 บาท มีงบประมาณเหลือจ่าย 6,000 บาท สำหรับรายการที่เป็นการติดตามการปฏิบัติงาน และประเมินผล งบประมาณ 102,600 บาท เบิกจ่ายไป จำนวน 24,397.20 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 10 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์ ดำเนินการโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 8,194,400 บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน 1 รายการ งบประมาณ 240,728 บาท คงเหลือรายการจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมไหมนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 7,944,400 บาท จะได้ผู้รับจ้างในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดำเนินการโดย ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

- รายการ ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 5 จุด งบประมาณ 2,167,800 บาท วัดบูรพาราม มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด Fixed 20 ตัว (กล้อง Fixed คือกล้องที่ใช้ดูภาพรวมของพื้นที่) และกล้องส่องป้ายทะเบียนรถยนต์ จำนวน 2 ตัว เชื่อมโยงกับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์




วัดบูรพาราม เป็นวัดพระอารามหลวงและเป็นທີ່ประดิษฐาน หลวงพ่อพระชีว์ (หลวงพ่อประจักษ์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสุรินทร์ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ทั้งยังเป็นวัดที่พระราชวุดาจารย์ (หลวงปู่ดูล อตุโล) พระเถระสายพระกัมมัฏฐานด้านการภาวนาจิต ที่มีชื่อเสียงในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรม สายพระกัมมัฏฐาน ท่านได้

เคยจำพรรษาอยู่ ณ วัดบูรพาราม ตั้งแต่ พ.ศ. 2477 จนกระทั่งมรณภาพ พ.ศ. 2526 ทำให้มีศาสนิกชน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวเข้ามาชมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา สถานที่ตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองสุรินทร์ มีเส้นทางสัญจรไปมา จึงจำเป็นต้องมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด





- รายการ ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณปราสาทศีขรภูมิ ตำบลระแงง อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 5 จุด งบประมาณ 2,678,600 บาท ปราสาทศีขรภูมิ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด Fixed 20 ตัว และกล้องส่องป้ายทะเบียนรถยนต์ จำนวน 2 ตัว เดินทางด้วย Fiber optic หรือเส้นใยแก้วนำแสง ไปยังสถานีตำรวจภูธรอำเภอศีขรภูมิ ปราสาทศีขรภูมิ เป็นโบราณสถานที่สำคัญ ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทขอมที่งดงามที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ และบริเวณแหล่งท่องเที่ยวศีขรภูมิ ยังมีแหล่งผลิตกาละแม่อันขึ้นชื่อ กาละแมศีขรภูมิ

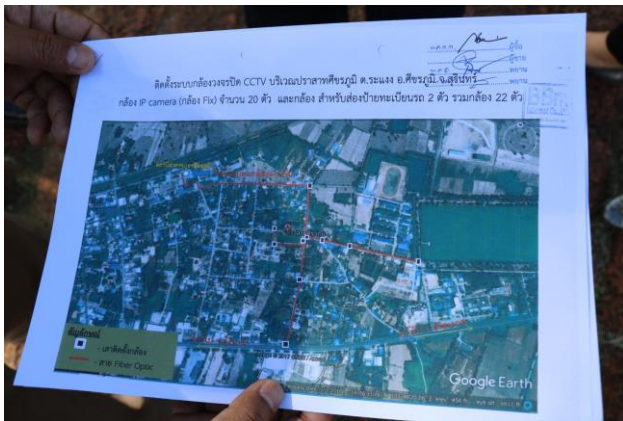

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม


2. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครศรีธรรมราช กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ ดำเนินการโดย โครงการชลประทานสุรินทร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำฝายโชคชัย (รำแดง) ตำบลกุดหวาย อำเภอศรีธรรมภุมิ จังหวัดสุรินทร์ (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 27,962,800 บาท บริเวณฝายโชคชัย (รำแดง) เดิมเป็นแก้มลิงที่ตื้นเขิน เป็นที่รองรับน้ำจากห้วยทับทัน ซึ่งมีแหล่งน้ำที่เชื่อมไปยังอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ ต่อมา มีการขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน งบพัฒนาจังหวัด และงบประมาณกลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการบริหารจัดการน้ำ โดยงบประมาณจากชลประทาน ได้สนับสนุนการขุดลอกแก้มลิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ งบพัฒนาจังหวัด สนับสนุนคลองส่งน้ำจากตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ให้เชื่อมกับแก้มลิง และงบประมาณของกลุ่มจังหวัด สนับสนุนคลองส่งน้ำ ระยะทาง 3 กิโลเมตร ไปยังเส้นทางระบายน้ำ ตำบลกุดหวาย และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า



- ฝ่ายบ้านตะแตรว ตำบลตรว อำเภอสรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง งบประมาณ 30,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 27,215,380 บาท ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 3 บาน ขนาด 6.00x4.00 เมตร ใช้ระบบการเปิดปิดประตูระบายน้ำด้วยไฟฟ้า ขุดลอกและเรียงหิน ขณะนี้ใกล้ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลืองานขุดลอกซึ่งเป็นงานจ้างเหมา ได้มีการเรียกให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาดำเนินการ นอกจากนี้ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากกระยะทางที่เข้ามาดำเนินการค่อนข้างไกล สภาพถนนไม่สะดวก ขาดรถบรรทุก ทำให้การขนส่งวัสดุ และแรงงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก



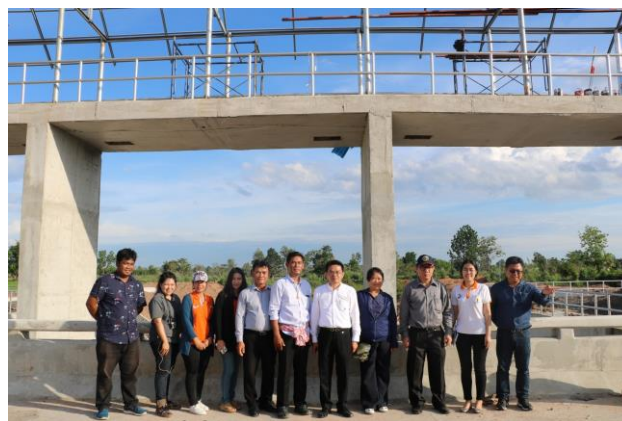

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

- รายการ ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 458,000 บาท รายการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะ บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 3 บ้านลำหอก ตำบลหนองเหล็ก อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะตำบลหนองเหล็กเริ่มก่อตั้ง มีสมาชิกจำนวน 10 คน และมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มเป็นแกนนำเลี้ยงแพะผู้เดียว เพื่อให้เป็นต้นแบบแก่สมาชิกรายอื่นๆ สำหรับศึกษาก่อนจะนำไปเลี้ยงเอง หัวหน้ากลุ่มได้รับการสนับสนุนพันธุ์แพะ 11 ตัว เป็นพ่อพันธุ์ จำนวน 1 ตัว แม่พันธุ์ จำนวน 10 ซึ่งมีศักยภาพในการเลี้ยงแพะ เนื่องจากมีสมาชิกในครัวเรือนมีความรู้ด้านการปศุสัตว์ (นักวิชาการ) เมื่อขยายพันธุ์ได้ลูกแพะ จึงจะจัดสรรให้กับสมาชิกไปเลี้ยงต่อไป บ้านของหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงแพะมีความเหมาะสมที่จะเป็นฐานเรียนรู้ เนื่องจากเดิมเป็นสถานที่เรียนมหาวิทยาลัยชีวิต ของรศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ และเป็นที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองเหล็ก



งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลักที่ 5 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ดำเนินการโดย แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ เป็นการก่อสร้างป้ายติดตั้งที่พื้น และป้าย Overhang หรือป้ายแขวน

- รายการ ก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวถนนสายทางหลวงหมายเลข 226 อำเภอศีขรภูมิ - อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 4 ชุด งบประมาณ 33,600 บาท - ก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ถนนสายทางหลวงชนบทหมายเลข สร 2371 อำเภอศีขรภูมิ - อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 8 ชุด งบประมาณ 67,300 บาท



คณะผู้ติดตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1



ชื่อ นางพรทิพย์ ยุทธวาริชัย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
โทร/โทรสาร 0 4424 3090
สป.มท. 36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th



ชื่อ นางสาวอรณี ชาญหัด
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร/โทรสาร 0 4424 3090
สป.มท. 36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th.th



ชื่อ นางสาวไชดิรส มีอำนาจ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร/โทรสาร 0 4424 3090
สป.มท. 36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th



ชื่อ นางสาวอิสรียา เคียงวิมลรัตน์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร/โทรสาร 0 4424 3090
สป.มท. 36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th.th



ชื่อ นางสาวทองคำ รักรวงษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร/โทรสาร 0 4424 3090
สป.มท. 36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th



ชื่อ นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร/โทรสาร 0 4424 3090
สป.มท. 36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th.th



ชื่อ นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร/โทรสาร 0 4424 3090
สป.มท. 36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th



ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
 ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถนนมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร/โทรสาร : 0 4424 3090
สป.มท. 36601 **E-mail** : osm_ne1@moi.go.th
เว็บไซต์ : <http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/>
