



รายงาน

ติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลางปีงบประมาณ)



คำนำ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 352,899,100 บาท โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 3 โครงการ และ 1 งบบริหาร ซึ่งในการดำเนินโครงการนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องทราบถึงความพร้อม ความก้าวหน้า และความสำเร็จของโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อหามาตรการแก้ไขให้ทันการณ์ หรือนำมาซึ่งการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

คณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดยฝ่ายเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จึงได้ติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 15 – 22 มีนาคม 2565 เพื่อนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้แก่ส่วนราชการเพื่อให้ดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ และส่วนราชการต่อไป

คณะทำงานและเลขานุการ

24 มีนาคม 2565

สารบัญ

| หัวข้อ | หน้า |
|--|------|
| คำนำ | ก |
| สารบัญ | ข |
| ความเป็นมา | 1 |
| งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1 |
| แผนการเบิกจ่ายของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 2 |
| ผลการเบิกจ่ายของกลุ่มจังหวัด | 2 |
| ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของกลุ่มจังหวัด | 5 |
| ผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย จังหวัดนครราชสีมา | 7 |
| ผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย จังหวัดชัยภูมิ | 13 |
| ผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย จังหวัดบุรีรัมย์ | 17 |
| ผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย จังหวัดสุรินทร์ | 21 |
| ภาคผนวก | 25 |

ความเป็นมา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้กำหนดให้จังหวัดภายในกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ หรือที่เรียกกันภายในกลุ่มว่า “กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์” รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นประจำทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน จนกว่าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณจะแล้วเสร็จ และกลุ่มจังหวัดฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย วิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

เพื่อเป็นการกระตุ้นการเร่งรัดการดำเนินงาน การก่องหน และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค และเป็นข้อมูลให้ที่ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ก.บ.ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย จึงกำหนดการติดตามผลการดำเนินโครงการและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2565 ในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และวันที่ 22 มีนาคม 2565 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 352,899,100 บาท ดังนี้

| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น |
|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|
| จังหวัดนครราชสีมา | 113,974,100 | 74,000,000 | 39,474,100 | 500,000 |
| จังหวัดชัยภูมิ | 87,699,600 | 84,500,000 | 2,699,600 | 500,000 |
| จังหวัดบุรีรัมย์ | 64,389,500 | 60,000,000 | 3,889,500 | 500,000 |
| จังหวัดสุรินทร์ | 83,835,900 | 80,000,000 | 3,335,900 | 500,000 |
| งบบริหารฯ | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 352,899,100 | 298,500,000 | 49,399,100 | 5,000,000 |

หมายเหตุ : งบบริหารงาน (รายจ่ายอื่น) จังหวัดละ 500,000 บาท

เมื่อเทียบสัดส่วนงบประมาณตามประเภท กลุ่มจังหวัดฯ มีงบดำเนินงาน จำนวน 49,399,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของงบประมาณทั้งหมด งบลงทุน จำนวน 298,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.6 ของงบประมาณทั้งหมด และงบรายจ่ายอื่น (งบบริหาร) จำนวน 5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.4 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนงบลงทุนสูงกว่าปีก่อนๆ ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ทำให้งานที่เป็นงบดำเนินงาน ประเภทฝึกอบรมสัมมนา จะได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณลดลง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

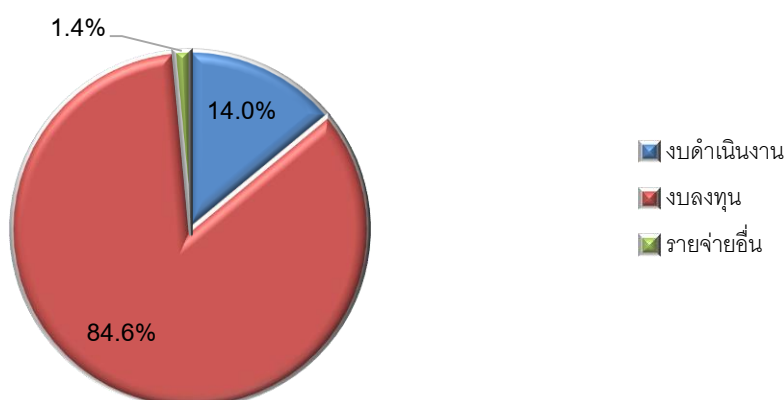

แผนการเบิกจ่ายของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภท | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|
| รายจ่ายประจำ | 8,184,700 | 22,528,390 | 58,604,670 | 25,081,340 |
| รายจ่ายลงทุน | 4,000,000 | 71,342,000 | 131,800,000 | 31,358,000 |
| ภาพรวม | 12,184,700 | 93,870,390 | 190,404,670 | 56,439,340 |

ผลการเบิกจ่ายของกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 8 จาก 18 กลุ่มจังหวัด แม้ว่าจะมีผลการเบิกจ่ายสูง แต่เมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทำให้ร้อยละของการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ต่ำกว่ากลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยกว่า ตามตารางข้างทำยนี้

ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ไปจนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับที่ | จังหวัด | รวม | | | |
|----------|--|--|----------|----------|--|
| | | วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | PO | เบิกจ่าย | %เบิกจ่ายต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง |
| 1 | กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน | 92.70 | 15.13 | 11.87 | 12.81 |
| 2 | กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 | 388.72 | 180.71 | 40.25 | 10.35 |
| 3 | กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 | 271.95 | 63.91 | 16.16 | 5.94 |
| 4 | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 | 262.56 | 165.04 | 12.59 | 4.79 |
| 5 | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 | 175.77 | 20.99 | 7.48 | 4.25 |
| 6 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 | 220.18 | 99.73 | 7.83 | 3.56 |
| 7 | กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน | 235.11 | 141.01 | 7.97 | 3.39 |
| 8 | กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 | 352.90 | 109.29 | 10.88 | 3.08 |
| 9 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 464.26 | 169.64 | 11.70 | 2.52 |
| 10 | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 | 88.13 | 0.04 | 1.67 | 1.90 |
| 11 | กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 | 430.53 | 32.87 | 6.37 | 1.48 |
| 12 | กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง | 229.68 | 53.40 | 2.98 | 1.30 |
| 13 | กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 | 285.07 | 0.15 | 3.69 | 1.29 |
| 14 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 | 185.43 | - | 1.82 | 0.98 |
| 15 | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 | 102.50 | 96.06 | 0.97 | 0.94 |
| 16 | กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย | 239.03 | 56.29 | 1.26 | 0.53 |
| 17 | กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 | 179.78 | 3.57 | 0.83 | 0.46 |
| 18 | กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล | 214.49 | 27.26 | 0.61 | 0.29 |
| รวม | | 17,411.01 | 6,091.08 | 1,333.82 | 7.66 |

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำงวดวันที่ 22 มีนาคม 2565 กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 352,899,100 บาท จำนวน 3 โครงการ 14 กิจกรรม 1 งบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 12,250,690.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.47

งบลงทุน จำนวน 17 รายการ ได้รับจัดสรร 298,500,000 บาท มีการก่อหนี้ผูกพันจำนวน 6 รายการ งบประมาณ 118,207,847.34 บาท เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 792,152.66 บาท เป็นงานดำเนินการเอง จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 80,000,000 บาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 89,500,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 10,000,000 บาท จำแนกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

หน่วย : บาท

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย | ร้อยละ | ยังไม่เบิกจ่าย | เหลือจ่าย |
|-----|--|-------------|----------------|--------------|--------|----------------|------------|
| 1 | โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ | 106,830,800 | 82,000 | 3,094,959.20 | 2.90 | 103,735,840.80 | - |
| 1.1 | การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์ จำนวน 8 รายการ | 90,000,000 | - | 845,459.20 | 0.94 | 89,154,540.80 | - |
| 1.2 | การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ทำเกษตรกรรมยั่งยืน | 3,431,600 | 82,000 | 329,300 | 9.60 | 3,102,300 | - |
| 1.3 | การเรียนรู้สู่การปฏิบัติเกษตรกรอินทรีย์วิถีถิ่นนครชัยบุรีรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า | 4,852,800 | - | 560,000 | 11.54 | 4,292,800 | - |
| 1.4 | การยกระดับมาตรฐานฟาร์มและการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM | 1,688,400 | - | 72,760 | 4.31 | 1,615,640 | - |
| 1.5 | การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควากิว นครชัยบุรีรินทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน | 6,000,000 | - | 1,009,600 | 16.83 | 4,990,400 | - |
| 1.6 | พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน | 858,000 | - | 277,840 | 32.38 | 580,160 | - |
| 2 | โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์ | 231,231,500 | 118,207,847.34 | 5,615,795.55 | 0.33 | 224,823,551.79 | 792,152.66 |
| 2.1 | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว (ถนน 9 สายทาง) | 208,500,000 | 118,207,847.34 | - | - | 207,707,847.34 | 792,152.66 |

หน่วย : บาท

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ก่อนนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย | ร้อยละ | ยังไม่เบิกจ่าย | เหลือจ่าย |
|-----|---|-------------|----------------|---------------|--------|----------------|------------|
| 2.2 | การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว | 7,856,000 | - | 4,856,000 | 61.81 | 3,000,000 | - |
| 2.3 | การพัฒนาการตลาดและ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว นครชัยบุรีรินทร์ | 4,500,000 | - | - | - | 4,500,000 | - |
| 2.4 | การเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการแปลงหม่อนให้มี คุณภาพ | 4,861,900 | - | 759,795.55 | 15.63 | 4,102,104.45 | - |
| 2.5 | นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบ วงจร | 5,513,600 | - | - | - | 5,513,600 | - |
| 3 | โครงการยกระดับการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย นครชัยบุรีรินทร์ | 9,836,800 | - | 2,882,770 | 29.31 | 6,954,030 | - |
| 3.1 | พลังอาสาสมัครสร้างสุข สังคม เข้มแข็ง | 2,951,600 | - | 2,882,770 | 97.67 | 68,830 | - |
| 3.2 | ชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพ แบบพึ่งพาตนเองตามหลัก แพทย์แผนไทย | 4,848,000 | - | - | - | 4,848,000 | - |
| 3.3 | การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ในชุมชนอย่างยั่งยืน | 2,037,200 | - | - | - | 2,037,200 | - |
| | งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด | 5,000,000 | - | 657,166 | 13.14 | 4,342,834 | - |
| | รวมทั้งสิ้น | 352,899,100 | 118,289,847.34 | 12,250,690.75 | 2.10 | 339,856,256.59 | 792,152.66 |

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของกลุ่มจังหวัด

เมื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย โดยเทียบแผนการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 กลุ่มจังหวัดฯ มีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 64.75 ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย มีผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานสูงกว่าแผนการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 104.25 ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย และงบรายจ่ายอื่นน้อยกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 8.88 ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย สำหรับงบลงทุนยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายของไตรมาสที่ 2 ในภาพรวม อยู่ที่ร้อยละ 4.64 ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย น้อยกว่าแผนร้อยละ -95.36 งบดำเนินงานเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 13.79 ของงบประมาณตาม

แผนการเบิกจ่าย น้อยกว่าแผนร้อยละ -86.21 งบลงทุนเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 1.18 ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย น้อยกว่าแผนร้อยละ -98.82 และงบรายจ่ายอื่น (งบบริหาร) เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 43.74 ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย น้อยกว่าแผนร้อยละ -56.26

เมื่อรวมรายจ่ายสะสมพบว่าการเบิกจ่ายภาพรวมที่ร้อยละ 11.55 ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย น้อยกว่าแผนร้อยละ -93.03 เมื่อพิจารณารายงบประมาณ พบว่างบลงทุนซึ่งมีสัดส่วนงบประมาณมากที่สุด มีผลการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 1.12 ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย น้อยกว่าแผนร้อยละ -98.88 ตามตารางข้างท้ายนี้

ตารางแสดงประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

| ที่ | โครงการ | พ.ร.บ. งบประมาณ รายจ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|--------------|--------|----------------------------|-------------|--------|--------|
| | | | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ | +/- |
| รวม 3 โครงการ 1 บริหาร | | 352,899,100 | 12,184,700 | 7,889,171.55 | 64.75 | 93,870,390 | 4,361,519.2 | 4.64 | -95.36 |
| 1 | งบดำเนินงาน | 109,399,100 | 7,509,700 | 7,829,171.55 | 104.25 | 21,163,390 | 2,918,894 | 13.79 | -86.21 |
| 2 | งบลงทุน | 238,500,000 | 4,000,000 | 0 | - | 71,342,000 | 845,459.20 | 1.18 | -98.82 |
| 3 | งบรายจ่ายอื่น (งบบริหาร) | 5,000,000 | 675,000 | 60,000 | 8.88 | 1,365,000 | 597,166 | 43.74 | -56.26 |

หน่วย : บาท

| ที่ | โครงการ | พ.ร.บ. งบประมาณ รายจ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 64 – มี.ค. 65) (เบิกจ่ายสะสม) | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|--|---------------|--------|--------|
| | | | แผน | ผล | ร้อยละ | +/- |
| รวม 3 โครงการ 1 บริหาร | | 352,899,100 | 106,055,090 | 12,250,690.75 | 11.55 | -88.45 |
| 1 | งบดำเนินงาน | 109,399,100 | 28,673,090 | 10,748,065.55 | 37.48 | -62.52 |
| 2 | งบลงทุน | 238,500,000 | 75,342,000 | 845,459.20 | 1.12 | -98.88 |
| 3 | งบรายจ่ายอื่น (งบบริหาร) | 5,000,000 | 2,040,000 | 657,166 | 32.21 | -67.79 |

จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 จังหวัดนครราชสีมา มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ดังนี้

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ก่อนนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย | ร้อยละ | ยังไม่เบิกจ่าย |
|-----|--|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ | 44,122,700 | 82,000 | 2,071,359.20 | 4.67 | 42,051,340.80 |
| 2 | โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์ | 60,109,200 | 8,987,847.34 | 5,541,095.55 | 1.14 | 54,555,951.79 |
| 3 | โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรีรินทร์ | 9,242,200 | - | 2,882,770 | 31.19 | 6,359,430 |
| | งบบริหาร | 500,000 | - | - | - | 500,000 |
| | รวมทั้งสิ้น | 113,974,100 | 9,069,847.34 | 10,495,224.75 | 9.20 | 103,466,722.59 |

1.โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 44,122,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,061,159.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.67 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 6 กิจกรรม ได้แก่

1.1 กิจกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์ ดำเนินการโดยโครงการชลประทานนครราชสีมา มี 2 รายการ งบประมาณ 35,000,000 บาท โดยรายการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณดินขุด 825,000 บาท โอนเปลี่ยนแปลงมาเป็นรายการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำและกักเก็บน้ำลำห้วยแอก

พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนเมษายน 2565 สำหรับรายการที่ 2 ชุดลอกหนองปรือ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด 112,000 ลบ.ม. งบประมาณ 15 ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง 5,551,000 บาท สำหรับงานจ้างเหมา เนื่องจากมีการยกเลิกหนังสือ ว 845 ของกรมบัญชีกลาง จึงต้องเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนวิธีจัดหา ขณะนี้มีการจัดหาวस्तุบางส่วนแล้ว เบิกจ่ายไปจำนวน 845,459.20 บาท โดยประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 อยู่ระหว่างอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 และจะส่งเข้าดำเนินการ

1.2 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 1,220,000 บาท เบิกจ่ายงานอบรมจำนวน 276,500 บาท คงเหลือจัดซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการของเกษตรกร และมีแผนจะจัดซื้อช่วงเดือนมิถุนายน 2565 เป็นช่วงฤดูกลางเพาะปลูก และคงเหลืองานติดตามผลการดำเนินงาน

1.3 กิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเกษตรอินทรีย์วิถีถิ่นนครชัยบุรีนทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมย่อย การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตรกรรมยั่งยืนนครชัยบุรีนทร์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา งบประมาณ 4,852,800 บาท มีการยืมเงินและเบิกจ่ายไป 560,000 บาท อยู่ระหว่างอบรม ซึ่งมีการอบรมจำนวน 4 รุ่น รุ่นแรก 6 เมษายน 2565 และรุ่นที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม 2565 สำหรับ 2 รุ่นที่เหลือ คงรอรับการจัดสรรงบประมาณงวดหลังก่อนแล้วจึงกำหนดแผนการอบรมต่อไป

1.4 กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 422,100 มีการเบิกจ่ายไป 10,200 บาท

1.5 กิจกรรมการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควากิวนครชัยบุรีนทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 2,341,800 บาท เบิกจ่ายไป 379,200 บาท อบรมจำนวน 20 รุ่น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 คงเหลือจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์

1.6 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 286,000 บาท อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ทำให้เกษตรกรไม่เชื่อมั่นเข้าร่วมโครงการ

2. โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรินทร์

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 60,109,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 5,541,095.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.22 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

2.1 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 39,000,000 บาท รายการแรก ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ทางเข้าหาดชมตะวัน ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.50 ม. ระยะทาง 6.000 กม. งบประมาณ 30 ล้านบาท ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เนื่องจากมีการยกเลิกหนังสือ ว 845 ของกรมบัญชีกลาง จึงต้องเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทราบผลวันที่ 23 มีนาคม 2565 คาดว่าจะลงนามในสัญญาต้นเดือนเมษายน 2565 กำหนดการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565

รายการที่ 2 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทล.2243 ตอนอีเหลอ – ปากช่อง จ.นครราชสีมา ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 งบประมาณ 9 ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ 11 มีนาคม 2565 เริ่มดำเนินการ 14 มีนาคม 2565 ระยะเวลา 180 วัน โดยจะเบิกเงินล่วงหน้า ร้อยละ 50

2.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ 7,856,000 บาท มี 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ ดำเนินการโดยตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 4,856,000 บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรีรินทร์ ดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 3,000,000 บาท เป็นรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะเป็นการอบรมเยาวชนจำนวน 4 รุ่นๆ ละ จังหวัด จำนวน 2 หลักสูตร

กิจกรรมย่อยที่ 3 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรีรินทร์ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งบประมาณ 4,500,000 บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR คณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการเปิดซอง โดยจะเป็นการอบรมเยาวชน และจัดงานเทศกาลภาพยนตร์

2.3 กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหมอนให้มีคุณภาพ งบประมาณ 3,239,600 บาท มี 3 กิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน ดำเนินการโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา งบประมาณ 631,000 บาท เบิกจ่าย 526,671.55 บาท เป็นการอบรมจำนวน 120 ราย 3 อำเภอๆ ละ 40 ราย (อำเภอห้วยแถลง อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอลำทะเมนชัย) คงเหลืองานติดตามผลการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมใหม่ ดำเนินการโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา งบประมาณ 187,300 บาท เบิกจ่าย 158,424 บาท อบรมจำนวน 10 ราย คงเหลืองานติดตามผลการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งบประมาณ 2,421,300 บาท อยู่ระหว่างปรับร่าง TOR มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายขณะนี้ยังเหลือกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์

2.4 กิจกรรมนวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งบประมาณ 5,513,600 บาท อยู่ระหว่างจ้างเหมารถเพื่อเดินทางไปคัดเลือกกลุ่มจัดเก็บข้อมูล และอยู่ระหว่างร่าง TOR จัดซื้อวัสดุ คาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันที่ 28 มีนาคม 2565

3. โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรีรัมย์

โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 9,242,200 บาท มีผลเบิกจ่าย 3,784,710 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.95 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่

3.1 กิจกรรม พลังอาสาสมัครสร้างสุข สังคมเข้มแข็ง ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 นครราชสีมา งบประมาณ 2,951,600 บาท ยืมเงินเพื่อจัดกิจกรรม จำนวน 2,882,770 บาท ใช้จ่ายจริง 2,765,850 บาท ดำเนินการเสร็จ อยู่ระหว่างทำเรื่องคืนเงินเหลือจ่าย 185,750 บาท

3.2 กิจกรรมการชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มีเจ้าภาพอยู่ที่วิทยาเขตสุรินทร์) งบประมาณ 4,848,000 บาท มีการคัดเลือกพื้นที่ชุมชนต้นแบบ จังหวัดละ 2 แห่ง มีเกณฑ์การคัดเลือกจากผู้นำชุมชนมีแนวคิดในการพัฒนา และผู้นำท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญ มีจำนวน 7 กิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 1 วัน

กิจกรรมย่อยที่ 2 หลักการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย 2 วัน

กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย 3 วัน

กิจกรรมย่อยที่ 4 การปลูกพืชสมุนไพร และพืชผักอินทรีย์ในครัวเรือน

กิจกรรมย่อยที่ 5 การแปรรูปสมุนไพรในครัวเรือน

กิจกรรมย่อยที่ 6 หลักการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย 2 วัน

กิจกรรมย่อยที่ 7 การติดตามประเมินผลด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน

3.3 กิจกรรมการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 นครราชสีมา งบประมาณ 1,442,600 บาท ผลการเบิกจ่าย 901,940 บาท ขณะนี้รอรับจัดสรรงบประมาณในงวดถัดไป

งบบริหาร จำนวน 500,000 บาท ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ปัญหา/อุปสรรค

1. งบลงทุน (ถนน) มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลางมีการยกเลิกหนังสือ ว 845) ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่
2. ได้รับจัดสรรงบดำเนินงานไม่เต็มวงเงิน ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน / งานจ้างเหมา ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะ เกษตรกรยังขาดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ทำให้ไม่ประสงค์จะรับการฝึกอบรม

ข้อเสนอแนะ

เสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่นในการจัดฝึกอบรม โดยให้ทำตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19

ภาพประกอบการประชุม

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2
จังหวัดนครราชสีมา



จังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 จังหวัดนครราชสีมา มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ดังนี้

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ก่อนนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย | ร้อยละ | ยังไม่เบิกจ่าย |
|-----|--|------------|---------------|----------|--------|----------------|
| 1 | โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ | 26,881,300 | - | - | - | 26,881,300 |
| 2 | โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่มนครชัยบุรินทร์ | 60,318,300 | 39,975,000 | - | - | 60,318,300 |
| | งบบริหาร | 500,000 | - | - | - | 500,000 |
| | รวมทั้งสิ้น | 87,699,600 | 39,975,000 | - | - | 87,699,600 |

1.โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์

โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 26,881,300 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

1.1 กิจกรรมหลักการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ ดำเนินการโดยโครงการชลประทานชัยภูมิ มี 4 รายการ งบประมาณ 20,000,000 บาท รายการที่ 1 ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดเวียง ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รายการที่ 2 ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนจาน แห่งที่ 2 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และรายการที่ 3 ก่อสร้างท่อระบายน้ำปากคลองอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) พร้อมอาคารบังคับน้ำ บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ อนุมัติโครงการ และมอบอำนาจแล้ว เป็นงานดำเนินการเอง สำหรับ รายการที่ 4 ก่อสร้างฝายห้วยบักโกรก บ้านหนองนกเขียน ตำบลตะโกทอง อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 5,000,000 บาท ดำเนินการโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พรม-เชิญ และรายการแก้มลิงบ้านมูลกระบือพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 5,000,000 บาท ดำเนินการโดยโครงการชลประทานชัยภูมิ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุญาตให้เข้าดำเนินการจากกรมป่าไม้ และอยู่ระหว่างที่กรมป่าไม้นัดหมายเข้าตรวจพื้นที่

1.2 กิจกรรมหลักการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 631,000 บาท เดิมมีแผนดำเนินการวันที่ 25 กุมภาพันธ์

2565 แต่เลื่อนดำเนินการเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 โดยดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ และวันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 จะอบรมขยายผลเกษตรกร จำนวน 16 อำเภอ ละ 10 คน คัดเลือกจุดเรียนรู้ต้นแบบ และจัดซื้อพันธุ์พืชตามความต้องการของเกษตรกร

1.3 กิจกรรมหลักการยกระดับมาตรฐานฟาร์มและการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 422,100 บาท ล่าช้าเนื่องจากส่งอนุมัติโครงการล่าช้า ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นการอบรมจำนวน 1 รุ่น 30 ราย

1.4 กิจกรรมหลักการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควากิวนครชัยบุรีรินทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 828,200 บาท เป็นการอบรมเกษตรกร จำนวน 4 รุ่น ละ 50 คน รวม 200 คน ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากยังไม่ได้รับเงินงบประมาณในงวดแรก

2.โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรินทร์

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 60,318,300 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่

2.1 กิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 59,000,000 บาท ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ดังนี้

รายการที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 2051 - แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 5.750 กิโลเมตร งบประมาณ 20,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้วจำนวน 19,985,000 บาท อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารไปทำ PO ในระบบ

รายการที่ 2 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 2354 - แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 2.475 กิโลเมตร งบประมาณ 19,500,000 บาท เนื่องจากเป็นรายการที่โอนเปลี่ยนแปลง และทำความเข้าใจกับสำนักงาน งบประมาณ ทำให้เกิดความล่าช้า ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามต้นเดือน เมษายน 2565

รายการที่ 3 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยกทางหลวงหมายเลข 2359 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร งบประมาณ 20,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันจำนวน 19,990,000 บาท

2.2 กิจกรรมหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ งบประมาณ 818,300 บาท ดำเนินการโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน งบประมาณ 631,000 บาท เป็นการอบรมเกษตรกรจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 60 คน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมใหม่ งบประมาณ 187,300 บาท เป็นการอบรม 2 รุ่นๆ ละ 10 คน

งบบริหาร จำนวน 500,000 บาท ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ปัญหา/อุปสรรค

- การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการอนุมัติโครงการ เนื่องจากส่วนราชการยังดำเนินการไม่ถูกต้อง ต้องส่งคืนกลับไปแก้ไข
- กิจกรรมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดชัยภูมิ มีการดำเนินการในพื้นที่ป่า ซึ่งได้ขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างกรมป่าไม้นัดหมายตรวจสอบพื้นที่ ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้
- งบดำเนินงานถูกจัดสรรเป็นรายงวด บางกิจกรรมที่มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ยังไม่ได้รับงบประมาณ จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งสำนักงบประมาณจะจัดสรรให้ปลายเดือนมีนาคม 2565
- การให้ความสำคัญกับงบประมาณที่ขึ้นก่อนงบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด

ข้อเสนอแนะ

- ส่วนราชการที่จะเสนอค่าของงบประมาณ งบลงทุน : ที่ดินสิ่งก่อสร้าง หากเป็นพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตควรดำเนินการขออนุญาตให้แล้วเสร็จก่อน เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ทำให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนนี้ผูกพันได้ทันที

ภาพประกอบการประชุม

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1
จังหวัดนครราชสีมา



Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.

Go to Settings to activate Windows.

จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 จังหวัดนครราชสีมา มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ดังนี้

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ก่อนนี้ ผูกพัน | เบิกจ่าย | ร้อยละ | ยังไม่เบิกจ่าย |
|-----|---|------------|-------------------|-----------|--------|----------------|
| 1 | โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรัมย์ | 3,272,800 | - | 1,013,400 | 30.96 | 2,259,400 |
| 2 | โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่มนครชัยบุรีรัมย์ | 60,616,700 | 19,980,000 | - | - | 60,596,700 |
| | งบบริหาร | 500,000 | - | 60,000 | 12.00 | 440,000 |
| | รวมทั้งสิ้น | 64,389,500 | 19,980,000 | 1,073,400 | 1.67 | 63,296,100 |

1.โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรัมย์

โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 3,272,800 บาท เบิกจ่ายไปจำนวน 1,013,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.96 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

1.1 กิจกรรมหลักการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 922,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 52,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.72 อบรมเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการอบรมเกษตรกรไม่เป็นไปตามแผน แผนเดิมจะมีการอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากมีภารกิจที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการหลายโครงการจึงเลื่อนไปดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน 2565 และจะจัดทำแปลงสาธิตในเดือนมิถุนายน 2565

1.2 กิจกรรมหลักการยกระดับมาตรฐานฟาร์มและการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 422,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 52,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.40 ขณะนี้ได้รับงบประมาณจัดสรรยังไม่ครบถ้วน ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมแล้ว ยังคงเหลือการจัดซื้อเวชภัณฑ์

1.3 กิจกรรมหลักการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควากิวนครชัยบุรีรัมย์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 1,641,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 630,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.40 อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม จะแล้วเสร็จในวันที่ 20 มีนาคม 2565

1.4 กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 286,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 277,840 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.15 มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 8,160 บาท อยู่ระหว่างหน่วยดำเนินการ แจกคืนเงินเหลือจ่าย

2.โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรินทร์

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 60,616,700 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่

2.1 กิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 60,000,000 บาท ดังนี้

รายการที่ 1 ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอนบุรีรัมย์ - แสงโตน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร พร้อมเครื่องหมายอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1.500 กิโลเมตรดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ งบประมาณ 40,000,000 บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการทำประชาพิจารณ์ วงเงินที่จะก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 39,977,000 บาท คาดว่าจะลงนามภายในเดือนมีนาคม 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน และจะเบิกเงินล่วงหน้า

รายการที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2117 - บ้านละหานทราย ตำบลยายแยมพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 15.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ งบประมาณ 20,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันจำนวน 19,980,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 20,000 บาท เนื่องจากมีงบหลายโครงการจึงทำให้การสำรวจออกแบบของงบกลุ่มจังหวัดล่าช้า จะแบ่งงวดงานออกเป็นทั้งหมด 7 งวด คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 สำหรับรายการนี้ ผู้รับจ้างไม่ขอเบิกล่วงหน้า

2.2 กิจกรรมหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ งบประมาณ 616,700 บาท ดำเนินการโดยศูนย์หม่อนไหม ฯ บุรีรัมย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน งบประมาณ 429,400 บาท เป็นการอบรมเกษตรกรจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 40 ราย

กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมใหม่ งบประมาณ 187,300 บาท เป็นการอบรมเกษตรกรจำนวน 10 ราย

ตามแผนจะดำเนินการอบรมในเดือนมีนาคม 2565 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด - 19 จึงต้องเลื่อนการจัดอบรมไปดำเนินการช่วง พฤษภาคม 2565 - มิถุนายน 2565


งบบริหาร จำนวน 500,000 บาท ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ มีการเบิกจ่ายแล้ว 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12

ปัญหา/อุปสรรค

- ส่วนราชการรับผิดชอบโครงการและงบประมาณหลายส่วน ทั้งงบบฟังกู้ชั้น งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด ทำให้มีการจัดลำดับความสำคัญ และให้ความสำคัญกับงบบฟังกู้ชั้นก่อน
- งบดำเนินการได้รับเป็นรายงวด ทำให้มีบางกิจกรรมที่ยังไม่ได้รับงบประมาณและมีแผนดำเนินการก่อนที่จะได้รับเงินจัดสรร จึงต้องปรับแผนดำเนินการไปดำเนินการหลังที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว

ภาพประกอบการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1
จังหวัดนครราชสีมา

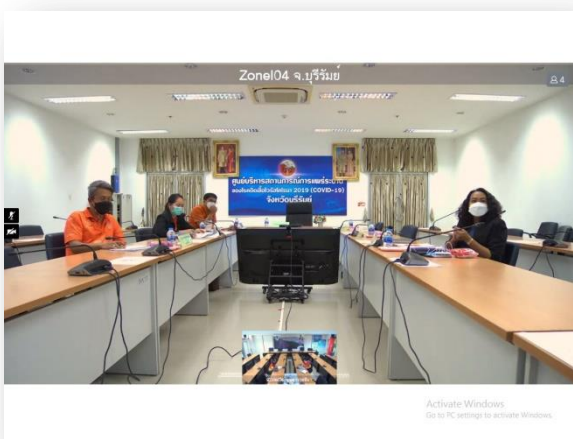

จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 จังหวัดนครราชสีมา มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ดังนี้

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ก่อนนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย | ร้อยละ | ยังไม่เบิกจ่าย |
|-----|--|------------|---------------|----------|--------|----------------|
| 1 | โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ | 32,554,000 | - | 10,200 | 2.42 | 32,543,800 |
| 2 | โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรีรินทร์ | 50,187,300 | 49,265,000 | 74,700 | 0.15 | 49,377,600 |
| 3 | โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรีรินทร์ | 594,600 | - | - | - | 594,600 |
| | งบบริหาร | 500,000 | - | 49,045 | 9.81 | 450,955 |
| | รวมทั้งสิ้น | 83,835,900 | 49,265,000 | 133,945 | 0.16 | 82,966,955 |

1.โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 32,554,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 10,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.42 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่

1.1 กิจกรรมหลักการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์ ดำเนินการโดยโครงการชลประทานสุรินทร์ มี 1 รายการ งบประมาณ 30,000,000 บาท คือ รายการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นรายการที่จังหวัดสุรินทร์ส่งไปทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ คาดว่าจะลงนามระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2565

1.2 กิจกรรมหลักการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 657,700 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่เกษตรกร และดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร ตามแผนจะอบรมเกษตรกรจากเดือนมีนาคม 2565 เลื่อนมาจัดอบรมเป็นเดือนเมษายน 2565 อบรมเกษตรกรทั้งหมด 1 รุ่น จำนวน 2 วัน มี 17 อำเภอ

1.3 กิจกรรมหลักการยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 422,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 10,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.42 ดำเนินการอบรมวันที่ 22 มีนาคม 2565 และจัดซื้อเวชภัณฑ์ภายใน เดือนมีนาคม 2565

1.4 กิจกรรมหลักการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควากิวนครชัยบุรีรินทร์เพื่อสนับสนุน การส่งออกที่มีมาตรฐาน ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 1,188,200 บาท รอกการจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 คาดว่าจะดำเนินการช่วงเมษายน 2565

1.5 กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 286,000 บาท จะเริ่มดำเนินการอบรมและ เบิกจ่ายในเดือนเมษายน 2565

2.โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และ ผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรินทร์

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 50,187,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 74,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 มีกิจกรรมที่ ดำเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่

2.1 กิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 50,000,000 บาท ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ ดังนี้

รายการที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.4004 แยกทางหลวง หมายเลข 2328 - บ้านนาสนวน ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร งบประมาณ 20,000,000 บาท ก่อหนี้ ผูกพันจำนวน 19,905,000 บาท ความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน 8.15%

รายการที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.4013 แยกทางหลวง หมายเลข 2124 - บ้านคณา ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร งบประมาณ 30,000,000 บาท ก่อหนี้ ผูกพันจำนวน 29,360,000 บาท ความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน 4.32 %

2.2 กิจกรรมหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ กิจกรรมย่อย การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมใหม่ งบประมาณ 187,300 บาท ดำเนินการโดยศูนย์หม่อนไหมฯ จังหวัดสุรินทร์ มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 74,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.88 ดำเนินการฝึกอบรม เสร็จในเดือนมีนาคม 2565 รอกการจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุ และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

3.โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ 594,600 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 1 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมหลักการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อย ผักอบรมอาชีพ ระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุ งบประมาณ 594,600 บาท ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดำเนินการจัดอบรม 4 รุ่น รุ่นละ 1 อาชีพ โดยแบ่งเป็น รุ่นที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ อบรมหลักสูตรแปรรูปสมุนไพร รุ่นที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา อบรมหลักสูตรแปรรูปอาหาร รุ่นที่ 3 จังหวัดบุรีรัมย์ อบรมหลักสูตรผ้าไหม และรุ่นที่ 4 จังหวัดสุรินทร์ อบรมหลักสูตรทำเสื่อกกไหล ตามแผนจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม 2565 แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณ จึงรอการจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 มา คาดว่าจะเริ่มดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ในช่วงเดือน มิถุนายน 2565

งบบริหาร จำนวน 500,000 บาท ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ มีการเบิกจ่ายแล้ว 49,045 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.81

ปัญหา/อุปสรรค

- งบดำเนินงานถูกจัดสรรเป็นรายงวด บางกิจกรรมที่มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ยังไม่ได้รับงบประมาณ จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ทำให้กิจกรรมที่เป็นการฝึกอบรมมีหยุดชะงัก เนื่องจากผู้เข้าร่วมการอบรมติดเชื้อไวรัสโควิด - 19

ภาพประกอบการประชุม

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมทำสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1
จังหวัดนครราชสีมา



Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.




ศาลก สุรินทร์


Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.



Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.



Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.

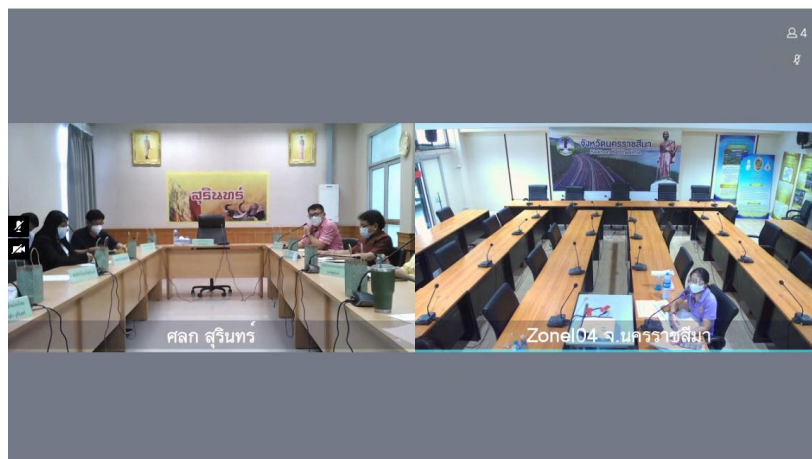

ศาลก สุรินทร์

Zone04 จ.นครราชสีมา

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.

ภาคผนวก

แบบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

บจ.65

แยกจังหวัด

หน่วย : บาท

| โครงการ / กิจกรรม / รายการ | วงเงิน งบ.ที่ได้รับอนุมัติ (1) | วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง | | งบประมาณเหลือจ่าย (4) | งบประมาณยกเลิก (5) | แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) (9) | | | | | | | | | | | | รวม (10) | ร้อยละการเบิกจ่าย (11) | งบประมาณยังไม่เบิกจ่าย (12) | หน่วยดำเนินการ (13) | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---|------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| | | ก่อนผูกพัน (2) | งานดำเนินการเอง (3) | | | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | |
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| จังหวัดนครราชสีมา | 113,974,100 | 9,069,847 | 21,126,339 | 12,153 | - | แผน | 500,000 | 500,000 | 5,299,800.00 | 4,738,680.00 | 3,206,470.00 | 15,524,050.00 | 10,147,680.00 | 11,330,900.00 | 24,090,700.00 | 11,274,000.00 | 20,089,820.00 | 20,000.00 | 106,722,100.00 | - | - | |
| | | | | | | ผล | - | - | 7,829,171.55 | 1,223,000.00 | 278,158.00 | 1,164,895.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,495,224.75 |
| จังหวัดชัยภูมิ | 87,699,600 | 39,975,000 | 10,000,000 | 25,000 | - | แผน | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 24,431,300.00 | 26,587,000.00 | 24,048,000.00 | 5,690,000.00 | 5,225,000.00 | 1,542,300.00 | 36,000.00 | 87,699,600.00 | - | - | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| จังหวัดบุรีรัมย์ | 64,389,500 | 19,980,000 | - | 20,000 | - | แผน | 30,000 | 30,000 | 5,274,900.00 | 30,000.00 | 1,620,800.00 | 5,509,800.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 44,702,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 7,071,500.00 | 64,389,500.00 | - | - | |
| | | | | | | ผล | 30,000 | 30,000 | - | - | 500,700.00 | 512,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,073,400.00 |
| จังหวัดสุรินทร์ | 83,835,900 | 49,265,000.00 | - | 735,000.00 | - | แผน | - | - | - | - | 208,700.00 | 38,010,590.00 | - | - | 35,995,890.00 | - | 6,358,000.00 | 3,262,720.00 | 83,835,900.00 | - | - | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | 120,245.00 | 13,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133,945.00 |
| กลุ่มจังหวัดฯ | 3,000,000 | - | - | - | - | แผน | - | 200,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 3,000,000 | - | - | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | 404,186.00 | 91,980.00 | 51,955.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 352,899,100 | 118,289,847.34 | 31,126,339.00 | 792,152.66 | - | แผน | 530,000.00 | 730,000.00 | 10,924,700.00 | 4,968,680.00 | 5,225,970.00 | 83,675,740.00 | 36,914,680.00 | 35,558,900.00 | 110,679,090 | 16,929,000 | 28,520,120 | 10,990,220.00 | 345,647,100.00 | - | - | |
| | | | | | | ผล | 30,000.00 | 30,000.00 | 7,829,171.55 | 1,627,186.00 | 991,083.00 | 1,743,250.20 | - | - | - | - | - | - | - | 12,250,690.75 | 3.47 | 339,856,256.59 |

| โครงการ / กิจกรรม / รายการ | วงเงิน งบ.ที่ได้รับอนุมัติ (1) | วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง | | งบประมาณเหลือจ่าย (4) | งบประมาณยกเลิก (5) | แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) (9) | | | | | | | | | | | | รวม (10) | ร้อยละการเบิกจ่าย (11) | งบประมาณยังไม่เบิกจ่าย (12) | หน่วยดำเนินการ (13) | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---|------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| | | ก่อนผูกพัน (2) | งานดำเนินการเอง (3) | | | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | |
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| (1)งบดำเนินงาน | 49,399,100.0 | 82,000.00 | 18,962,000.00 | - | - | แผน | 500,000.00 | 500,000.00 | 6,509,700.00 | 4,568,680.00 | 3,305,970.00 | 9,012,740.00 | 7,628,680.00 | 5,509,900.00 | 8,514,090.00 | 2,572,000 | 722,120 | 55,220 | 49,399,100 | - | - | |
| | | | | | | ผล | - | - | 7,829,171.55 | 1,223,000.00 | 783,594.00 | 912,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2)งบลงทุน | 298,500,000.0 | 118,207,847.34 | 12,164,339.00 | 792,152.66 | - | แผน | - | - | 4,000,000.00 | 70,000.00 | 1,600,000.00 | 73,948,000.00 | 28,976,000 | 29,734,000 | 101,800,000 | 13,872,000 | 27,248,000 | 10,000,000 | 291,248,000 | - | - | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | 69,964.000 | 775,495.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| สิ่งก่อสร้าง | 298,500,000.0 | 118,207,847.34 | 12,164,339.00 | 792,152.66 | - | แผน | - | - | 4,000,000.00 | 70,000.00 | 1,600,000.00 | 73,948,000.00 | 28,976,000.00 | 29,734,000.00 | 101,800,000 | 13,872,000 | 27,248,000 | 10,000,000 | 291,248,000 | - | - | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | 69,964.000 | 775,495.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ครุภัณฑ์ | - | - | - | - | - | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3)งบรายจ่ายอื่น | 5,000,000 | - | - | - | - | แผน | 30,000.00 | 230,000.00 | 415,000.00 | 330,000.00 | 320,000.00 | 715,000.00 | 310,000.00 | 315,000.00 | 365,000 | 485,000 | 550,000 | 935,000 | 5,000,000 | - | - | |
| | | | | | | ผล | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 404,186.00 | 137,525.000 | 55,455.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 352,899,100 | 118,289,847.34 | 31,126,339 | 792,152.66 | - | แผน | 530,000.00 | 730,000.00 | 10,924,700.00 | 4,968,680.00 | 5,225,970.00 | 83,675,740.00 | 36,914,680.00 | 35,558,900.00 | 110,679,090 | 16,929,000 | 28,520,120 | 10,990,220 | 345,647,100 | - | - | |
| | | | | | | ผล | 30,000.00 | 30,000.00 | 7,829,171.55 | 1,627,186.00 | 991,083.00 | 1,743,250.20 | - | - | - | - | - | - | - | 12,250,690.75 | 3.47 | 339,856,256.59 |

| โครงการ / กิจกรรม / รายการ | วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (1) | วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง | | งบประมาณ เหลือจ่าย (4) | งบประมาณ ยกเลิก (5) | แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) (9) | | | | | | | | | | | | | ร้อยละ การเบิกจ่าย (11) | งบประมาณ ยังไม่เบิกจ่าย (12) | หน่วยดำเนินการ (13) | |
|--|--|-------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| | | ก่อนนี้ผูกพัน (2) | งานดำเนินการเอง (3) | | | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | รวม (10) | | | | |
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต | 9,836,800 | - | - | - | - | แผน | - | - | 784,600.00 | 1,976,080.00 | 416,370.00 | 1,133,950.00 | 1,613,180.00 | 2,013,500.00 | 880,000.00 | 564,000.00 | 435,120.00 | 20,000.00 | 9,836,800 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | ผล | - | - | 2,877,600.00 | - | 5,170.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,882,770.00 | 29.31 | 6,954,030.00 | - |
| 3. โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยบนเครือข่ายบุรีรัมย์ | 9,836,800 | - | - | - | - | แผน | - | - | 784,600.00 | 1,976,080.00 | 416,370.00 | 1,133,950.00 | 1,613,180.00 | 2,013,500.00 | 880,000.00 | 564,000.00 | 435,120.00 | 20,000.00 | 9,836,800 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | ผล | - | - | 2,877,600.00 | - | 5,170.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,882,770 | 29.31 | 6,954,030.00 | - |
| กิจกรรมหลักที่ 12 พลังอาสาสมัครสร้างสุข สังคมเข้มแข็ง | 2,951,600 | - | - | - | - | แผน | - | - | 784,600.00 | 1,976,080.00 | 5,170.00 | 185,750.00 | - | - | - | - | - | - | 2,951,600 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | ผล | - | - | 2,877,600.00 | - | 5,170.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,882,770 | 97.67 | 68,830.00 | - |
| กิจกรรมหลักที่ 13 ชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย | 4,848,000.000 | - | - | - | - | แผน | - | - | - | 411,200.00 | 948,200.00 | 1,613,180.00 | 633,600.00 | 520,000.00 | 564,000.00 | 137,820.00 | 20,000.00 | 4,848,000 | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,848,000.00 | - |
| กิจกรรมหลักที่ 14 การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน | 2,037,200 | - | - | - | - | แผน | - | - | - | - | - | - | 1,379,900.00 | 360,000.00 | - | 297,300.00 | - | 2,037,200 | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,037,200.00 | - |
| งบบริหาร | 5,000,000 | - | - | - | - | แผน | 30,000.00 | 230,000.00 | 415,000.00 | 330,000.00 | 320,000.00 | 715,000.00 | 310,000.00 | 315,000.00 | 365,000.00 | 485,000.00 | 550,000.00 | 935,000.00 | 5,000,000 | - | - | สง.จังหวัด |
| | - | - | - | - | - | ผล | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 404,186.00 | 137,525.00 | 55,455.00 | - | - | - | - | - | - | 657,166.00 | 13.14 | 4,342,834.00 | - |
| ยอดรวมทั้งสิ้น | 352,899,100 | 118,289,847.34 | 31,126,339 | 792,152.66 | - | แผน | 530,000.00 | 230,000.00 | 10,924,700.00 | 4,968,680.00 | 5,225,970.00 | 82,295,840.00 | 36,554,680.00 | 36,938,800.00 | 110,741,790.00 | 16,929,000.00 | 28,817,420.00 | 10,990,220.00 | 345,147,100 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | ผล | 30,000.00 | 30,000.00 | 7,829,171.55 | 1,627,186.00 | 991,083.00 | 1,743,250.20 | - | - | - | - | - | - | 12,250,690.75 | 3.47 | 339,856,256.59 | - |

แบบรายงานผลการกึ่งปีผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

บจ.65

จังหวัดนครราชสีมา

หน่วย : บาท

| โครงการ / กิจกรรม / รายการ | วงเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (1) | วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง | | งบประมาณเหลือจ่าย (4) | งบประมาณยกเลิก (5) | แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่กึ่งปีผูกพันแล้ว) (9) | | | | | | | | | | | | | | | | ร้อยละการเบิกจ่าย (11) | งบประมาณยังไม่เบิกจ่าย (12) | หน่วยดำเนินการ (13) | หมายเหตุ |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| | | ก่อนปีผูกพัน (2) | งานดำเนินการเอง (3) | | | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | รวม (10) | | | | | | | |
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | | | | |
| (1)งบดำเนินงาน | 39,474,100 | 82,000 | 18,962,000 | - | - | แผน | 500,000.00 | 500,000.00 | 5,299,800.00 | 4,568,680.00 | 1,506,470.00 | 5,818,050.00 | 7,071,680.00 | 5,496,900.00 | 5,590,700.00 | 2,402,000.00 | 699,820.00 | 20,000.00 | 39,474,100.00 | - | - | | | | |
| | | - | - | | | ผล | - | - | 7,829,171.55 | 1,223,000.00 | 208,194.00 | 389,400.00 | - | - | - | - | - | - | 9,649,765.55 | 24.45 | 29,824,334 | | | | |
| (2)งบลงทุน | 74,000,000 | 8,987,847.340 | 2,164,339.000 | 12,152.660 | - | แผน | - | - | - | 70,000.00 | 1,600,000.00 | 9,606,000.00 | 2,976,000.00 | 5,734,000.00 | 18,500,000.00 | 8,872,000.00 | - | - | 66,748,000.00 | - | 7,252,000.00 | | | | |
| | | - | - | - | - | ผล | - | - | - | - | 69,964.00 | 775,495.20 | - | - | - | - | - | - | 845,459.20 | 1.14 | 73,142,388 | | | | |
| สิ่งก่อสร้าง | 74,000,000 | 8,987,847 | 2,164,339 | 12,153 | - | แผน | - | - | - | 70,000.00 | 1,600,000.00 | 9,606,000.00 | 2,976,000.00 | 5,734,000.00 | 18,500,000.00 | 8,872,000.00 | - | - | 66,748,000.00 | - | 7,252,000.00 | | | | |
| | | - | - | - | - | ผล | - | - | - | - | 69,964.00 | 775,495.20 | - | - | - | - | - | - | 845,459.20 | 1.14 | 73,142,388 | | | | |
| ครุภัณฑ์ | | | | | | แผน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)งบรายจ่ายอื่น | | | | | | แผน | - | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | - | - | 500,000.00 | - | 0.000 | | | | |
| | 500,000.00 | - | - | - | - | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | | | | |
| รวม 3 โครงการ 14 กิจกรรม 1 งบบริหาร | 113,974,100 | 9,069,847.34 | 21,126,339.00 | 12,152.66 | - | แผน | 500,000.00 | 500,000.00 | 5,299,800.00 | 4,738,680.00 | 3,206,470.00 | 15,524,050.00 | 10,147,680.00 | 11,330,900.00 | 24,090,700.00 | 11,274,000.00 | 20,089,820.00 | 20,000.00 | 106,722,100.00 | - | 7,252,000.00 | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | 7,829,171.55 | 1,223,000.00 | 278,158.00 | 1,164,895.20 | - | - | - | - | - | - | - | 10,495,224.75 | 9.21 | 103,466,722.59 | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร | 44,122,700 | 82,000.000 | 11,205,039.000 | - | - | แผน | 500,000.00 | 500,000.00 | - | 1,690,800.00 | 2,502,800.00 | 4,140,700.00 | 3,378,800.00 | 5,854,800.00 | 4,702,800.00 | 9,210,000.00 | 4,390,000.00 | - | 36,870,700.00 | - | 36,870,700.00 | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | 276,500.00 | 500,000.00 | 129,964.00 | 1,164,895.20 | - | - | - | - | - | - | - | 2,071,359.20 | 4.69 | 42,051,341 | | | |
| 1. โครงการพัฒนาวิสาหกิจรวมเกษตรและอาหารปลอดภัยชุมชนบุรีรัมย์ | 44,122,700 | 82,000.000 | 11,205,039.000 | - | - | แผน | 500,000.00 | 500,000.00 | - | 1,690,800.00 | 2,502,800.00 | 4,140,700.00 | 3,378,800.00 | 5,854,800.00 | 4,702,800.00 | 9,210,000.00 | 4,390,000.00 | - | 36,870,700.00 | - | 36,870,700.00 | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | 276,500.00 | 500,000.00 | 129,964.00 | 1,164,895.20 | - | - | - | - | - | - | - | 2,071,359.20 | 4.69 | 42,051,340.80 | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตเศรษฐกิจบุรีรัมย์ | 35,000,000 | - | 2,164,339.000 | - | - | แผน | - | - | - | 70,000.00 | 1,600,000.00 | 606,000.00 | 2,976,000.00 | 5,734,000.00 | 3,500,000.00 | 8,872,000.00 | 4,390,000.00 | - | 27,748,000.00 | - | 27,748,000.00 | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | 69,964.00 | 775,495.20 | - | - | - | - | - | - | - | 845,459.20 | 2.42 | 34,154,541 | | | |
| งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง | 35,000,000 | - | 2,164,339.000 | - | - | แผน | - | - | - | 70,000.00 | 1,600,000.00 | 606,000.00 | 2,976,000.00 | 5,734,000.00 | 3,500,000.00 | 8,872,000.00 | 4,390,000.00 | - | 27,748,000.00 | - | 27,748,000.00 | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | 69,964.00 | 775,495.20 | - | - | - | - | - | - | - | 845,459.20 | 2.42 | 34,154,541 | | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 ชุดออกวางแบบน้ำหยดตามแปลงข้าว อ่างบ่อปึงธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณดินชุด 825,000 ลบ.ม. เปลี่ยนปี ระบบระบายน้ำและเก็บกักน้ำลำห้วยแปก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณดินชุด ไม่น้อยกว่า 212,050 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง | 20,000,000 | | | | | แผน | | | | | | 176,000.00 | 1,976,000.00 | 3,734,000.00 | | 4,872,000.00 | 1,990,000.00 | | #VALUE! | | | โครงการชลประทานนครราชสีมา | | | |
| | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | | | | - | - | 20,000,000 | | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 ชุดออกหนองปรือ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณดินชุด 112,000 ลบ.ม. | 15,000,000 | | 2,164,339.000 | | | แผน | | | | 70,000.00 | 1,600,000.00 | 430,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 3,500,000.00 | 4,000,000.00 | 2,400,000.00 | | 15,000,000.00 | | | โครงการชลประทานนครราชสีมา | | | |
| | | | | | | ผล | | | | | 69,964.00 | 775,495.20 | | | | | | | | 845,459.20 | 5.64 | 14,154,541 | | | |

จังหวัดนครราชสีมา

หน่วย : บาท

| โครงการ / กิจกรรม / รายการ | วงเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (1) | วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง | | งบประมาณเพื่อจ่าย (4) | งบประมาณยกเลิก (5) | แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) (9) | | | | | | | | | | | ร้อยละการเบิกจ่าย (11) | งบประมาณยังไม่เบิกจ่าย (12) | หน่วยดำเนินการ (13) | หมายเหตุ | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------|-------------------|------------|--------------|
| | | ก่อนผูกพัน (2) | งานดำเนินการเอง (3) | | | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | รวม (10) | | | |
| | | | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | | | | | | ก.ย. | | |
| กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ทำเกษตรกรรมยั่งยืน | 1,220,000 | 82,000,000 | 1,138,000,000 | - | - | แผน | - | - | - | - | - | 364,000.00 | - | - | 800,000.00 | 56,000.00 | - | - | 1,220,000.00 | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | 276,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276,500.00 | 22.66 |
| งบดำเนินงาน | 1,220,000 | 82,000,000 | 1,138,000,000 | - | - | แผน | - | - | - | - | - | 364,000.00 | - | - | 800,000.00 | 56,000.00 | - | - | 1,220,000.00 | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | 276,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276,500.00 | 22.66 | 943,500 | | |
| กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ทำเกษตรกรรมยั่งยืน | 1,220,000 | 82,000,000 | 1,138,000,000 | - | - | แผน | - | - | - | - | - | 364,000.00 | - | - | 800,000.00 | 56,000.00 | - | - | 1,220,000.00 | | | สง.เกษตร | | |
| | | | | | | ผล | - | - | 276,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276,500.00 | 22.66 |
| กิจกรรมหลักที่ 3 การเรียนรู้สู่การปฏิบัติเกษตรอินทรีย์วิถีนครชัยบุรีร์ตลอดห่วงโซ่มูลค่า | 4,852,800 | - | 4,852,800,000 | - | - | แผน | 500,000.00 | 500,000.00 | - | 1,620,800.00 | 902,800.00 | 120,800.00 | 402,800.00 | 120,800.00 | 402,800.00 | 282,000.00 | - | - | 4,852,800.00 | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | 500,000.00 | 60,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560,000.00 | 11.54 |
| งบดำเนินงาน | 4,852,800 | - | 4,852,800,000 | - | - | แผน | 500,000.00 | 500,000.00 | - | 1,620,800.00 | 902,800.00 | 120,800.00 | 402,800.00 | 120,800.00 | 402,800.00 | 282,000.00 | - | - | 4,852,800.00 | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | 500,000.00 | 60,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 560,000.00 | 11.54 | 4,292,800 | | | |
| กิจกรรมย่อย การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตรกรรมยั่งยืนนครชัยบุรีร์ | 4,852,800 | - | 4,852,800 | - | - | แผน | 500,000.00 | 500,000.00 | - | 1,620,800.00 | 902,800.00 | 120,800.00 | 402,800.00 | 120,800.00 | 402,800.00 | 282,000.00 | - | - | 4,852,800.00 | | | มหาวิทยาลัยราชภัฏ | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | 500,000.00 | 60,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560,000.00 | 11.54 |
| กิจกรรมหลักที่ 4 การยกระดับมาตรฐานฟาร์มและการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM | 422,100 | - | 422,100,000 | - | - | แผน | - | - | - | - | - | 422,100.00 | - | - | - | - | - | - | 422,100.00 | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | 10,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,200.00 | 2.42 |
| งบดำเนินงาน | 422,100 | - | 422,100 | - | - | แผน | - | - | - | - | - | 422,100.00 | - | - | - | - | - | - | 422,100.00 | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | 10,200.00 | - | - | - | - | - | - | 10,200.00 | 2.42 | 411,900 | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 5 การยกระดับการผลิตเนื้อคุณภาพ และโควากิวนครชัยบุรีร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน | 2,341,800 | - | 2,341,800,000 | - | - | แผน | - | - | - | - | - | 2,341,800.00 | - | - | - | - | - | - | 2,341,800.00 | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | 379,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379,200.00 | 16.19 |
| งบดำเนินงาน | 2,341,800 | - | 2,341,800 | - | - | แผน | - | - | - | - | - | 2,341,800.00 | - | - | - | - | - | - | 2,341,800.00 | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | 379,200.00 | - | - | - | - | - | - | 379,200.00 | 16.19 | 1,962,600 | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์แปะคุสึดร์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน | 286,000 | - | 286,000,000 | - | - | แผน | - | - | - | - | - | 286,000.00 | - | - | - | - | - | - | 286,000.00 | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบดำเนินงาน | 286,000 | - | 286,000 | - | - | แผน | - | - | - | - | - | 286,000.00 | - | - | - | - | - | - | 286,000.00 | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286,000 | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีร์ | 60,109,200 | 8,987,847.34 | 9,921,300,000 | 12,152.66 | - | แผน | - | - | 4,515,200.00 | 971,800.00 | 187,300.00 | 9,066,800.00 | 4,695,700.00 | 4,742,500.00 | 18,867,900.00 | 1,500,000.00 | 15,562,000.00 | - | - | 60,109,200.00 | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | 4,675,071.55 | 723,000.00 | 143,024.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,541,095.55 |
| 2. โครงการยกระดับขีดความสามารถท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีร์ | 60,109,200 | 8,987,847.34 | 9,921,300,000 | 12,152.66 | - | แผน | - | - | 4,515,200.00 | 971,800.00 | 187,300.00 | 9,066,800.00 | 4,695,700.00 | 4,742,500.00 | 18,867,900.00 | 1,500,000.00 | 15,562,000.00 | - | - | 60,109,200.00 | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | 4,675,071.55 | 723,000.00 | 143,024.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,541,095.55 | 9.22 | 54,555,951.79 | | |
| กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว | 39,000,000 | 8,987,847.340 | - | 12,152.660 | - | แผน | - | - | - | - | - | 9,000,000.00 | - | - | 15,000,000.00 | - | 15,000,000.00 | - | - | 39,000,000.00 | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

จังหวัดนครราชสีมา

หน่วย : บาท

| โครงการ / กิจกรรม / รายการ | วงเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (1) | วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง | | งบประมาณที่เหลือจ่าย (4) | งบประมาณยกเลิก (5) | | แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) (9) | | | | | | | | | | ร้อยละการเบิกจ่าย (11) | งบประมาณยังไม่เบิกจ่าย (12) | หน่วยดำเนินการ (13) | หมายเหตุ | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----|---|------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------|---------------------------|----------------------------|---|
| | | ก่อนผูกพัน (2) | งานดำเนินการเอง (3) | | | | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | รวม (10) | | | | |
| | | | | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | | | | ส.ค. | ก.ย. | | |
| งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง | 39,000,000 | 8,987,847.340 | - | 12,152.660 | - | แผน | - | - | - | - | - | 9,000,000.00 | - | - | 15,000,000.00 | - | 15,000,000.00 | - | 39,000,000.00 | - | - | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,987,847 | | | |
| กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว | 39,000,000 | 8,987,847.340 | - | 12,152.660 | - | แผน | - | - | - | - | - | 9,000,000.00 | - | - | 15,000,000.00 | - | 15,000,000.00 | - | 39,000,000.00 | - | - | 38,987,847 | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,987,847 | | | |
| รายการย่อยที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ทางเข้าหาดชมตะวัน ต.บ้านราษฎร์ อ.เมืองสง จ.นครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.50 ม. ระยะทาง 6,000 กม. | 30,000,000 | | | | | แผน | | | | | | | | | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | | แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา | คาดจะลงนามเดือน เมษายน 65 | |
| | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | | | | - | - | 30,000,000 | | | |
| รายการย่อยที่ 2 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทล.2243 ตอนอ.เฝ้าฝอ - ปากช่อง จ.นครราชสีมา | 9,000,000 | 8,987,847.34 | | 12,152.66 | | แผน | | | | | | 9,000,000.00 | | | | | | | 9,000,000.00 | | | | | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | เลขที่สัญญา บร.55/2565 วันเริ่มต้น 15 มี.ค. 65 วันสิ้นสุด 7 ก.ย. 65 |
| | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | | | | - | - | 8,987,847.34 | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 8 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 7,856,000 | - | 3,000,000.000 | - | - | แผน | - | - | 4,515,200.00 | 340,800.00 | - | 66,800.00 | 763,300.00 | 723,300.00 | 1,446,600.00 | - | - | - | 7,856,000.00 | | | | | | |
| | | | 0.00 | | | ผล | - | - | 4,515,200.00 | 340,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,856,000.00 | 61.81 | 3,000,000 | | | | |
| งบดำเนินงาน | 7,856,000 | - | 3,000,000.000 | - | - | แผน | - | - | 4,515,200.00 | 340,800.00 | - | 66,800.00 | 763,300.00 | 723,300.00 | 1,446,600.00 | - | - | - | 7,856,000.00 | | | | | | |
| | | | 0.00 | | | ผล | - | - | 4,515,200.00 | 340,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,856,000.00 | 61.81 | 3,000,000 | | | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 8.1 พัฒนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มเศรษฐกิจบูรินทร์ | 4,856,000 | | | | | แผน | | | 4515200.000 | 340800.000 | | | | | | | | | 4,856,000.00 | | | | | | ตำรวจภูธรนครราชสีมา |
| | | | | | | ผล | | | 4,515,200.00 | 340,800.00 | | | | | | | | | 4,856,000.00 | 100.00 | - | | | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 8.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรีรินทร์ | 3,000,000 | | 3,000,000.00 | | | แผน | | | | | | 66,800.00 | 763,300.00 | 723,300.00 | 1,446,600.00 | | | | 3,000,000.00 | | | | | | วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา |
| | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | | | - | - | 3,000,000 | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ | 4,500,000 | - | 4,500,000.000 | - | - | แผน | - | - | - | - | - | - | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | 1,500,000.00 | - | - | 4,500,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500,000 | | | |
| งบดำเนินงาน | 4,500,000 | - | 4,500,000.000 | - | - | แผน | - | - | - | - | - | - | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | 1,500,000.00 | - | - | 4,500,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500,000 | | | |
| กิจกรรมย่อย เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรีรินทร์ | 4,500,000 | | 4,500,000.00 | | | แผน | | | | | | | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 1,500,000.00 | | | 4,500,000.00 | | | | | | นทร.อีสานนครราชสีมา |
| | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | | | - | - | 4,500,000 | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 10 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหนองให้มีคุณภาพ | 3,239,600 | - | 2,421,300.00 | - | - | แผน | - | - | - | 631,000.00 | 187,300.00 | - | - | - | 2,421,300.00 | - | - | - | 3,239,600.00 | | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | 159,871.55 | 382,200.00 | 143,024.00 | - | - | - | - | - | - | - | 685,095.55 | 21.15 | 2,554,504 | | | | |
| งบดำเนินงาน | 3,239,600 | - | 2,421,300.00 | - | - | แผน | - | - | - | 631,000.00 | 187,300.00 | - | - | - | 2,421,300.00 | - | - | - | 3,239,600.00 | | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | 159,871.55 | 382,200.00 | 143,024.00 | - | - | - | - | - | - | - | 685,095.55 | 21.15 | 2,554,504 | | | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 10.1 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหนอง | 631,000 | | | | | แผน | | | | 631,000.00 | | | | | | | | | 631,000.00 | | | | | | ศูนย์หนองไผ่นา นครราชสีมา |
| | | | | | | ผล | | | 106,971.55 | 382,200.00 | 37,500.00 | | | | | | | | 526,671.55 | 83.47 | 104,328 | | | | |

| โครงการ / กิจกรรม / รายการ | วงเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (1) | วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง | | งบประมาณเหลือจ่าย (4) | งบประมาณยกเลิก (5) | แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) (9) | | | | | | | | | | ร้อยละการเบิกจ่าย (11) | งบประมาณยังไม่เบิกจ่าย (12) | หน่วยดำเนินการ (13) | หมายเหตุ | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| | | ก่อนผูกพัน (2) | งานดำเนินการเอง (3) | | | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | รวม (10) | | | |
| | | | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | | | | ส.ค. | ก.ย. | |
| กิจกรรมย่อยที่ 10.2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ใหม่ | 187,300 | | | | | แผน | | | | | 187,300.00 | | | | | | 187,300.00 | | | ศูนย์หม่อนไหมฯ นครราชสีมา | | | |
| | | | | | | ผล | | | 52,900.00 | | 105,524.00 | | | | | | 158,424.00 | 84.58 | 28,876 | | | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 10.3 การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ | 2,421,300 | | 2,421,300.00 | | | แผน | | | | | | | | 2,421,300.00 | | | 2,421,300.00 | | | มทร.อีสาน นครราชสีมา | | | |
| | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | - | - | 2,421,300 | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 11 นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร | 5,513,600 | - | - | - | - | แผน | - | - | - | - | - | 2,932,400.00 | 2,019,200.00 | - | - | 562,000.00 | - | 5,513,600.00 | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,513,600 | | | |
| งบดำเนินงาน | 5,513,600 | - | - | - | - | แผน | - | - | - | - | - | 2,932,400.00 | 2,019,200.00 | - | - | 562,000.00 | - | 5,513,600.00 | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,513,600 | | | |
| กิจกรรมย่อย การเผยแพร่นวัตกรรมระบบการผลิตผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ | 5,513,600 | | | | | แผน | | | | | | 2,932,400.00 | 2,019,200.00 | | | 562,000.00 | | 5,513,600.00 | | | มทร.อีสาน นครราชสีมา | | |
| | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | | - | - | 5,513,600 | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 9,242,200 | | | | | แผน | 9,242,200 | - | 784,600.00 | 1,976,080.00 | 416,370.00 | 2,216,550.00 | 1,973,180.00 | 633,600.00 | 520,000.00 | 564,000.00 | 137,820.00 | 20,000.00 | 9,242,200.00 | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | 2,877,600.00 | - | 5,170.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,882,770.00 | 31.19 | 6,359,430 | | |
| 3. โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ | 9,242,200 | | | | | แผน | - | - | 784,600.00 | 1,976,080.00 | 416,370.00 | 2,216,550.00 | 1,973,180.00 | 633,600.00 | 520,000.00 | 564,000.00 | 137,820.00 | 20,000.00 | 9,242,200.00 | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | 2,877,600.00 | - | 5,170.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,882,770.00 | 31.19 | 6,359,430 | | |
| กิจกรรมหลักที่ 12 ผลิตอาสน์นครสร้างสุข สังคมเข้มแข็ง | 2,951,600 | | | | | แผน | - | - | 784,600.00 | 1,976,080.00 | 5,170.00 | 185,750.00 | - | - | - | - | - | - | 2,951,600.00 | | - | สง.สงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 | |
| | | | | | | ผล | - | - | 2,877,600.00 | - | 5,170.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,882,770.00 | 97.67 | 68,830 | | |
| งบดำเนินงาน | 2,951,600 | | | | | แผน | | | 784,600.00 | 1,976,080.00 | 5,170.00 | 185,750.00 | | | | | | | 2,951,600.00 | | - | | |
| | | | | | | ผล | | | 2,877,600.00 | | 5,170.00 | | | | | | | | 2,882,770.00 | 97.67 | 68,830 | | |
| กิจกรรมหลักที่ 13 ชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย | 4,848,000 | | | | | แผน | - | - | - | - | 411,200.00 | 948,200.00 | 1,613,180.00 | 633,600.00 | 520,000.00 | 564,000.00 | 137,820.00 | 20,000.00 | 4,848,000.00 | | | มทร.อีสาน นครราชสีมา | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,848,000 | | |
| งบดำเนินงาน | 4,848,000 | | | | | แผน | | | | | 411,200.00 | 948,200.00 | 1,613,180.00 | 633,600.00 | 520,000.00 | 564,000.00 | 137,820.00 | 20,000.00 | 4,848,000.00 | | - | | |
| | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | | | | - | 4,848,000 | | |
| กิจกรรมหลักที่ 14 การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน | 1,442,600 | | | | | แผน | - | - | - | - | 1,082,600 | 360,000 | - | - | - | - | - | - | 1,442,600.00 | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,442,600 | | |
| งบดำเนินงาน | 1,442,600 | | | | | แผน | - | - | - | - | 1,082,600 | 360,000 | - | - | - | - | - | - | 1,442,600.00 | | - | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,442,600 | | |
| กิจกรรมย่อย สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน | 1,442,600 | | | | | แผน | | | | | 1,082,600.00 | 360,000.00 | | | | | | | 1,442,600.00 | | | สง.สงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 | |
| | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1,442,600 | |
| งบบริหาร | 500,000.000 | | | | | แผน | | | | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | 500,000.00 | | | | |
| | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | | | | - | - | 500,000.0 | |
| ยอดรวมทั้งสิ้น | 113,974,100 | 9,069,847.34 | 21,126,339.00 | 12,152.66 | - | แผน | 500,000.00 | 500,000.00 | 5,299,800.00 | 4,738,680.00 | 3,206,470.00 | 15,524,050.00 | 10,147,680.00 | 11,330,900.00 | 24,090,700.00 | 11,274,000.00 | 20,089,820.00 | 20,000.00 | 106,722,100.00 | 9.21 | 103,466,722.59 | | |
| | | | | | | ผล | - | - | 7,829,171.55 | 1,223,000.00 | 278,158.00 | 1,164,895.20 | - | - | - | - | - | - | 10,495,224.75 | 9.21 | 103,466,722.59 | | |

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

1. สนงลพ (ถนน) มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลางมีการยกเลิกหนังสือ ๖ 845) ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่
2. ได้รับจัดสรรงบดำเนินงานไม่เต็มวงเงิน ทำให้ไม่เป็นที่ไปตามแผนการดำเนินงาน / งานจ้างเหมาซึ่งไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และกิจกรรมการพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ เกษตรกรยังขาดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด - 19 ทำให้ไม่ประสงค์จะรับการฝึกอบรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. แผนเผยแพร่การสร้างเสริมความเชื่อมั่นในการจัดฝึกอบรม โดยให้ทำตามมาตรฐาน การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19

จังหวัดชัยภูมิ

หน่วย : บาท

| โครงการ / กิจกรรม / รายการ | วงเงิน งบ.ที่ได้รับอนุมัติ (1) | วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง | | งบประมาณเหลือจ่าย (4) | งบประมาณยกเลิก (5) | | แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อปัญหาแล้ว) (9) | | | | | | | | | | | | | ร้อยละการเบิกจ่าย (11) | งบประมาณยังไม่เบิกจ่าย (12) | หน่วยดำเนินการ (13) | หมายเหตุ |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--|------|-----------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|----------|
| | | ก่อนนี้ผู้กพัน (2) | งานดำเนินการเอง (3) | | | | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | รวม (10) | | | | |
| | | | | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| งบบริหาร | 500,000,000 | | | | | | แผน | | 50,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 100,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | 100,000.00 | 55,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 500,000.00 | | | | |
| | | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | | - | - | 500,000 | | |
| ยอดรวมทั้งสิ้น | 87,699,600 | 39,975,000 | 10,000,000 | 25,000 | - | | แผน | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 24,431,300.00 | 26,587,000.00 | 24,048,000.00 | 5,690,000.00 | 5,225,000.00 | 1,542,300.00 | 36,000.00 | 87,699,600.00 | | | | |
| | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,674,600 | | |

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)

1. กิจกรรมด้านขอประทาน มีขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ 2 รายการ ซึ่งเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว อยู่ระหว่างนัดหมายตรวจพื้นที่
2. มีการจัดตั้งดำเนินการงบกรมก่อน จึงทำให้ไม่เลื่อนดำเนินการขงพัฒนากลุ่มจังหวัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ขึ้นเสอค่าของงบประมาณ ส่วนราชการควรมีการสำรวจ และขออนุญาตใช้พื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วไม่ล่าช้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วย : บาท

| โครงการ / กิจกรรม / รายการ | วงเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (1) | วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง | | งบประมาณเหลือจ่าย (4) | งบประมาทยกเลิก (5) | | แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อนผูกพันแล้ว) (9) | | | | | | | | | | | | | | | ร้อยละการเบิกจ่าย (11) | งบประมาดยังไม่เบิกจ่าย (12) | หน่วยดำเนินการ (13) | หมายเหตุ |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----|--|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| | | ก่อนผูกพัน (2) | งานดำเนินการเอง (3) | | | | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | รวม (10) | | | | | | |
| | | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | | | |
| (1)งบดำเนินงาน | 3,889,500 | - | - | - | - | แผน | - | - | 1,209,900.00 | - | 1,590,800.00 | 444,800.00 | - | - | 637,500.00 | - | - | 6,500.00 | 3,889,500.00 | | | | | | |
| | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 500,700.00 | 512,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013,400.00 | 26.05 | 2,876,100.00 |
| (2)งบลงทุน | 60,000,000 | 19,980,000.000 | - | 20,000.000 | - | แผน | - | - | 4,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | - | 44,000,000.00 | - | - | 7,000,000.00 | 60,000,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,980,000.00 |
| สิ่งก่อสร้าง | 60,000,000 | 19,980,000.000 | - | 20,000.000 | - | แผน | - | - | 4,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | - | 44,000,000.00 | - | - | 7,000,000.00 | 60,000,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,980,000.00 |
| ครุภัณฑ์ | | | | | | แผน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)งบรายจ่ายอื่น | 500,000.00 | - | - | - | - | แผน | 30,000.00 | 30,000.00 | 65,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 65,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 65,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 65,000.00 | 500,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | ผล | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,000.00 | 12.00 | 440,000.00 |
| รวม 2โครงการ 6 กิจกรรม 1 งบบริหาร | 64,389,500 | 19,980,000.00 | - | 20,000.00 | - | แผน | 30,000.00 | 30,000.00 | 5,274,900.00 | 30,000.00 | 1,620,800.00 | 5,509,800.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 44,702,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 7,071,500.00 | 64,389,500.00 | | | | | | |
| | | | | | | | ผล | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 500,700.00 | 512,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,073,400.00 | 1.67 | 63,296,100.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร | 3,272,800 | - | - | - | - | แผน | - | - | 1,097,000.00 | - | 1,590,800.00 | - | - | 585,000.00 | - | - | - | 3,272,800.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 500,700.00 | 512,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013,400.00 | 30.96 | 2,259,400 |
| 1. โครงการพัฒนาวิสาหกิจรวมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรัมย์ | 3,272,800 | - | - | - | - | แผน | - | - | 1,097,000.00 | - | 1,590,800.00 | - | - | 585,000.00 | - | - | - | 3,272,800.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 500,700.00 | 512,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013,400.00 | 30.96 | 2,259,400 |
| กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน | 922,900 | - | - | - | - | แผน | - | - | - | - | 337,900.00 | - | - | 585,000.00 | - | - | - | 922,900.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 52,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,800.00 | 5.72 | 870,100 |
| งบดำเนินงาน | 922,900 | - | - | - | - | แผน | - | - | - | - | 337,900.00 | - | - | 585,000.00 | - | - | - | 922,900.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 52,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,800.00 | 5.72 | 870,100 |
| กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ทำเกษตรกรรมยั่งยืน | 922,900 | - | - | - | - | แผน | - | - | - | - | 337,900.00 | - | - | 585,000.00 | - | - | - | 922,900.00 | | | สง.เกษตรบุรีรัมย์ | | | | |
| | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 52,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,800.00 | 5.72 | 870,100 |
| กิจกรรมหลักที่ 2 การยกระดับมาตรฐานฟาร์มและการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM | 422,100 | - | - | - | - | แผน | - | - | 422,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 422,100.00 | | | | ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ | | | |
| | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 52,360.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,360.00 | | 369,740 |
| งบดำเนินงาน | 422,100 | - | - | - | - | แผน | - | - | 422,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 422,100.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 52,360.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,360.00 | 12.40 | 369,740 |
| กิจกรรมหลักที่ 3 การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควางถิ่นนครชัยบุรีรัมย์เพื่อ | 1,641,800 | - | - | - | - | แผน | - | - | 388,900.00 | - | 1,252,900.00 | - | - | - | - | - | - | 1,641,800.00 | | | | ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ | | | |
| | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 117,700.00 | 512,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630,400.00 | 38.40 | 1,011,400 |
| งบดำเนินงาน | 1,641,800 | - | - | - | - | แผน | - | - | 388,900.00 | - | 1,252,900.00 | - | - | - | - | - | - | 1,641,800.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 117,700.00 | 512,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630,400.00 | 38.40 | 1,011,400 |
| กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน | 286,000 | - | - | - | - | แผน | - | - | 286,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 286,000.00 | | | | ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ | | | |
| | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 277,840.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277,840.00 | 97.15 | 8,160 |
| งบดำเนินงาน | 286,000 | - | - | - | - | แผน | - | - | 286,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 286,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 277,840.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277,840.00 | 97.15 | 8,160 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรัมย์ | 60,616,700 | 19,980,000.00 | - | 20,000.00 | - | แผน | - | - | 4,112,900.00 | - | 5,444,800.00 | - | - | 44,052,500.00 | - | - | 7,006,500.00 | 60,616,700.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,596,700.00 |
| 2. โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรัมย์ | 60,616,700 | 19,980,000.00 | - | 20,000 | - | แผน | - | - | 4,112,900.00 | - | 5,444,800.00 | - | - | 44,052,500.00 | - | - | 7,006,500.00 | 60,616,700.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,596,700 |
| กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว | 60,000,000 | 19,980,000.00 | - | 20,000.000 | - | แผน | - | - | 4,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | - | 44,000,000.00 | - | - | 7,000,000.00 | 60,000,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,980,000 |

จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วย : บาท

| โครงการ / กิจกรรม / รายการ | วงเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (1) | วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง | | งบประมาณเฉลี่ยจ่าย (4) | งบประมาณยกเลิก (5) | | แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) (9) | | | | | | | | | | รวม (10) | ร้อยละการเบิกจ่าย (11) | งบประมาณยังไม่เบิกจ่าย (12) | หน่วยดำเนินการ (13) | หมายเหตุ | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|---|--|
| | | ก่อนผูกพัน (2) | งานดำเนินการเอง (3) | | | | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | | | | ส.ค. | ก.ย. | | |
| งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง | 60,000,000 | 19,980,000.00 | - | 20,000.000 | - | แผน | - | - | 4,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | - | 44,000,000.00 | - | - | 7,000,000.00 | 60,000,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,980,000 | | | |
| กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว | 60,000,000 | 19,980,000.00 | - | 20,000.000 | - | แผน | - | - | 4,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | - | 44,000,000.00 | - | - | 7,000,000.00 | 60,000,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,980,000 | | | |
| รายการย่อยที่ 1 ก่อสร้างขยรถยนต์ขนาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอนบุรีรัมย์ - แสงโสม ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร พร้อมเครื่องหมายอำนวยความสะดวกและปลอดภัย | 40,000,000 | | | | | แผน | | | | | | | | | 40,000,000.00 | | | | 40,000,000.00 | | | | | แนวทางการลงทุนบุรีรัมย์ คาดว่าจะลงนาม มีนาคม 65 | |
| | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการย่อยที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2117 - บ้านละหานทราย ตำบลยายแถมพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 15.00 เมตร โหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร | 20,000,000 | 19,980,000.00 | | 20,000 | | แผน | | | 4,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | | | แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ | เลขที่สัญญา 69/2565 ลงวันที่ 26/ม.ค./65 เริ่มต้น 27/ม.ค./65 สิ้นสุดวันที่ 15 /มิ.ย./65 |
| | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,980,000 | | |
| กิจกรรมหลักที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ | 616,700 | - | - | - | - | แผน | - | - | 112,900.00 | - | - | 444,800.00 | - | - | 52,500.00 | - | - | 6,500.00 | 616,700.00 | | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616,700 | | | |
| งบดำเนินงาน | 616,700 | - | - | - | - | แผน | - | - | 112,900.00 | - | - | 444,800.00 | - | - | 52,500.00 | - | - | 6,500.00 | 616,700.00 | | | | | | |
| | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616,700 | | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 10.1 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน | 429,400 | | | | | แผน | | | 1,000.00 | | | 381,400.00 | | | 45,500.00 | | | 1,500.00 | 429,400.00 | | | | | ศูนย์หม่อนไหมนาบุรีรัมย์ | |
| | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | 429,400 | | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 10.2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตไซไหม | 187,300 | | | | | แผน | | | 111,900.00 | | | 63,400.00 | | | 7,000.00 | | | 5,000.00 | 187,300.00 | | | | | ศูนย์หม่อนไหมนาบุรีรัมย์ | |
| | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | 187,300 | | | |
| งบบริหาร | 500,000 | | | | | แผน | 30,000.00 | 30,000.00 | 65,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 65,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 65,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 65,000.00 | 500,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | ผล | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | | 60,000.00 | | | 12.00 | 440,000 | | |
| ยอดรวมทั้งสิ้น | 64,389,500 | 19,980,000 | - | 20,000 | - | แผน | 30,000.00 | 30,000.00 | 5,274,900.00 | 30,000.00 | 1,620,800.00 | 5,509,800.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 44,702,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 7,071,500.00 | 64,389,500.00 | | | | | | |
| | | | | | | ผล | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 500,700.00 | 512,700.00 | - | - | - | - | - | - | 1,073,400.00 | 1.67 | 63,296,100 | | | | |

ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

1. ส่วนราชการมีงบหลายตัว ทั้งงบกรม งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด จึงทำให้เกิดความล่าช้า
2. งบดำเนินงานได้รับจัดสรรเป็นรายงวด ทำให้บางกิจกรรมต้องรองบประมาณจัดสรรก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

-

จังหวัดสุรินทร์

หน่วย : บาท

| โครงการ / กิจกรรม / รายการ | วงเงิน งบ.ที่ได้รับอนุมัติ (1) | วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง | | งบประมาณ เหลือจ่าย (4) | งบประมาณ ยกเลิก (5) | รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน | | | แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) (9) | | | | | | | | | | ร้อยละ การเบิกจ่าย (11) | งบประมาณ ยังไม่เบิกจ่าย (12) | หน่วยดำเนินการ (13) | หมายเหตุ | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|------|------|------|-------------|------------|---------------|------|-------------|---------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|----------|------------|-------------------------|-------------------------|
| | | ก่อหนี้ผูกพัน (2) | งานดำเนินการเอง (3) | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ (6) | อยู่ระหว่างดำเนินการ (7) | คาดว่าจะจัดซื้อ/จ้าง (8) | ไตรมาสที่ 1 | | | | ไตรมาสที่ 2 | | ไตรมาสที่ 3 | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | รวม (10) | | | |
| | | | | | | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | | | | ส.ค. | ก.ย. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) งบดำเนินงาน | 3,335,900 | - | - | - | - | | | | แผน | - | - | - | - | 208,700.00 | 1,418,590.00 | - | - | 1,695,890.00 | - | - | 12,720.00 | 3,335,900.00 | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 74,700.00 | 10,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,900.00 | 2.55 | 3,251,000 |
| (2) งบลงทุน | 80,000,000 | 49,265,000.00 | - | 735,000.000 | - | | | | แผน | - | - | - | - | - | 36,342,000.00 | - | - | 34,300,000.00 | - | 6,358,000.00 | 3,000,000.00 | 80,000,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,265,000 |
| สิ่งก่อสร้าง | 80,000,000 | 49,265,000 | - | 735,000 | - | | | | แผน | - | - | - | - | - | 36,342,000.00 | - | - | 34,300,000.00 | - | 6,358,000.00 | 3,000,000.00 | 80,000,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,265,000 |
| ครุภัณฑ์ | | | | | | | | | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) งบรายจ่ายอื่น | 500,000.00 | - | - | - | - | | | | แผน | - | - | - | - | - | 250,000.00 | - | - | - | - | 250,000.00 | 500,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 45,545.00 | 3,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,045.00 | 9.81 | 450,955 |
| รวม 3 โครงการ 8 กิจกรรม 1 งบบริหาร | 83,835,900 | 49,265,000.00 | - | 735,000.00 | - | | | | แผน | - | - | - | - | 208,700.00 | 38,010,590.00 | - | - | 35,995,890.00 | - | 6,358,000.00 | 3,262,720.00 | 83,835,900.00 | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 120,245.00 | 13,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 133,945.00 | 0.16 | 82,966,955 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมครบวงจร | 32,554,000 | - | - | - | - | | | | แผน | - | - | - | - | 208,700.00 | 15,290,150.00 | - | - | 10,691,150.00 | - | 6,358,000.00 | 6,000.00 | 32,554,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | 10,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,200.00 | 0.03 | 32,543,800 |
| 1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ | 32,554,000 | - | - | - | - | | | | แผน | - | - | - | - | 208,700.00 | 15,290,150.00 | - | - | 10,691,150.00 | - | 6,358,000.00 | 6,000.00 | 30,000,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | 10,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,200.00 | 2.42 | 32,543,800 |
| กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์ | 30,000,000 | - | - | - | - | | | | แผน | - | - | - | - | - | 14,342,000.00 | - | - | 9,300,000.00 | - | 6,358,000.00 | - | 30,000,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000,000 |
| งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง | 30,000,000 | - | - | - | - | 2 | | | แผน | - | - | - | - | - | 14,342,000.00 | - | - | 9,300,000.00 | - | 6,358,000.00 | - | 30,000,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000,000 |
| กิจกรรมย่อย สดางิฐบ้นัด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตากลาง ตำบลกระโท อำเภอกำหนดุญ จังหรัศูรินทร์ | 30,000,000 | | | | | | | | แผน | - | - | - | - | - | 14,342,000.00 | - | - | 9,300,000.00 | - | 6,358,000.00 | - | 30,000,000.00 | | | โครงการสะพานสุรินทร์ | คาดว่าจะลงนาม เมษายน 65 |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | 657,700 | - | - | - | - | | | | แผน | - | - | - | - | 208,700.00 | - | - | - | - | 443,000.00 | - | 6,000.00 | 657,700.00 | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 657,700 |
| งบดำเนินงาน | 657,700 | - | - | - | - | | | | แผน | - | - | - | - | 208,700.00 | - | - | - | - | 443,000.00 | - | 6,000.00 | 657,700.00 | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 657,700 |
| กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | 657,700 | | | | | | | | แผน | - | - | - | - | 208,700.00 | - | - | - | - | 443,000.00 | - | 6,000.00 | 657,700.00 | | | สนง.เกษตรสุรินทร์ | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 657,700 |
| กิจกรรมหลักที่ 3 การยกระดับมาตรฐานฟาร์มและการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM | 422,100 | - | - | - | - | | | | แผน | - | - | - | - | - | 211,050.00 | - | - | 211,050.00 | - | - | - | 422,100.00 | | | ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | 10,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,200.00 |
| งบดำเนินงาน | 422,100 | | | | | | | | แผน | - | - | - | - | - | 211,050.00 | - | - | 211,050.00 | - | - | - | 422,100.00 | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | 10,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,200.00 |
| กิจกรรมหลักที่ 4 การยกระดับการผลิตเนื้อคุณภาพ และโคเวทิวกรชัยบุรีรินทร์เพื่อ | 1,188,200 | - | - | - | - | | | | แผน | - | - | - | - | - | 594,100.00 | - | - | 594,100.00 | - | - | - | 1,188,200.00 | | | ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบดำเนินงาน | 1,188,200 | | | | | | | | แผน | - | - | - | - | - | 594,100.00 | - | - | 594,100.00 | - | - | - | 1,188,200.00 | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน | 286,000 | - | - | - | - | | | | แผน | - | - | - | - | - | 143,000.00 | - | - | 143,000.00 | - | - | - | 286,000.00 | | | ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบดำเนินงาน | 286,000 | | | | | | | | แผน | - | - | - | - | - | 143,000.00 | - | - | 143,000.00 | - | - | - | 286,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

จังหวัดสุรินทร์

หน่วย : บาท.

| โครงการ / กิจกรรม / รายการ | วงเงิน งบ.ที่ได้รับอนุมัติ (1) | วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง | | งบประมาณ เหลือจ่าย (4) | งบประมาณ ยกเลิก (5) | รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน | | | แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) (9) | | | | | | | | | | ร้อยละ การเบิกจ่าย (11) | งบประมาณ ยังไม่เบิกจ่าย (12) | หน่วยดำเนินการ (13) | หมายเหตุ | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|------|------|------|-------------|------------|---------------|------|-------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---|------|--|
| | | ก่อนผูกพัน (2) | งานดำเนินการเอง (3) | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ (6) | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (7) | คาดว่าจะ จัดซื้อ/จ้าง (8) | ไตรมาสที่ 1 | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | | | ไตรมาสที่ 4 | | | รวม (10) | | | |
| | | | | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | | | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ค.ค. | | พ.ย. | ธ.ค. | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ในนครชัยบุรีรินทร์ | 50,187,300 | 49,265,000.00 | - | 735,000.00 | - | | | | แผน | - | - | - | - | - | 22,173,140.00 | - | - | 25,007,440.00 | - | - | 3,006,720.00 | 50,187,300.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 74,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | 74,700.00 | 0.15 | 49,377,600.00 | | | | | |
| 2. โครงการยกระดับขีดความสามารถท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ในนครชัยบุรีรินทร์ | 50,187,300 | 49,265,000.00 | - | 735,000.00 | - | | | | แผน | - | - | - | - | - | 22,173,140.00 | - | - | 25,007,440.00 | - | - | 3,006,720.00 | 50,187,300.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 74,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | 74,700.00 | 0.15 | 49,377,600.00 | | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว | 50,000,000 | 49,265,000.00 | - | 735,000.00 | - | | | | แผน | - | - | - | - | - | 22,000,000.00 | - | - | 25,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,265,000.00 | | | | | |
| งบลงทุน - สิ่งก่อสร้าง | 50,000,000 | 49,265,000.00 | - | 735,000.00 | - | | | | แผน | - | - | - | - | - | 22,000,000.00 | - | - | 25,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,265,000.00 | | | | | |
| กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว | 50,000,000 | 49,265,000.00 | - | 735,000.00 | - | | | | แผน | - | - | - | - | - | 22,000,000.00 | - | - | 25,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,265,000.00 | | | | | |
| รายการย่อยที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2328 - บ้านสนวน ตำบลจรูญ อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร | 20,000,000 | 19,905,000.00 | | 95,000.00 | | | | | แผน | | | | | | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 | | | | แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ | ลงนามในสัญญาวันที่ 17 มกราคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 (13 งวดงาน) ความก้าวหน้าของผลงาน 8.15% | | |
| | | | | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | | | - | - | 19,905,000.00 | | | | | |
| รายการย่อยที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2124 - บ้านสนวน ตำบลทพรักษา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร | 30,000,000 | 29,360,000.00 | | 640,000.00 | | | | | แผน | | | | | | 12,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | | แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ | ลงนามในสัญญาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 สิงหาคม 2565 (15 งวดงาน) ความก้าวหน้าของผลงาน 4.32 % | | |
| | | | | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | | | - | - | 29,360,000.00 | | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ | 187,300 | - | - | - | - | | | | แผน | - | - | - | - | - | 173,140.00 | - | - | 7,440.00 | - | - | 6,720.00 | 187,300.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 74,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | 74,700.00 | 39.88 | 112,600.00 | | | | | |
| งบดำเนินงาน | 187,300 | - | - | - | - | | | | แผน | - | - | - | - | - | 173,140.00 | - | - | 7,440.00 | - | - | 6,720.00 | 187,300.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 74,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | 74,700.00 | 39.88 | 112,600.00 | | | | | |
| กิจกรรมย่อยที่ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหม | 187,300 | | | | | | | | แผน | | | | | | 173,140.00 | | | 7,440.00 | | | 6,720.00 | 187,300.00 | | | | ศูนย์หม่อนไหมสุรินทร์ | | | |
| | | | | | | | | | ผล | | | | | | 74,700.00 | | | | | | | 74,700.00 | 39.88 | 112,600.00 | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 594,600 | - | - | - | - | | | | แผน | - | - | - | - | - | 297,300.00 | - | - | 297,300.00 | - | - | - | 594,600.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 594,600.00 | | | | | |
| 3. โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยในนครชัยบุรีรินทร์ | 594,600 | - | - | - | - | | | | แผน | - | - | - | - | - | 297,300.00 | - | - | 297,300.00 | - | - | - | 594,600.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 594,600.00 | | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 8 การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน | 594,600 | - | - | - | - | | | | แผน | - | - | - | - | - | 297,300.00 | - | - | 297,300.00 | - | - | - | 594,600.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 594,600.00 | | | | | |
| งบดำเนินงาน | 594,600 | - | - | - | - | | | | แผน | - | - | - | - | - | 297,300.00 | - | - | 297,300.00 | - | - | - | 594,600.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 594,600.00 | | | | | |
| กิจกรรมย่อย มิกอบรวมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุ | 594,600 | | | | | | | | แผน | | | | | | 297,300.00 | | | 297,300.00 | | | | 594,600.00 | | | | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | | | |
| | | | | | | | | | ผล | | | | | | | | | | | | | - | - | 594,600.00 | | | | | |
| งบบริหาร | 500,000.000 | | | | | | | | แผน | | | | | | 250,000.00 | | | | | | 250,000.00 | 500,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | | | | | | 45,545.00 | | | 3,500.00 | | | | 49,045.00 | 9.81 | 450,955.00 | | | | | |
| ยอดรวมทั้งสิ้น | 83,835,900 | 49,265,000.00 | - | 735,000.00 | - | | | | แผน | - | - | - | - | 208,700.00 | 38,010,590.00 | - | - | 35,995,890.00 | - | - | 6,358,000.00 | 3,262,720.00 | 83,835,900.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | ผล | - | - | - | - | 120,245.00 | 13,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | 133,945.00 | 0.16 | 82,966,955.00 | | | | |

จังหวัดสุรินทร์

หน่วย : บาท

| โครงการ / กิจกรรม / รายการ | วงเงิน งบ.ที่ได้รับอนุมัติ (1) | วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง | | งบประมาณ เหลือจ่าย (4) | งบประมาณ ยกเลิก (5) | รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน | | | แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) (9) | | | | | | | | | | ร้อยละ การเบิกจ่าย (11) | งบประมาณ ยังไม่เบิกจ่าย (12) | หน่วยดำเนินการ (13) | หมายเหตุ | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|------|------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-------------|------|------|
| | | ก่อหนี้ผูกพัน (2) | งานดำเนินการเอง (3) | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ (6) | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (7) | คาดว่าจะ จัดซื้อ/จ้าง (8) | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | รวม (10) | | |
| | | | | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | | | | ส.ค. | ก.ย. |

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)

- 1.กิจกรรมฝึกอบรมมีการชะงัก เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมคิดเชื่อโควิด - 19
2. งบดำเนินงานจัดสรรเป็นรายงวด ทำให้บางกิจกรรมที่มีแผนการดำเนินงานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ต่อรอรับการจัดสรร

ข้อมูลเพิ่มเติม

-



กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

<http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/>
