



นครชัยบุรีนगर



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่
ไตรมาสที่ 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเชิงเหนือตอนล่าง 1
โทร/โทรสาร 044 - 243- 090

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
ความเป็นมา	1
- เป้าหมายการเบิกจ่าย	1
ผลการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	1
- งบประมาณปี พ.ศ. 2566	2
- งบประมาณปี พ.ศ. 2565	3
ผลการดำเนินงานจังหวัดนครราชสีมา	4
- งบประมาณปี พ.ศ. 2566	4
- การติดตามในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	7
ผลการดำเนินงานจังหวัดชัยภูมิ	10
- งบประมาณปี พ.ศ. 2566	10
- งบประมาณปี พ.ศ. 2565	14
- การติดตามในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	14
ผลการดำเนินงานจังหวัดบุรีรัมย์	18
- งบประมาณปี พ.ศ. 2566	18
- การติดตามในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	21
ผลการดำเนินงานจังหวัดสุรินทร์	24
- งบประมาณปี พ.ศ. 2566	24
- การติดตามในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	28
สรุปปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ	31
ภาคผนวก	
- คำสั่งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ	
- คณะผู้จัดทำ	

ความเป็นมา

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้กำหนดปฏิทินการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และที่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยได้กำหนดติดตามขึ้นในไตรมาสที่ 3 ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งรัด ติดตาม และกำกับดูแลหน่วยงานในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดำเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเบิกจ่ายงบประมาณที่กั้นเงินไว้เบิกเหลืออมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างเคร่งครัด กลุ่มจังหวัดฯ จึงกำหนดติดตามในพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ แต่ละจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรอ.กลุ่มจังหวัด วันที่ 23 มิ.ย. 2566 ณ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 มิ.ย. 2566 ณ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 28 - 29 มิ.ย. 2566 ณ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ตามลำดับ โดยเป็นช่วงเช้าการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และการลงข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e MENSOCR) ช่วงบ่ายสุ่มตรวจพื้นที่ในกิจกรรมที่มีปัญหาและอุปสรรค และกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

เป้าหมายการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่าย ภาพรวม	32.00	34.08	52.00	56.24	75.00	81.74	93.00	100.00
รายจ่าย ประจำ	35.00	35.33	55.00	55.78	80.00	81.76	98.00	100.00
รายจ่าย ลงทุน	19.00	28.96	39.00	58.15	57.00	81.65	75.00	100.00

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในไตรมาสที่ 3 ภาพรวมร้อยละ 75 ในรายจ่ายประจำร้อยละ 80 และรายจ่ายลงทุนไว้ ร้อยละ 57

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 314,507,200 บาท จำแนกเป็นงบดำเนินงาน 7,140,100 บาท งบลงทุน 302,367,100 บาท และงบรายจ่ายอื่น 5,000,000 บาท ดังนี้

	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น
จังหวัดนครราชสีมา	85,277,232	82,120,895	2,656,337	500,000
จังหวัดชัยภูมิ	92,555,794	90,706,965	1,348,829	500,000
จังหวัดบุรีรัมย์	53,762,928	51,332,275	1,930,653	500,000
จังหวัดสุรินทร์	79,911,246	78,206,965	1,204,281	500,000
งบบริหารฯ	3,000,000	-	-	3,000,000
รวมทั้งสิ้น	314,507,200	302,367,100	7,140,100	5,000,000

หมายเหตุ : งบบริหารงาน (รายจ่ายอื่น) จังหวัดละ 500,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากการติดตามในพื้นที่ (23 – 29 มิถุนายน 2566) กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 314,507,200 บาท และผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 132,627,123.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.17 ซึ่งต่ำกว่า เป้าหมาย ร้อยละ 32.83 จำแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัด	งบจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เหลือจ่าย	ยังไม่เบิกจ่าย
นครราชสีมา	85,277,232	40,089,029.99	47.01	6,858,818.58	38,329,383.43
ชัยภูมิ	92,555,794	59,171,973.42	63.93	140,100.9	33,243,719.68
บุรีรัมย์	53,762,928	5,088,599.05	9.46	332,553	48,341,775.95
สุรินทร์	79,911,246	27,184,485.35	34.02	12,911,099.30	39,815,661.35
กลุ่มจังหวัดฯ	3,000,000	1,093,036	36.43	-	1,906,964
รวมทั้งสิ้น	314,507,200	132,627,123.81	42.17	20,242,571.78	161,637,504.41

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกเป็นรายโครงการ จำนวน 4 โครงการ 5 กิจกรรม 1 งบบริหาร ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	147,500,000	22,596,042.71	17.70	105,273,039.41
	กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์ (14 รายการ)	147,500,000.	22,596,042.71	17.70	105,273,039.41
2	โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยนนครชัยบุรีรินทร์	9,090,500	2,180,440	24.81	6,609,285

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
	2.1 กิจกรรม การยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนรุกรกิจชุมชนด้วยการเกษตรแม่นยำ	9,090,500	2,180,440	24.81	6,609,285
	(1) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนรุกรกิจชุมชนด้วยการเกษตรแม่นยำ	47,840	32,700	68.35	15,140
	(2) ถ่ายทอดความรู้การจัดการดินปุ๋ยชุมชนด้วยการเกษตรแม่นยำ 2 ครั้ง	9,042,660	2,147,740	24.57	6,594,145
3	โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตปุ๋ยสูตรอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ครบวงจร	2,762,700	2,694,599.1	97.53	68,000
	3.1 กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตปุ๋ย - แกะ	1,600,000	1,531,899.10	95.76	68,000
	3.2 กิจกรรม สร้างผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าปุ๋ยสูตร	1,162,700	1,162,700	100	-
4	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	150,154,000	103,069,910	68.79	46,773,312
	กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว (10 รายการ ส่วนเงินเหลือจ่าย 1 รายการ อยู่ระหว่างอนุมัติ จึงยังไม่นำมารวม)	150,154,000	103,069,910	68.79	46,773,312
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	5,000,000	2,086,132	41.72	2,913,868
	รวมทั้งสิ้น	314,507,200	132,627,123.81	42.17	161,637,504.41

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากการติดตามในพื้นที่ (23 – 29 มิถุนายน 2566) กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 352,899,100 บาท และผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 333,731,610.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.57 มีเงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 4,089,029.75 บาท จำแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัด	งบจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	เหลือจ่าย
นครราชสีมา	114,239,543	102,441,692.18	89.67	-	11,797,850.82
ชัยภูมิ	89,037,735.96	82,519,077.65	92.68	4,089,029.75	2,429,628.56
บุรีรัมย์	64,389,500	64,251,642.52	99.79	-	137,857.48
สุรินทร์	82,232,321.04	82,160,620.25	99.91	-	71,700.79
กลุ่มจังหวัดฯ	3,000,000	2,358,577.50	78.62	-	641,422.50
รวมทั้งสิ้น	352,899,100	333,731,610.1	94.57	4,089,029.75	15,078,460.15



จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ออกติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 3 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 85,277,232 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 จำนวน 40,089,029.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.81 ดังนี้

หน่วย : บาท

หมวด	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	เหลือจ่าย
งบดำเนินงาน	2,656,337	1,100,335	41.42	1,556,002	-
งบลงทุน	82,120,895	38,644,374.99	51.35	36,617,701.43	6,858,818.58
- ครุภัณฑ์	2,120,895	-	-	2,120,895	-
- สิ่งก่อสร้าง	80,000,000	38,644,374.99	52.84	34,496,806.43	6,858,818.58
รายจ่ายอื่น	500,000	344,320	68.86	155,680	-
รวมทั้งสิ้น	85,277,232	40,089,029.99	49.81	38,329,385.43	6,858,818.58

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา จำแนกเป็นรายโครงการ จำนวน 4 โครงการ 5 กิจกรรม 1 งบบริหาร ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	40,000,000	5,426,464.99	16.32	27,824,716.43
	กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์ (2 รายการ)	40,000,000	5,426,464.99	16.32	27,824,716.43
2	โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์	4,086,557	451,160	11.04	3,635,397
	2.1 กิจกรรม การยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนรุกรกิจชุมชนด้วยการเกษตรแม่นยำ	4,086,557	451,160	11.04	3,635,397
	(1) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนรุกรกิจชุมชนด้วยการเกษตรแม่นยำ	17,360	17,360	100	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
	(2) ถ่ายทอดความรู้การจัดการดินปุ๋ยชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ 2 ครั้ง	4,069,197	433,800	10.66	3,635,397
3	โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีนทร์ครบวงจร	690,675	649,175	93.99	41,500
	3.1 กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตแพะ - แกะ	400,000	358,500	89.63	41,500.00
	3.2 กิจกรรม สร้างผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์	290,675	290,675	100	-
4	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	40,000,000	33,217,910	83.27	6,672,090
	กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว (4 รายการ)	40,000,000	33,217,910	83.27	6,672,090
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	500,000	344,320	68.86	155,680
	รวมทั้งสิ้น	85,277,232	40,089,029.99	47.01	38,329,383.43

โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีนทร์ ดำเนินการโดย โครงการชลประทานนครราชสีมา

กิจกรรมย่อยที่ 1 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง (ระยะที่ 1) บ้านหนองรังกา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมื่อนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 349,120 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 15,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันงานจ้างเหมาและเป็นงานดำเนินการเองรวม 10,508,748.92 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,280,119.15 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมย่อยที่ 2 แก้มลิงบ้านหนองจอก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 700,000 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 25,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันงานจ้างเหมาและเป็นงานดำเนินการเองรวม 22,742,432.5 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,146,345.84 บาท ล่าช้าเนื่องจากมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2 ครั้ง ครั้งแรกไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ ครั้งที่ 2 ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างเปลี่ยนสถานภาพจึงต้องเสนอกกรมบัญชีกลางเปลี่ยนแปลงในระบบ EGP สัญญาจ้างจึงสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2566

โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีนทร์

กิจกรรม การยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วยการเกษตรแม่นยำ แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดำเนินการโดยสำนักเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่ธุรกิจชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ งบประมาณ 17,360 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมย่อยที่ 2 ถ่ายทอดความรู้การจัดการดินปุ๋ยชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ 2 ครั้ง งบประมาณ 4,069,197 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน อบรมถ่ายทอดความรู้ จำนวน 1,948,302 บาท และงบลงทุน เป็นครุภัณฑ์ เครื่องผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ จำนวน 9 เครื่องๆ ละ 235,655 บาท รวม 2,120,895 บาท งบดำเนินงานเบิกจ่ายไป 433,800 บาท คงเหลือ 1,514,502 บาท คงเหลือการจัดซื้อวัสดุแม่ปุ๋ยเคมี 3 สูตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ไม่เกินวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 การจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ซึ่งมีแผนจะจัดในวันที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2566 สำหรับงบครุภัณฑ์ เนื่องจากมีผู้มายื่นเอกสารรายเดียวจึงต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เมื่อเย็นอีกครั้ง มีผู้วิจารณ์ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานการตอบกลับผู้วิจารณ์แล้ว เมื่อเห็นชอบร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้ผู้ชนะ มีการอุทธรณ์จากบริษัทที่ไม่ชนะในการจัดซื้อในประเด็น ดังนี้

1. การใช้งานเครื่องจักร ทดสอบแล้วเครื่องจักรไม่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง
2. การใช้เกณฑ์ราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ไม่มีช่างเทคนิคร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผล

ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมารวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาตอบข้ออุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ซึ่งจะดำเนินการกันงบประมาณเหลือในปีต่อไป

โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร

กิจกรรม ยกกระดับมาตรฐานการผลิตแพะ – แกะ งบประมาณ 400,000 บาท เบิกจ่าย 358,500 บาท คงเหลืองานติดตาม ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม สร้างผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ งบประมาณ 290,675 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

กิจกรรมย่อยที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3064 แยกทล.304 - บ้านหนองบัวศาลา ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร งบประมาณ 10,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 9,950,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3065 แยกทล.201 - บ้านโสกแจ้ง ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร งบประมาณ 10,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 9,995,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการย่อยที่ 3 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3036 แยกทล.226 - พิมาย ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร งบประมาณ 10,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 9,955,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการย่อยที่ 4 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.1034 แยก ทล.2 - บ้านวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร งบประมาณ 10,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 9,950,000 บาท เบิกจ่าย 3,317,910 บาท ล่าช้าเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการบางช่วงมีแนวท่อประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ จึงต้องแจ้งให้ทางอปท.ดำเนินการรื้อท่อ จึงสามารถเข้าดำเนินการได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานงบประมาณปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รายการ แก้มลิงบ้านหนองจอก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 700,000 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 25,000,000 บาท ดำเนินการโดย โครงการชลประทานนครราชสีมา

วัตถุประสงค์โครงการ ป้องกันอุทกภัยในฤดูฝน และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

ที่มาของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการแก้มลิงบ้านหนองจอก พร้อมอาคารประกอบ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรให้กับราษฎรบ้านหนองจอก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถทำประโยชน์ให้กับราษฎรบ้านหนองจอก จำนวน 938 ครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์ 1,176 ไร่ ปริมาตรกักเก็บเพิ่มขึ้น 700,000 ลูกบาศก์เมตร





2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว รายการ ก่อสร้าง ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.1034 แยก ทล.2 - บ้านวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร งบประมาณ 10,000,000 บาท ดำเนินการโดย แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

วัตถุประสงค์โครงการ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวก ระบบขนส่งให้รวดเร็ว เชื่อมต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการปศุสัตว์ และภาคการท่องเที่ยว

ที่มาของโครงการ เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางท่องเที่ยว โดยเป็นเส้นทางที่เชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ น้ำตกวะภูแก้ว และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา ความเชื่อ คือวัดป่าภูผาสอง มีร้านอาหาร และคาเฟ่ และอุทยานการเรียนรู้ ซึ่งโครงการและกิจกรรมนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ การพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ใหม่ ในแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการท่องเที่ยวได้บรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนและเกษตรกร ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา

ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการบางช่วงมีแนวท่อประปาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลมะเกลือใหม่ จึงต้องแจ้งให้ทางอปท.ดำเนินการรื้อท่อ โดยรื้อแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 จึงสามารถ เข้าดำเนินการได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566





จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ออกติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 3 ที่ดำเนินการ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่จันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมตาดโตน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด ชัยภูมิ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 92,555,794 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 จำนวน 59,171,973.42 บาท คิดเป็น ร้อยละ 63.93 ดังนี้

หน่วย : บาท

หมวด	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	เหลือจ่าย
งบดำเนินงาน	1,348,829	768,894.10	57.01	579,834	100.9
งบลงทุน	90,706,965	58,201,279.32	64.16	32,365,685.68	140,000
- ครุภัณฑ์	706,965	-	-	706,965	-
- สิ่งก่อสร้าง	90,000,000	58,201,279.32	64.67	31,658,720.68	140,000
รายจ่ายอื่น	500,000	344,320	68.86	155,680	-
รวมทั้งสิ้น	92,555,794	59,171,973.42	63.93	33,243,719.68	140,100.9

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ จำแนกเป็นรายโครงการ จำนวน 4 โครงการ 5 กิจกรรม 1 งบบริหาร ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	40,000,000	8,341,279.32	20.85	31,658,720.68
	กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ (8 รายการ)	40,000,000	8,341,279.32	20.85	31,658,720.68
2	โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์	1,365,119	78,320	5.74	1,286,799
	2.1 กิจกรรม การยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนรุกรกิจชุมชนด้วยการเกษตรแม่นยำ	1,365,119	78,320	5.74	1,286,799

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
	(1) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่ธุรกิจชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ	8,720	6,080	69.72	2,640
	(2) ถ่ายทอดความรู้การจัดการดินปุ๋ยชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ 2 ครั้ง	1,356,399	72,240	5.33	1,284,159
3	โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร	690,675	690,574	99.99	-
	3.1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตแพะ - แกะ	400,000	399,899.1	99.97	-
	3.2 กิจกรรมสร้างผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์	290,675	290,675	100	-
4	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	50,000,000	49,860,000	99.72	-
	กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว (3 รายการ)	50,000,000	49,860,000	99.72	-
	งบบุคลากรกลุ่มจังหวัด	500,000	201,800	40.36	298,200
	รวมทั้งสิ้น	92,555,794	59,171,973.42	63.93	33,243,719.68



โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์

กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ พร้อมชุดลอกลำห้วยฮ้าง บ้านโนนสาทอน ตำบลบ้านแท่น อำเภอ บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 29,700 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 1 จุด และก่อสร้าง อาคารท่อน้ำ 1 จุด ดำเนินการโดย โครงการชลประทานชัยภูมิ งบประมาณ 5,000,000 บาท เป็นงานดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,363,166.86 บาท ผลงาน 32% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566

กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำกุดเวียน บ้านกุดเวียน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการโดย โครงการชลประทานชัยภูมิ งบประมาณ 3,500,000 บาท เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่าย แล้ว จำนวน 1,396,432.73 บาท ผลงาน 55% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566

กิจกรรมย่อยที่ 3 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ พร้อมชุดลอกลำห้วยยาง บ้านประชาแสนสุข ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการโดย โครงการชลประทานชัยภูมิ งบประมาณ 7,000,000 บาท อยู่ระหว่างขอ อนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เนื่องจาก เป็นพื้นที่ป่าสงวน และอยู่ระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดิน ตอบกลับว่าที่ดินดังกล่าวไม่ได้นำไปเป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

กิจกรรมย่อยที่ 4 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยชีลอง บ้านหนองคล้า ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการโดย โครงการชลประทานชัยภูมิ งบประมาณ 3,000,000 บาท เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่าย แล้ว 1,964,207.67 บาท ผลงาน 60% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566

กิจกรรมย่อยที่ 5 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยโก บ้านหนองเบน ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ หน่วยดำเนินการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม – เจริญ งบประมาณ 4,500,000 บาท ได้รับอนุญาตใช้ พื้นที่ป่าจากสำนักจัดการป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา เสนออนุมัติโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างมอบอำนาจไปยังส่วนราชการ

กิจกรรมย่อยที่ 6 ก่อสร้างฝาย คสล. พร้อมชุดลอกท่าหินลาด บ้านโนนสะอาด ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ความสูง 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,600 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการโดยโครงการ ชลประทานชัยภูมิ งบประมาณ 7,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,351,829.20 บาท ผลงาน 50% คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2566

กิจกรรมย่อยที่ 7 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยส้มป่อย บ้านหลักศิลา ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการโดย โครงการชลประทานชัยภูมิ งบประมาณ 3,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,265,642.86 บาท ผลงาน 25% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566 ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากน้ำหลากก็อาจจะ ดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ

กิจกรรมย่อยที่ 8 ก่อสร้างฝายห้วยจอมแก้ว บ้านหนองใหญ่ ตำบลชัยใหญ่ อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ความสูง 3.00 เมตร ดำเนินการโดย โครงการชลประทานชัยภูมิ งบประมาณ 7,000,000 บาท อยู่ระหว่าง ขออนุญาตจาก

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เนื่องจาก เป็นพื้นที่ป่าสงวน และอยู่ระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดินตอบกลับว่าที่ดินดังกล่าวไม่ได้นำไปเป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีนทร์

กิจกรรม การยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วยการเกษตรแม่นยำ แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย หน่วยดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ งบประมาณ 8,720 บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,080 บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 2,640 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 2 ถ่ายทอดความรู้การจัดการดินปุ๋ยชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ 2 ครั้ง งบประมาณ 1,356,399 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน อบรมถ่ายทอดความรู้ จำนวน 649,434 บาท และงบลงทุน ครุภัณฑ์ รายการเครื่องผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 235,655 บาท รวม 706,956 บาท งบดำเนินงาน เบิกจ่ายไป 72,240 บาท คงเหลือการจัดซื้อวัสดุแม่ปุ๋ยเคมี 3 สูตร อยู่ระหว่างขั้นตอนตกลงราคา สำหรับงบครุภัณฑ์ มีผู้สนใจยื่นเอกสารวันที่ 26 มิถุนายน 2566 คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2566

โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีนทร์ครบวงจร

กิจกรรม ยกกระดับมาตรฐานการผลิตแพะ – แกะ งบประมาณ 400,000 บาท เบิกจ่าย 399,899.1 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่าย 100.9 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรม สร้างผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ งบประมาณ 290,675 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ

กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.3002 แยกทล.201 – บ้านเขว้า ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 9.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร งบประมาณ 17,500,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 17,480,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมย่อยที่ 2 ปรับปรุงผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.3010 แยกทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันทัน ตำบลโคกเจริญ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร

ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร งบประมาณ 21,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 20,980,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการย่อยที่ 3 ปรับปรุงผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ซย.4040 แยก ทล.2065 - แยกทล.2233 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร งบประมาณ 11,500,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 11,400,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (เฉพาะที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี)

โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยรินทร์

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยรินทร์

รายการ แก้มลิงบ้านมูลกระบือพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 10,000,000 บาท กันเงินไว้เบิกเหลือในปี 4,089,029.75 บาท เบิกจ่ายเงินกันไปจำนวน 905,484.85 บาท เบิกจ่ายสะสม จำนวน 5,38,487.31 บาท สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากรายการนี้ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ และผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง ภายหลังแก้ไขโดยให้ระดมทำงานขุดลอก และหากมีการทำงานที่ต่อเนื่อง คาดว่า จะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม 2566

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานงบประมาณปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยชีลอง บ้านหนองค้ำ ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 3,000,000 บาท หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานชัยภูมิ

วัตถุประสงค์โครงการ

- (1) พัฒนาด้านแหล่งน้ำในเขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
- (2) สนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎรได้เพิ่มขึ้น
- (3) ป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูน้ำหลาก และกักเก็บน้ำได้มากขึ้น

ที่มาของโครงการ ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ เพื่อเป็นแหล่งต้นทุนการทำเกษตร อุปโภค บริโภค โดยลำชีลอง แดงสาขาจากกลุ่มน้ำชี ช่วงฤดูน้ำหลาก หากมีการพัฒนาแหล่งน้ำ จะช่วยระบายน้ำจากลำชีและลำปะทาว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้รับ สามารถสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำ และมีพื้นที่การเกษตร 3000 ไร่ ราษฎร 25 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการ สนับสนุนพื้นที่ การปลูกข้าวและอ้อย

ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข เนื่องจากพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จึงได้รับการตีความว่าเป็นพื้นที่ป่า ทำให้ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าจากสำนักจัดการป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดชัยภูมิได้มีการเร่งรัดติดตามการขออนุญาตจนแล้วเสร็จ และได้รับอนุญาตมาดำเนินการ



2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว รายการ ปรับปรุงผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.3002 แยกทล.201 – บ้านเขว้า ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 9.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร งบประมาณ 17,500,000 บาท ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ

วัตถุประสงค์โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ที่มาของโครงการ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้านใหม่ บ้านเขว้า ฟ้าใหม่บ้านเขว้าได้รับรางวัลชนะเลิศของประเทศด้วยลวดลาย“หมี่ซันซอนารี” อันเป็นสุดยอดลวดลายวิจิตรงดงามแห่งเดียวในโลก จึงพัฒนาหมู่บ้านใหม่บ้านเขว้าให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2559 ร่วมกับหมู่บ้านใหม่ทั้ง 4 จังหวัด โดยมีการปรับปรุงศูนย์ การเรียนรู้เรื่องใหม่ และได้รับการพัฒนาในเรื่องของป้ายบอกทางของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ และมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ปรับปรุงเส้นทางให้มีความสะดวกมากขึ้น และปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดให้สามารถใช้ได้ปกติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา
ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข -



3. **โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร** รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยส้มป่อย บ้านหลักศิลา ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 3,000,000 บาท หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานชัยภูมิ

วัตถุประสงค์โครงการ

- (1) พัฒนาด้านแหล่งน้ำในเขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
- (2) สนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎรได้เพิ่มขึ้น
- (3) ป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูน้ำหลาก และกักเก็บน้ำได้มากขึ้น

ที่มาของโครงการ ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ เพื่อเป็นแหล่งต้นทุนการทำเกษตร อุดบดินบริเวณ สามารถรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย ซึ่งบรรจุน้ำ 7.6 ล้านลูกบาศก์เมตร มีฝายชะลอน้ำ 12 ตัว ถึงเข้าชลประทานกระจายน้ำไปยังพื้นที่เกษตร มีพื้นที่ทำนาโดยรอบที่จะได้รับผลประโยชน์จำนวน 5,000 ไร่ เส้นทาง ที่น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อยจะเข้าท่อ มีระยะทาง 17 กิโลเมตร มีผู้ใช้น้ำไปก่อน 2 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงทำให้สูญเสียการเก็บกักน้ำไป 50% เกษตรกรที่อยู่ปลายน้ำจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ราษฎรจึงได้มีการขอให้มีการขอให้มีน้ำ ใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งจะจัดขึ้น ปีละ 2 ครั้ง โครงการชลประทานชัยภูมิ จึงได้ปรับขนาดปากท่อเดิม 80 เซนติเมตร ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 4 เท่าจากขนาดปากท่อเดิม และออกแบบคลองส่งน้ำแบบหมุนเวียนเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถทำประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านหลักศิลา ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และพื้นที่ข้างเคียง จำนวน 300 ครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 5,000 ไร่ สนับสนุนพื้นที่ การปลูกข้าว อ้อยและมันสำปะหลัง





จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ออกติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 3 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 53,762,928 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2566 จำนวน 5,088,599 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.68 ดังนี้

หน่วย : บาท

หมวด	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	เหลือจ่าย
งบดำเนินงาน	1,930,653	1,060,263	54.92	870,390	-
งบลงทุน	51,332,275	3,730,734.05	7.32	47,268,987.95	332,553
- ครุภัณฑ์	1,178,275	877,500	100	-	300,775
- สิ่งก่อสร้าง	50,154,000	2,853,234.05	5.69	47,268,987.95	31,778
รายจ่ายอื่น	500,000	297,602	59.52	202,398	-
รวมทั้งสิ้น	53,762,928	5,088,599.05	9.68	48,341,775.95	332,553

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกเป็นรายโครงการ จำนวน 4 โครงการ 5 กิจกรรม 1 งบบริหาร ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	30,000,000	2,853,234	9.51	27,146,766
	กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์ (1 รายการ)	30,000,000	2,853,234	9.51	27,146,766
2	โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์	2,273,165	1,102,000	55.87	870,390
	2.1 กิจกรรม การยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วยการเกษตรแม่นยำ	2,273,165	1,102,000	55.87	870,390

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
	(1) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่ธุรกิจชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ	12,500	0	-	12,500
	(2) ถ่ายทอดความรู้การจัดการดินปุ๋ยชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ 2 ครั้ง	2,260,665	1,102,000	56.23	857,890
3	โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตปุ๋ยชีวภาพอินทรีย์ครบวงจร	835,763	835,763	100	-
	3.1 กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตแพะ - แกะ	400,000	400,000	100	-
	3.2 กิจกรรม สร้างผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าปุ๋ยชีวภาพ	435,763	435,763	100	-
4	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	20,154,000	0	-	-
	กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว (1 รายการ)	20,154,000	0	-	-
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	500,000	297,602	59.52	202,398
	รวมทั้งสิ้น	53,762,928	5,088,599.05	9.68	48,341,775.95



โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์

กิจกรรมย่อย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาล้อม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ความยาว 4,510.00 เมตร ดำเนินการโดย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบประมาณ 30,000,000 บาท เป็นงานดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,853,234.05 บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566

โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

กิจกรรม การยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วยการเกษตรแม่นยำ แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย หน่วยดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่ธุรกิจชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ 12,500 บาท งบประมาณงวด 3 จัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ

กิจกรรมย่อยที่ 2 ถ่ายทอดความรู้การจัดการดินปุ๋ยชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ 2 ครั้ง งบประมาณ 2,260,665 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน อบรมถ่ายทอดความรู้ จำนวน 1,082,390 บาท และงบลงทุน เป็นครุภัณฑ์ เครื่องผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 235,655 บาท รวม 1,178,275 บาท งบดำเนินงานเบิกจ่ายไป 224,500 บาท คงเหลือการจัดซื้อวัสดุแม่ปุ๋ยเคมี 3 สูตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ สำหรับบุคคลวิฑูรย์ จัดซื้อและส่งมอบเครื่องให้ศูนย์จัดการปุ๋ยชุมชนเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายไปจำนวน 877,500 บาท

โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตสุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร

กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตแพะ – แกะ งบประมาณ 400,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรม สร้างผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ งบประมาณ 435,763 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2117 - บ้านละหานทราย (เข้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง) ตำบลยายแยมพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 15.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 20,154,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 20,122,222 บาท คาดว่าจะปูผิวจราจรแล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 และจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน 10 กรกฎาคม 2566

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานงบประมาณปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รายการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาล้อม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ความยาว 4,510 เมตร ดำเนินการโดย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบประมาณ 30,000,000 บาท หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้ผลผลิตด้านการเกษตรและรายได้ของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นพร้อมเก็บกักน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ ต่อการอุปโภค-บริโภค กว่า 450 ครัวเรือน

ที่มาของโครงการ นายอำเภอปราสาท นายกเทศมนตรีตำบลปราสาท ผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่และหารือ นำเสนอร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่กลุ่มจังหวัดมีลำน้ำหลักที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำมูลและแม่น้ำชี ซึ่งมีน้ำต้นทุนและอัตราการไหลทั้งปี พื้นที่การเกษตรที่เป็นพื้นที่เป้าหมายไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ เนื่องจากพื้นที่รับประโยชน์อยู่สูงกว่าระดับน้ำในลำน้ำ ไม่มีระบบสูบน้ำส่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ที่เพียงพอ หรือมีระบบกระจายน้ำแต่ยังไม่สมบูรณ์ จึงต้องทำการพัฒนาระบบสูบน้ำส่งน้ำด้วยไฟฟ้าและกระจายน้ำ ด้วยระบบท่อในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำต้นทุนให้เพียงพอต่อความต้องการของพืช ขนาดพื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ การก่อสร้างจะมี 1. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดทุ่นลอย 2. ระบบส่งน้ำแบบท่อส่งน้ำ โดยจะนำน้ำที่ไหลทั้งนี้ส่งน้ำไปสู่หนองกโตวา มีพื้นที่ 1,300 ไร่ กักเก็บน้ำได้ 6.5 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการบูรณาการงบประมาณจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 15 ล้านบาท เป็นการขุดลอกด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถทำประโยชน์ให้กับราษฎร จำนวน 450 ครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่

ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข เนื่องจากเข้าสู่ฤดูการทำนาแล้ว ทำให้การก่อสร้างระบบส่งน้ำ ซึ่งเป็นการวางท่อส่งน้ำในพื้นที่นา อาจจะทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหาย แต่ยังเป็นช่วงต้นของการเพาะปลูก ยังไม่มีผลผลิต จึงจะมีการประชุมชี้แจงระหว่างหน่วยดำเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการขุดฝังท่อส่งน้ำ



2. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรม การยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วยการเกษตรแม่นยำ ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์โครงการ

- (1) ให้องค์ความรู้ด้านดินปุ๋ย การวิเคราะห์ค่าดิน ให้แก่เกษตรกร
- (2) ให้เกิดการบริหารจัดการศูนย์จัดการดินปุ๋ย

ที่มาของโครงการ ณ ที่ทำการกลุ่มปลูกผักบ้านจวน หมู่ 7 ต.บ้านจวน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ข้อเสนอจากคณะทำงานติดตามฯ ได้เสนอแนะให้กลุ่มปลูกผักบ้านจวน ได้ใช้ประโยชน์และดูแลบำรุงรักษาเครื่องผสมปุ๋ย ให้เป็นอย่างดี ซึ่งทางกลุ่มปลูกผักบ้านจวน เป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยบ้านจวน ที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เอง มีสมาชิกที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยจำนวน 25 คน จึงเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้การสนับสนุน รับโอนสินทรัพย์เป็นผู้ดูแล จึงสร้างความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่จัดสรรให้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดการบริหารจัดการศูนย์จัดการดินปุ๋ยให้มีกองทุนหมุนเวียน และเกษตรกรปรับพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยให้เป็นไปตามค่าของดิน

ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข -





จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ออกติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีไตรมาส 3 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมข้าวสารหอม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 79,911,246 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566 จำนวน 27,184,485.35 บาท คิดเป็น ร้อยละ 41.03 ดังนี้

หน่วย : บาท

หมวด	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	เหลือจ่าย
งบดำเนินงาน	1,204,281	1,068,047	88.69	136,234	-
งบลงทุน	78,206,965	25,967,064.35	39.89	39,328,801.35	12,911,099.30
- ครุภัณฑ์	706,965	-	-	706,965	-
- สิ่งก่อสร้าง	77,500,000	25,967,064.35	40.33	38,621,836.35	12,911,099.30
รายจ่ายอื่น	500,000	149,374	29.87	350,626	-
รวมทั้งสิ้น	79,911,246	27,184,485.35	41.03	39,815,661.35	12,911,099.30

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ จำแนกเป็นรายโครงการ จำนวน 4 โครงการ 5 กิจกรรม 1 งบบริหาร ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	37,500,000	5,975,064.35	24.47	18,642,836.35
	กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์ (3 รายการ)	37,500,000	5,975,064.35	24.47	18,642,836.35
2	โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์	1,365,659	548,960	40.20	816,699.00
	2.1 กิจกรรม การยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วยการเกษตรแม่นยำ	1,365,659	548,960	40.20	816,699.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
	(1) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่ธุรกิจชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ	9,260	9,260	100	-
	(2) ถ่ายทอดความรู้การจัดการดินปุ๋ยชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ 2 ครั้ง	1,356,399	539,700	39.79	816,699.00
3	โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีนครหลวงจร	545,587	519,087	95.14	26,500.00
	3.1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตแพะ - แกะ	400,000	373,500	93.38	26,500.00
	3.2 กิจกรรมสร้างผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์	145,587	145,587	100	-
4	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกาด้านการท่องเที่ยว	40,000,000	19,992,000	50.02	19,979,000
	กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกาด้านการท่องเที่ยว (2 รายการ)	40,000,000	19,992,000	50.02	19,979,000
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	500,000	149,374	29.87	350,626
	รวมทั้งสิ้น	79,911,246	27,184,485.35	41.03	39,815,661.35





โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์ ดำเนินการโดยโครงการชลประทานสุรินทร์

กิจกรรมย่อยที่ 1 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตำบลเจเนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 400,000 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 20,000,000 บาท ก่อหนึ่งงานจ้างเหมาแล้ว จำนวน 12,748,689 บาท เป็นงานดำเนินการเอง 223,102.06 บาท เบิกจ่ายไป 5,888,574.55 บาท รวมสัญญาเวลา 240 วัน (28 ม.ค. 66 – 24 ก.ย. 66) ขณะนี้มีผลงาน 90%

กิจกรรมย่อยที่ 2 แก้มลิงบ้านตาวรร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 120,000 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 7,500,000 บาท ก่อหนึ่งงานจ้างเหมาแล้ว จำนวน 7,250,000 บาท เป็นงานดำเนินการเอง 126,875 บาท เบิกจ่ายไป 57,494.25 บาท มีสัญญารวมเวลา 180 วัน (25 ก.พ. 66 – 23 ส.ค. 66) ขณะนี้มีผลงาน 64.71 %

กิจกรรมย่อยที่ 3 ขุดลอกห้วยระวี พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 83,000 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง 7,674,900 บาท ก่อหนึ่งผู้กฟันทงานจ้างเหมา 4,195,808 บาท งานดำเนินการเอง 73,426.64 บาท เบิกจ่ายแล้ว 28,995.55 บาท มีสัญญารวมเวลา 180 วัน (25 เม.ย. 66 – 21 ต.ค. 66) ขณะนี้มีผลงาน 23.15 %

โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

กิจกรรม การยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนรุดูกิจกรรมชุมชนด้วยการเกษตรแม่นยำ แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย หน่วยดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนรุดูกิจกรรมชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ 9,260 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว

กิจกรรมย่อยที่ 2 ถ่ายทอดความรู้การจัดการดินปุ๋ยชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ 2 ครั้ง งบประมาณ 1,356,399 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน อบรมถ่ายทอดความรู้ จำนวน 649,434 บาท และงบลงทุน เป็นครุภัณฑ์ เครื่องผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 235,655 บาท รวม 706,965 บาท งบดำเนินงานเบิกจ่ายไป 539,700 บาท คงเหลือการจัดงานรณรงค์ในวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2566 สำหรับงบครุภัณฑ์ จะลงนามในสัญญาวันที่ 28 มิถุนายน 2566

โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร

กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตแพะ – แกะ งบประมาณ 400,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 373,500 บาท คงเหลืองานติดตาม หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรม สร้างผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ งบประมาณ 145,587 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

รายการย่อยที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2328 - บ้านนาสนวน ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร งบประมาณ 20,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 19,979,000 บาท เริ่มสัญญา 4 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 1 กรกฎาคม 2566 โดยมีการต่อสัญญาเป็นวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 โดยงานขยายลงหินคลุก งานสะพานเทคานรับพื้น งาน Box พื้นแล้วเสร็จ คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2566

รายการย่อยที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2081 - บ้านไพรขลา ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.00

เมตร ความหนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร งบประมาณ 20,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 19,992,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานงบประมาณปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รายการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตำบลเจียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 400,000 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 20,000,000 บาท หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานสุรินทร์

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ



ที่มาของโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เป็นอ่างเก็บน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงชาวอำเภอเมืองสุรินทร์ และยังเป็นจุดเข้คอินทองที่สวยงามอีกแห่งของจังหวัดสุรินทร์ เป็นอ่างเก็บน้ำลักษณะเขื่อนดิน อยู่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 7 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2521 ปิดกั้นห้วยเสนงและลำน้ำอำปูลที่บ้านโคกจ๊ะ-บ้านถนน-บ้านเจียง ที่รับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำอำปูลเป็นอ่างแผ่ทางด้านเหนือเขื่อน มีร่องน้ำและคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรกระจายทั่วพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ ไหลลงลำห้วยชีทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองสุรินทร์ สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการขุดลอกเพื่อให้พื้นที่รองรับน้ำให้มากขึ้น บรรเทาภัยแล้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- (1) เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- (2) จำนวนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากไม่น้อย 110 ครัวเรือน
- (3) พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 600 ไร่

ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข -



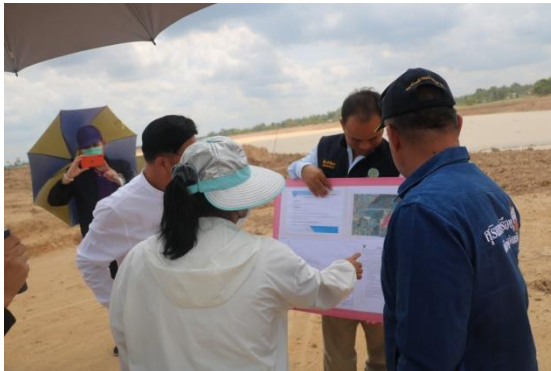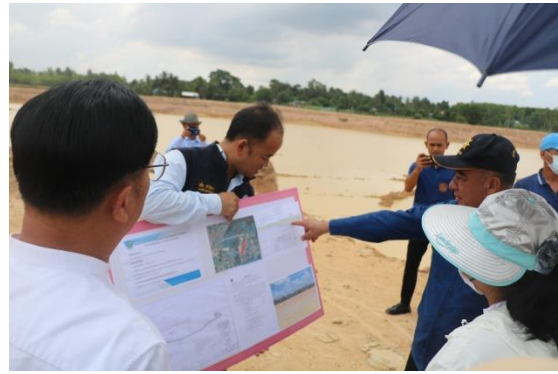

2. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร กิจกรรม ยกระดับมาตรฐาน

การผลิตแพะ - แกะ ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์โครงการ

(1) เพื่อพัฒนาเกษตรกรเพิ่มองค์ความรู้สมัยใหม่ควบคู่กับภูมิปัญญาของเกษตรกรสู่เกษตรกร Smart

Farmer

(2) ยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

(3) เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ เพิ่มผลผลิต และลดการสูญเสียของเกษตรกร

ข้อมูลของพื้นที่ติดตาม

ณ ฟาร์มแพะ บ้านเมืองที่ ตำบลเมืองที่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มวิสาหกิจแพะเมืองที่ เริ่มตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2565 มีสมาชิกจำนวน 15 คน ฟาร์มแพะ 11 ฟาร์ม ฟาร์มแม่พันธุ์ 1 ฟาร์ม ได้ผ่านมาตรฐานจำนวน 8 ฟาร์ม ทางเทศบาลตำบลเมืองที่ให้การสนับสนุน โดยรองนายกเทศมนตรีเมืองที่ เป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เสนอหลักสูตรสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ / ปศุสัตว์อาสา เข้ามาช่วยเกษตรกร โดยมีการสร้างแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีชีวภาพ และการสร้างเครือข่ายเกษตรกร ผลิตพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์แพะ และมีปศุสัตว์อำเภอมาให้คำแนะนำในการเลี้ยงแพะแก่ผู้ที่สนใจ และเข้าร่วมโครงการของกลุ่มจังหวัดฯ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ การเลี้ยงให้มีมาตรฐาน ซึ่งเกษตรกรสามารถจำหน่ายแพะ ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงแพะ มีอายุ 5-7 เดือน ก็สามารถส่งออกได้ แต่แพะมีชีวิตราคาค่อนข้างต่ำกว่าแพะที่ฆ่าแหละเนื้อแล้ว ซึ่งมีราคา กิโลกรัมละ 550 บาท ดังนั้น ทางกลุ่มวิสาหกิจแพะเมืองที่ได้มีการออกบูท เพื่อทดลองให้ชิมเนื้อแพะ มีผู้สนใจ โดยเฉพาะร้านอาหาร แต่เนื่องจากเป็นการซื้อเอง ไม่มีโรงเชือดที่เป็นมาตรฐาน จึงทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารไม่มีความเชื่อมั่นในความสะดวก รวมทั้งประชาชนในภูมิภาคนี้ไม่นิยมเนื้อแพะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรได้รับความรู้ และมีมาตรฐานฟาร์มแพะ

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย

ได้เสนอขอรับการสนับสนุนโรงเชือด เนื่องจาก เกษตรกรดำเนินการเชือดเอง ร้านค้าที่จะรับเนื้อไม่มีความเชื่อมั่นในด้านของความสะดวก สุขลักษณะ การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศเพื่อนบ้านรับเฉพาะแต่แพะมีชีวิต ที่ราคาต่อตัวมีราคาต่ำกว่าการชำแหละและจำหน่ายเป็นกิโลกรัม ซึ่งแพะที่รับจะเป็นแพะอายุระหว่าง 5 – 7 เดือน ราคาประมาณ 90 บาท/ตัว แต่ถ้าขายเป็นเนื้อชำแหละแล้วจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 550 บาท/กิโลกรัม

ข้อเสนอจากคณะทำงานติดตามฯ

ได้ให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรว่า โครงการที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งทราบว่าอยู่ในระยะเริ่มต้นนั้น ให้ดำเนินการให้ดีและต่อเนื่อง สำหรับการสนับสนุนโรงเชือด มีข้อบัญญัติ ข้อระเบียบด้านการก่อตั้งโรงฆ่าสัตว์ จึงต้องค่อยเป็นค่อยไป และต้องพิจารณาถึงการผลิตและความต้องการของตลาดด้วย

ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข -



สรุปปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างของจังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำที่อยู่ในที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ ถูกตีความตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการขออนุญาตแผ้วถางตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 คำว่า ป่า หมายถึง ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ซึ่งรวมไปถึงที่ดินรกร้าง ที่ชายตลิ่ง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และพื้นที่ชายทะเลที่เป็นของรัฐด้วย ดังนั้นจึงต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า จำนวน 7 รายการ จากทั้งหมด 8 รายการ ขณะนี้เหลือขออนุญาต จำนวน 2 รายการ เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าสงวน จะต้องเสนอขออนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากกรมฯ

2. ครุภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องผสมปุ๋ยตามการวิเคราะห์ค่าดิน เป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ทำให้มีผู้รับจ้างน้อยราย โดยทั้งประเทศมีเพียง 2 บริษัท บางจังหวัดที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มีผู้มายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ทำให้ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เกิดความล่าช้า ขณะนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ได้ ผู้รับจ้างและก่อนนี้ผูกพันแล้ว จังหวัดชัยภูมิคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างกลางเดือนกรกฎาคม 2566 สำหรับจังหวัดนครราชสีมา มีผู้อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จึงเสนอเรื่องไปยังกรมบัญชีกลาง

3. ข้อเสนอให้หน่วยงานที่คาดว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หากไม่สามารถเร่งรัดดำเนินการได้ทัน ให้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี และผลการดำเนินงานให้มีการจัดเก็บตัวชี้วัดตามโครงการด้วย

-----๙๐๘-----

ภาคผนวก



คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ที่ ๑๘/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
และปีงบประมาณก่อนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ



ตามคำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจากกำลังจะเข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๙๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทำให้ตำแหน่งหัวหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดหน้าที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จึงยกเลิกคำสั่งข้างต้นและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีงบประมาณก่อนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ๑.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ผู้ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | |
| ๑.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่ได้รับมอบหมาย | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ติดตามในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ | |
| ๑.๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับมอบหมาย | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ติดตามในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ | |
| ๑.๔ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับมอบหมาย | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ติดตามในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ | |
| ๑.๕ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด | คณะทำงาน |
| ๑.๖ นางสุดาใจ โล่ห์วนิชชัย | คณะทำงาน |
| ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัดฯ | |
| ๑.๗ นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ | คณะทำงาน |
| ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัดฯ | |

- | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ๑.๘ | คลังจังหวัดนครราชสีมา | คณะทำงาน |
| ๑.๙ | นายสมภาร เสี่ยงบุญ ภาคประชาสังคม จังหวัดชัยภูมิ | คณะทำงาน |
| ๑.๑๐ | คลังจังหวัดบุรีรัมย์ | คณะทำงาน |
| ๑.๑๑ | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุรินทร์ | คณะทำงาน |
| ๑.๑๒ | ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๑.๑๓ | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๑๔ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๑๕ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. อำนาจหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ ติดตาม ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีงบประมาณก่อนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ วิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

๒.๓ รายงานผลการติดตามและประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ต่อ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย

๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัดมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสยาม ศิริมงคล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

คณะผู้จัดทำ

นางกรรณา ลีออกุลย์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นางสาวอรุณี ชาญหัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวโชติรส มีอำนาจ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวทองคำ รักวงษ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณัฐวรรณ ดีเจริญ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
โทร/โทรสาร 044 - 243- 090



นเรศวรบุรีนทร์

