



# 4

# ผลการ

# ติดตาม

## ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

**กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1**

โทร/โทรสาร 0 4424 3090  
ส.ป.มท. 36601

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถนน  
มหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด  
นครราชสีมา 30000

เว็บไซต์ : <http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/>  
E-mail : [osm\\_ne1@moi.go.th](mailto:osm_ne1@moi.go.th)

## เนื้อหา

ความเป็นมา	3
ผลการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (ผลการท่อนี้,ผลการเบิกจ่าย)	4
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560	6
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	8
ผลการดำเนินงานจังหวัดนครราชสีมา	10
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560	11
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	13
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	14
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	18
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	20
- การติดตามในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา	23
ผลการดำเนินงานจังหวัดชัยภูมิ	29
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560	30
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	31
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	32
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	34
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	35
- การติดตามในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ	37
ผลการดำเนินงานจังหวัดบุรีรัมย์	40
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560	41
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	42
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	43
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	46
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	47
- การติดตามในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์	49
ผลการดำเนินงานจังหวัดสุรินทร์	60
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560	61
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	62
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	63
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	66
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	67
- การติดตามในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์	69
คณะผู้ติดตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	75

“แนวทางการออกติดตาม”  
 เกร็ดการจัจัดซื้อจัดจ้าง  
 งบลงทุน ผลการดำเนินงาน  
 ผลการเบิกจ่าย รับทราบ  
 ปัญหาและอุปสรรค และ  
 หาแนวทางแก้ไข รับฟัง  
 ข้อเสนอแนะ เกร็ดการ  
 ดำเนินงาน และการ  
 เบิกจ่าย งบประมาณทั้งใน  
 รูปแบบเอกสารและใน  
 ระบบ padme พร้อมลง  
 พื้นที่ที่ประสบปัญหาการ  
 ดำเนินงาน และอื่น ๆ

## ความเป็นมา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้กำหนดให้จังหวัดภายในกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ หรือที่เรียกกันภายในกลุ่มว่า “กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์” รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ยังไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) เป็นประจำทุกวันที 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน จนกว่าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณจะแล้วเสร็จ

เพื่อเป็นการกระตุ้นการเร่งรัดการดำเนินงาน การก่อกำหนด และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ฯ ให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ จึงกำหนดการติดตามการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา และระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ ตามลำดับ

## เป้าหมายการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภท	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รายจ่ายประจำ	33	55	77	98
รายจ่ายลงทุน	22	43	65	88
ภาพรวม	30	52	74	96

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในไตรมาสที่ 4 ภาพรวม ร้อยละ 96 ในรายจ่ายประจำร้อยละ 98 และรายจ่ายลงทุนไว้ ร้อยละ 88

## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาตรา 60 งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด โดยตั้งงบประมาณให้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณ จำนวน 389,503,400 บาท ดังนี้

	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น
จังหวัดนครราชสีมา	113,155,200	67,683,210	35,632,390	9,839,600
จังหวัดชัยภูมิ	95,691,700	74,465,800	19,725,900	1,500,000
จังหวัดบุรีรัมย์	116,771,800	101,312,800	14,959,000	500,000
จังหวัดสุรินทร์	60,884,700	47,010,400	13,374,300	500,000
งบบริหาร ฯ	3,000,000	-	-	3,000,000
รวมทั้งสิ้น	389,503,400	290,472,210	83,691,590	15,339,600

หมายเหตุ : งบบริหารงาน (รายจ่ายอื่น) จังหวัดละ 500,000 บาท

## ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำงวด วันที่ 1 กันยายน 2561 กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 389,503,400 บาท และผลการ เบิกจ่ายในภาพรวม 219,568,221.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.52 ซึ่งต่ำกว่า เป้าหมาย ร้อยละ 39.48 จำแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัด	งบจัดสรร	ไม่ขอรับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เหลือจ่าย	ยังไม่เบิกจ่าย
นครราชสีมา	113,155,200	100	57,522,321.28	50.90	151,546	55,481,232.72
ชัยภูมิ	95,691,700	-	65,383,992.52	68.71	526,000	29,781,707.48
บุรีรัมย์	116,771,800	21,900	74,222,125.65	63.64	118,528	42,409,246.35
สุรินทร์	60,884,700	200	20,209,161.33	33.29	182,545.51	40,492,793.16
กลุ่มจังหวัดฯ	3,000,000	-	2,230,620.95	74.35	-	769,379.05
รวมทั้งสิ้น	389,503,400	22,200	219,568,221.73	56.52	978,619.51	168,934,358.76



# หน้า 05

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำงวดวันที่ 1 กันยายน 2561 กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 389,503,400 บาท จำนวน 3 โครงการ 11 กิจกรรม มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 219,568,221.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.52 จำแนกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	300,537,268	169,858,720.40	56.66	129,910,160.63
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	145,537,268	84,435,403.69	58.23	60,575,848.34
	1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	103,917,622	54,586,000	52.58	49,221,551
	1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	21,836,960	12,987,739.83	59.75	8,747,720.17
	1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	17,060,840	10,515,055.54	61.63	6,544,984.46
	1.5 ส่งเสริมและพัฒนากาเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	12,184,578	7,334,521.34	60.34	4,820,056.66
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	62,891,832	26,634,421.94	42.36	36,220,760
	2.1 ยกกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	20,062,942	15,900,571.94	79.26	4,137,760
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	9,970,000	2,969,960	29.79	7,000,000
	2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นัก ท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	18,385,890	4,802,890	26.12	8,583,000
	2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	14,473,000	2,961,000	20.48	16,500,000
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	20,074,300	19,644,865.44	94.09	1,233,652
	3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่ นครชัยบุรีรินทร์	9,056,900	7,937,902	89.42	939,252
	3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรีรินทร์	12,017,400	11,706,963	97.55	294,400
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	5,000,000	3,430,213.95	68.60	1,569,786
	รวมทั้งสิ้น	389,503,400	219,568,221.73	56.52	168,934,358.76

## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรจำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 350,273,100 บาท สำนักงบประมาณปรับลดงบประมาณจำนวน 1,274,000 บาท คงเหลืองบประมาณได้รับจัดสรร จำนวน 348,999,100 บาท ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 305,493,079.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.47 จำแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัด	วงเงินจัดสรร	งบฯ พับไป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
นครราชสีมา	69,925,500.00	20,547,236.00	64,052,642.00	100.00	-
ชัยภูมิ	89,067,500.00	3,273,177.25	78,072,248.92	97.96	1,625,955.83
บุรีรัมย์	92,215,300.00	1,434,233.36	90,390,566.64	100.00	-
สุรินทร์	94,790,800.00	15,612,097.53	70,981,942.47	100.00	-
กลุ่มจังหวัด	3,000,000.00	1,004,320.46	1,995,679.54	100.00	-
รวม	348,999,100.00	41,880,064.60	305,493,079.57	99.47	1,625,955.83

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14 โครงการ จำแนกเป็นรายโครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพับไป
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	25,525,628	24,766,260	100	-	759,368
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	8,295,200	8,257,162	100	-	38,038
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	6,709,104	6,709,104	100	-	-
4	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	78,149,002	73,748,629.72	99.53	1,625,955.83	2,774,416.45
5	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์	17,945,000	5,424,540	100	-	12,520,460
6	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม	5,011,400	4,172,380	100	-	839,020
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่สู่สากล	6,631,800	6,079,370	100	-	552,430

# หน้า 07

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณทั่วไป
8	โครงการเสริมศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กลาง การซื้อขายผ้าไหมแห่งอาเซียน	1,260,000	1,258,000	100	-	2,000
9	โครงการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์	-	-	-	-	-
10	โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ	3,826,223	3,318,997	100	-	507,226
11	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนของภาครัฐและเอกชน	2,000,000	1,739,300	100	-	260,700
12	โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศ เพื่อนบ้าน	3,883,373	3,809,900	100	-	73,473
13	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม เพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่อุภูมิภาคและ อาเซียน	103,230,110	101,921,137.31	100	-	1,308,972.69
14	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ขนส่งทางบกสนับสนุนระบบรางและเชื่อมต่อระบบ โลจิสติกส์	81,532,260	60,406,575	100	-	21,125,685
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ	5,000,000	3,881,724.54	100	-	1,118,275.46
	รวมทั้งสิ้น	348,999,100	305,493,079.57	99.47	1,625,955.83	41,880,064.60


จังหวัดชัยภูมิ ยังคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  
งบประมาณ 1,625,955.83 บาท จำนวน 3 รายการ ดังนี้

- รายการ ปรับปรุงการกักเก็บน้ำแก้มลิงกุดไข่นุ่นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองไผ่  
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ยังไม่เบิกจ่าย 650,252.83 บาท
- รายการ ปรับปรุงกักเก็บน้ำแก้มลิงหนองสำโรงพร้อมอาคารประกอบ บ้านไร่ ตำบลลุ่ม  
ลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ยังไม่เบิกจ่าย 437,400 บาท
- รายการ ปรับปรุงฝายหินทิ้งบ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัด  
ชัยภูมิ ยังไม่เบิกจ่าย 538,303 บาท

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ประจำงวดวันที่ 1 กันยายน 2561 กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรจำนวน 6 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,826,670,500 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 2,714,781,585.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.85 ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 685,173,395.57 บาท เป็นรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัด	งบจัดสรรหลังปรับลด	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพบไป
นครราชสีมา	1,359,016,300	998,589,682.61	87.42	143,639,000.26	216,787,617.13
ชัยภูมิ	756,559,800	629,877,964.38	88.92	78,470,327.80	48,211,507.82
บุรีรัมย์	831,693,400	610,505,960.54	81.50	138,612,260.18	82,575,179.28
สุรินทร์	879,401,000	475,807,978.15	59.46	324,451,807.33	79,141,214.52
รวมทั้งสิ้น	3,826,670,500	2,714,781,585.68	79.85	685,173,395.57	426,715,518.75

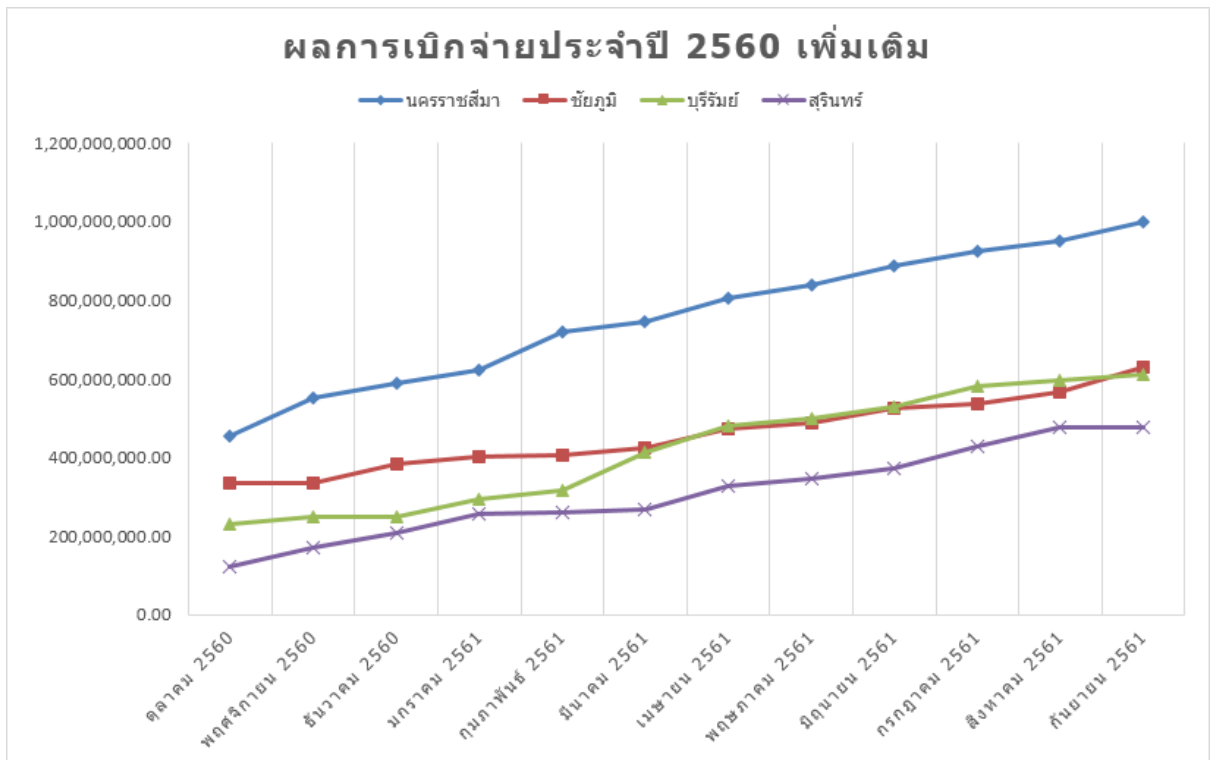

ผลการดำเนินการโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทยแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน และโครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย 1 โครงการคือ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำซุง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (เหลือจ่ายน้ำท่วม งบประมาณ 2,963,300 บาท) โครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ส่วนใหญ่ดำเนินงานไปแล้วกว่าร้อยละ 80 เนื่องจากเป็นรายการ

# หน้า 09

ที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงใช้เงินเหลือจ่ายและเงินยกเล็ก นอกจากนี้โครงการด้านชลประทานมีลักษณะเป็นงานดำเนินการเอง หลายรายการจึงทำให้ล่าช้า ประกอบกับสภาพของภูมิอากาศฝนตกน้ำท่วมขัง บางแห่งต้องรอให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกหรือใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำก่อนจึงจะสามารถดำเนินการ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) จำนวน 6 โครงการ จำแนกเป็นรายโครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณทั่วไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์	2,841,070,800	1,894,192,155.47	77.95	535,711,893.06	342,055,451.47
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	114,686,100	107,007,371.20	99.44	601,092.30	1,478,736.50
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	38,937,500	23,725,214.41	100	-	4,247,285.59
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	631,676,100	599,741,200.30	85.95	97,997,854.51	59,819,214.19
5	โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	200,300,000	87,152,344.30	63.15	50,862,555.70	19,114,831
6	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำชู บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแม่็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (เหลือจ่ายน้ำท่วม งบประมาณ 2,963,300 บาท)	(เงินเหลือจ่าย)	2,963,300	100	-	-
	รวมทั้งสิ้น	3,826,670,500	2,714,781,585.68	79.85	685,173,395.57	426,715,518.75

### จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ออกติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 4 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 จังหวัดนครราชสีมา



## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา มีโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน 84,599,878 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500,000 บาท) ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 64,052,642 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.71 งบประมาณพบไป 20,547,236 บาท ร้อยละ 24.29 ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ยกเลิกดำเนินการ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 12,000,000 บาท เนื่องจากได้รับการทักท้วงกรณีหน่วยดำเนินการไม่มีภารกิจตรงตามอำนาจหน้าที่ และได้นำงบประมาณ ที่ยกเลิกไปดำเนินการในกิจกรรมอื่นแล้ว

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพบไป
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิ คุณภาพดีสู่สากล	1,660,000	1,558,448	100	-	101,552
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตมันสำปะหลัง	150,000	125,152	100	-	24,848
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	1,352,000	1,352,000	100	-	-
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่สู่สากล	1,843,500	1,777,740	100	-	65,760
5	โครงการเสริมศักยภาพ การดำเนินงานศูนย์กลาง การซื้อขายผ้าไหมแห่งอาเซียน	1,260,000	1,258,000	100	-	2,000
6	โครงการแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัด นครชัยบุรีรินทร์	(12,000,000)	-	-	-	ยกเลิก
7	โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านการคมนาคม	20,552,198	20,547,802	100	-	4,396



# หน้า 12

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณที่ไป
	เพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน					
8	โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ทางบกสนับสนุนระบบรางและ เชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์	57,282,180 (341,160,000)	36,933,575	100	-	20,348,605
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน กลุ่มจังหวัด ฯ	500,000	499,925	100	-	75
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>84,599,878</b>	<b>64,052,624</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>20,547,236</b>





## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560) จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรร งบประมาณดำเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 1,359,016,300 บาท ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 เบิกจ่าย แล้วจำนวน 998,589,682.61 บาท ร้อยละ 87.42 แบ่งเป็น งบดำเนินงาน 248,453,200 บาท เบิกจ่าย 171,793,845.50 บาท งบรายจ่ายอื่น 5,500,000 บาท เบิกจ่าย 490,000 บาท งบอุดหนุน 98,255,000 บาท เบิกจ่าย 98,255,000 บาท งบลงทุน 1,006,808,100 บาท เบิกจ่าย 728,050,837.11 บาท และ ยังไม่ได้เบิกจ่าย 143,639,000.26 บาท งบประมาณทั่วไป 216,787,617.13 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณทั่วไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรีรินทร์	880,044,700	658,975,470.87	88.56	85,152,097.75	159,118,231.38
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	45,770,500	42,168,567.70	98.59	601,092.30	135,540
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	19,512,900	9,538,531.50	100	-	1,054,168.50
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มี คุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	213,388,200	200,754,768.24	96.62	7,023,254.51	37,364,846.25
5	โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรีรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	200,300,000	87,152,344.30	63.15	50,862,555.70	19,114,831
	รวมทั้งสิ้น	1,359,016,300	998,589,682.61	87.42	143,639,000.26	216,787,617.13

## จังหวัดนครราชสีมา

ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 4 โครงการ จำนวน 72 รายการ งบประมาณ 143,639,000.26 บาท เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 1,307,498 บาท งบลงทุน จำนวน 142,331,502.26 บาท ดังนี้

(1) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ จำนวน 61 รายการ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจำนวน 85,152,097.75 บาท

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร จำนวน 2 รายการ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจำนวน 601,092.30 บาท

(3) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล จำนวน 5 รายการ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจำนวน 7,023,254.51 บาท

(4) โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 4 รายการ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจำนวน 50,862,555.70 บาท

## โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 880,044,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย 658,975,470.87 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ มี 36 รายการหลัก งบประมาณ 391,382,300 บาท และรายการที่เป็นการขอใช้เงินยกเลิการดำเนินงาน เงินเหลือจากการจัดสรร และจากเงินเหลือจ่ายอีก 6 รายการ เป็นงานดำเนินการเอง และจ้างเหมา มีการยกเลิกค่าควบคุมงาน 2 รายการ เนื่องจากซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณ 516,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย 328,843,705.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.79 ยังคงเหลือที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 85,152,097.75 บาท จำนวน 13 รายการ และคาดว่าจะมีรายการที่ต้องกันเงิน 3 รายการ คือ

- ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 10,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,858,642.68 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 7,141,357 บาท ติดขัดเรื่องการใช้พื้นที่ป่าเนื่องจากหมดอายุสัญญาการขอใช้พื้นที่ป่า ทำให้งานหยุดชะงักไม่สามารถดำเนินการได้ ขณะนี้ปัญหาได้แก้ไขโดยกรมชลประทานได้ขอต่ออายุสัญญาการขอใช้พื้นที่ป่าต่อกรมป่าไม้

- ค่าควบคุมงานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 356,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 242,249.30 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 114,450 บาท

- แก้มลิงบึงบ้านเขว้า ระยะ 2 พร้อมอาคารประกอบและระบบเชื่อมโยงน้ำ ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 6,500,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4,865,928.52 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 1,634,071.48 บาท ลักษณะงาน - ท่อส่งน้ำ - บานเปิดปิดน้ำ - ประตูระบายน้ำ 1 ตัว

1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐ นครชัยบุรินทร์ มี กิจกรรมที่ดำเนินการ 4 รายการ งบประมาณ 218,264,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 105,407,783.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.22 ยังไม่เบิกจ่าย 14,080,860 บาท กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพรวบรวมและแปรรูปข้าวในสหกรณ์การเกษตรยังคงเหลืองาน (เงินเหลือจ่าย) ได้แก่ ลานตาก ฉากเก็บพีชผล

1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ มี 3 รายการ งบประมาณ 56,659,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 41,290,165 บาท ร้อยละ 89.30 ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน 4,950,000 บาท งานส่วนใหญ่แล้วเสร็จและมีการส่งเงินคืน ยังคงมีกิจกรรมเพิ่มศักยภาพแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่า งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ อาคารซังพร้อมเครื่องชั่งขนาดกลาง โรงเรือนสำหรับเก็บมันเส้น ติดปัญหาช่วงฤดูฝนทำให้ล่าช้าในการดำเนินงาน

1.4 กิจกรรมปฏิรูปภาคการเกษตร มี 2 กิจกรรม งบประมาณ 195,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 170,100,117 บาท ร้อยละ 99.71 ยังไม่เบิกจ่าย 486,700 บาท อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพื่อเบิกจ่าย

1.5 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม บูรณะสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทกภัย ตลอดจนป้องกันเหตุอุทกภัย เป็นกิจกรรมซ่อมแซมถนน และงานขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน 45 รายการ เป็นกิจกรรมการใช้จ่ายเงินเหลือจ่าย เงินยกเล็ก ก่อหนี้ผูกพัน 54,193,000 บาท เบิกจ่าย 13,333,700 บาท ร้อยละ 26.91 ยังไม่เบิกจ่าย 36,207,300 บาท มีที่ทำการปกครองอำเภอเป็นหน่วยดำเนินการ

## 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร งบประมาณ 45,770,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย 42,168,567.70 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 38,510,100 บาท ผลการเบิกจ่าย 35,011,440 บาท งบประมาณเหลือจ่ายพบไป 497,820 บาท

2.2 กิจกรรมปรับรูปแบบการเลี้ยงแพะ งบประมาณ 4,604,400 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,501,127.70 บาท งบประมาณเหลือจ่ายพบไป 103,272.30 บาท

2.3 กิจกรรมพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 200,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 200,000 บาท

2.4 กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 2,456,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 2,456,000 บาท

## 3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง  
งบประมาณ 19,512,900 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่

3.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง  
(400 ราย) งบประมาณ 250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 183,324.00 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 809,900  
บาท ผลการเบิกจ่าย 777,136.00 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่เป็นงาน  
ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5 รายการ ก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้ง  
พลังงานแสงอาทิตย์ 5 แห่ง เจาะบ่อบาดาล 5 แห่ง รวมทั้งหมด 15 รายการ งบประมาณ 4,913,000  
บาท ผลการเบิกจ่าย 4,804,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.4 กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME 3 กลุ่ม  
งบประมาณ 12,900,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,133,071.50 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการยกเลิก  
รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 12 รายการ งบประมาณ 5,307,100 บาท เนื่องจากมีข้อทักท้วงและ  
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ

3.5 กิจกรรมจัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640,000  
บาท ผลการเบิกจ่าย 640,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

## 4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานงบประมาณ  
213,388,200 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 7 กิจกรรม ได้แก่

4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นัก  
ท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 34,921,200 บาท ผลการ  
เบิกจ่าย 34,915,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นงานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณ  
แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญมีทั้งหมด 11 รายการ

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม งบประมาณ 107,000,000 บาท  
ผลการเบิกจ่าย 115,695,848.24 บาท ร้อยละ 94.28 เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 6  
สายทาง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีรายการเพิ่มเติมจากเงินยกเลิก เงินเหลือจ่ายอีก 18  
รายการ แล้วเสร็จ 12 รายการ และอยู่ระหว่างการตรวจรับและเบิกจ่ายอีก 5 รายการ

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน งบประมาณ 45,900,000 บาท ผลการ เบิกจ่าย 47,607,920 บาท ร้อยละ 100 เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต จำนวน 3 สายทาง และมีรายการเพิ่มเติมจากเงินยกเล็ก เงินเหลือจ่ายอีก 3 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.4 กิจกรรม Amazing Thai Host งบประมาณ 2,500,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 200,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.5 กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของภาครัฐ งบประมาณ 12,000,000 บาท ผลการ เบิกจ่าย 2,100,000 บาท เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 14 รายการ ยกเลิกไป 11 รายการ ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

4.6 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 8,097,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 236,000 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

4.7 กิจกรรมมหกรรมการบินและการแข่งขันการบินนานาชาติ 2017 งบประมาณ 2,970,000 บาท ยกเลิกดำเนินการ เนื่องจากดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ และได้นำ งบประมาณไปดำเนินการกิจกรรมอื่น

## 5. โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้าง ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 200,300,000 บาท เบิกจ่าย 87,165,214.30 ร้อยละ 63.16 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 ผู้รับผิดชอบ 2 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

1. ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ทั้งหมด 4 กลุ่ม จำนวน 40 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,659,900 บาท มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 188,900 บาท ครุภัณฑ์บางอย่างต้องรออาคารสิ่งก่อสร้างเสร็จจึงจะเข้าไปติดตั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ได้

ที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	ราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
1	ครุภัณฑ์การแพทย์กลุ่มที่ 1	12 รายการ	1,029,000	849,000
2	ครุภัณฑ์การแพทย์กลุ่มที่ 2	19 รายการ	1,408,900	1,405,900
3	ครุภัณฑ์การแพทย์กลุ่มที่ 3	7 รายการ	2,552,000	2,550,000
4	ครุภัณฑ์การแพทย์กลุ่มที่ 4	2 รายการ	1,858,000	1,855,000

2. กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยดำเนินการ งบประมาณ 129,500,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีรินทร์ โดยบริษัท ปราสาทสุข จำกัด เริ่ม 28 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาภายใน 17 พฤศจิกายน 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 เบิกจ่ายไปแล้ว 63 งวด จำนวน 92,008,200 บาท คงเหลือ 20 งวด ที่ยังไม่เบิก 37,491,800 บาท ผลงาน 94.65 % เร็วกว่าแผน 2.85 %

## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดนครราชสีมาได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 113,155,200 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 57,522,321.28 บาท ร้อยละ 50.90 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 55,481,232.72 บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน 40,948,768 บาท เบิกจ่าย 19,810,932.28 บาท งบรายจ่ายอื่น 9,839,600 บาท เบิกจ่าย 1,470,889 บาท งบลงทุน 62,366,832 บาท เบิกจ่าย 36,240,500 บาท งานส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีกิจกรรมที่ยกเลิกดำเนินการ ได้แก่

- กิจกรรมก่อสร้างฝายนิคมเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมอาคารประกอบ บ้านคลองบง ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 9,800,000 บาท เนื่องจากตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า ฐานรากเป็นชั้นหินผุ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เนื่องจากน้ำไหลลอดผ่านฐานรากที่เป็นหินผุ ทำให้ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

- กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างดินในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง (การระเบิดดินดาน) งบประมาณ 3,500,000 บาท เนื่องจากได้รับอนุมัติล่าช้าในช่วงกุมภาพันธ์ 2561 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการไถระเบิดดินดานได้ทันฤดูการเพาะปลูกของเกษตรกร

- กิจกรรมสนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) งบประมาณ 5,775,100 บาท เนื่องจากได้รับอนุมัติล่าช้าในช่วงกุมภาพันธ์ 2561 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการซึ่งตามหลักวิชาการต้องดำเนินการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

- รายการเชื่อมโยงการกระจายสินค้าข้าวนครชัยบุรีนทร์ 2,202,000 บาท สาเหตุเนื่องจากพิจารณาเห็นว่าหน่วยดำเนินการไม่ได้มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ อาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ได้มีการนำเงินในส่วนที่ยกเลิกนี้ไปดำเนินกิจกรรมอื่นแล้ว ประกอบกับในปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดมีภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล ทำให้การจัดลำดับการทำงาน มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และบางหน่วยงานไม่ประสงค์ที่จะดำเนินงานเนื่องจากเกรงกลัวจะไม่ถูกต้องตามระบบการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่เข้มงวดและไม่อยากเสี่ยงภัย

# หน้า 19

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	78,052,400	45,438,187.28	58.31	32,484,041.72
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	3,702,000	967,000	26.12	2,735,000
	1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	53,666,622	30,298,000	56.57	23,258,551
	1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	7,694,900	5,237,390	68.06	2,457,510
	1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	8,191,700	5,737,120	70.04	2,454,480
	1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	4,797,178	3,198,677.28	66.96	1,578,500.72
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	32,615,600	10,100,890	30.98	22,500,000
	2.1 ยกกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	3,562,710	3,560,000	100	-
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	7,750,000	750,000	9.68	7,000,000
	2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	9,802,890	4,802,890	48.99	5,000,000
	2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	11,500,000	988,000	8.60	10,500,000
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	1,987,200	1,682,155	84.94	298,280
	3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่นครชัยบุรีรินทร์	1,737,200	1,438,920	82.83	298,280
	3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรินทร์	250,000	243,235	100	-
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	500,000	301,089	60.22	198,911
	รวมทั้งสิ้น	113,155,200	57,522,321.28	50.90	55,481,232.72

## 1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 78,052,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว 45,438,187.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.31 ยังไม่เบิกจ่าย 32,484,041.72 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่

1.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มี 1 รายการหลัก กิจกรรมก่อสร้างฝายนิคมเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม อาคารประกอบ บ้านคลองบัง ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 9,800,000 บาท ต่อมาได้ยกเลิกดำเนินการ เนื่องจากตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า ฐานรากเป็นชั้นหินผุ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เนื่องจากน้ำไหลลอดผ่านฐานรากที่เป็นหินผุ ทำให้ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีรายการที่เป็นการขอใช้เงินยกเลิกการดำเนินงาน เงินเหลือจากการจัดสรร หรือจากเงินเหลือจ่ายอีก 5 รายการ งบประมาณรวม 3,702,000 บาท เป็นงานดำเนินการเอง และจ้างเหมา มีผลการเบิกจ่าย 967,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.12

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มี 2 รายการ และมีรายการที่เป็นการขอใช้เงินยกเลิกการดำเนินงาน เงินเหลือจากการจัดสรร หรือจากเงินเหลือจ่ายเพิ่มเติมอีก 11 รายการ รวมเป็น 13 รายการ งบประมาณ 53,666,622 บาท มีผลการเบิกจ่าย 30,298,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.57 ยังไม่เบิกจ่าย 23,258,551 บาท มีกิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และจะต้องกันเงินเบิกจ่ายเหลือมี 3 กิจกรรม ดังนี้

- รายการ ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Cope Seal สายบ้านระเวียง หมู่ที่ 9 เชื่อมเขตบ้านหนองขุย ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 1,350.00 เมตร งบประมาณ 1,538,551 บาท

- รายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 9 เชื่อมตำบลหันห้วยทราย ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.05 เมตร งบประมาณ 1,540,000 บาท

- รายการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายดอนแร่ - ดอนไก่อ้นม.3375 บ้านคูมะค่า หมู่ที่ 10 และบ้านหนองเขียงไข่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วงทาง (1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร กว้าง 6 เมตรยาว 305 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1 เมตร หนา 5 เซนติเมตร (2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 5 เซนติเมตร งบประมาณ 2,200,000 บาท

1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 7,694,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย 5,237,390 บาท ร้อยละ 68.06 ยกเลิกดำเนินการ 3 รายการ คือ

- รายการสนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) งบประมาณ 5,775,100 บาท เนื่องจากได้รับอนุมัติล่าช้าในช่วงกุมภาพันธ์ 2561 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการปลูก ซึ่งตามหลักวิชาการต้องดำเนินการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

- รายการการจัดงานรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว 1,568,000 บาท เนื่องจากได้รับอนุมัติล่าช้าในช่วงกุมภาพันธ์ 2561 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการปลูก ซึ่งตามหลักวิชาการต้องดำเนินการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต



- การเชื่อมโยงการกระจายสินค้าข้าวนครชัยบุรีรินทร์ 2,202,000 บาท เนื่องจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่าไม่ใช่ภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนอกจากนี้การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานอินทรีย์ งบประมาณ 1,100,000 บาท ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ไม่ดำเนินการเนื่องจากไม่ทันฤดูกาลผลิต และรายการสาธิตผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เอง งบประมาณ 1,110,000 บาท ได้ส่งคืนเนื่องจากวัสดุไม่มีจำหน่าย

1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง งบประมาณ 8,191,700 บาท ผลการเบิกจ่าย 5,737,120 บาท ร้อยละ 70.04 งบประมาณ 6,127,000 บาท มียกเลิกกิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างดินในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง (การระเบิดดินดาน) งบประมาณ 4,690,000 บาท ต่อมาได้มีการนำเงินไปดำเนินกิจกรรมอื่น

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 4,797,178 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,198,677.28 บาท ร้อยละ 66.96 ได้ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี เป็นงานจ้างที่ปรึกษานวัตกรรมอาหารนครชัยบุรีรินทร์

## 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 32,615,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว 10,100,890 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.98 ยังไม่เบิกจ่าย 22,500,000 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 3,562,710 บาท เบิกจ่าย 3,560,000 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัด จำนวน 10 ชุด

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 7,750,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 750,000 บาท ร้อยละ 9.68 ปัญหาอุปสรรคเนื่องจากหน่วยงานมีบุคลากรจำนวนน้อย ต้องขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากจังหวัดในกลุ่มเพื่อให้ครบองค์ประกอบคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเพิ่งได้ครบจะได้ดำเนินการแต่งตั้งเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา ได้ขอเบิกเงินเบิกจ่ายเหลือในปี 3 รายการ งบประมาณ 12,000,000 บาท ดังนี้

- รายการ พัฒนาศักยภาพการให้บริการของเครือข่ายผู้ประกอบการและสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ฯ งบประมาณ 3,000,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

- รายการ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อเปิดมุมมอง เพิ่มขีดความสามารถรองรับการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวน 4 ครั้ง งบประมาณ 4,000,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

- รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง CCTV ที่ชำรุดในจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 5,000,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

2.3 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 4,802,890 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,802,890 บาท ร้อยละ 100 เป็นงานอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการโรมแรม หอพัก สถานบริการ

2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 11,500,000 บาท รายการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ : เปิดบ้านนครชัยบุรีรินทร์ (Open House Nakhonchaiburin) งบประมาณ 11,500,000 บาท ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี สำหรับกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ปั่นจักรยาน Tour of Nakhonchaiburin งบประมาณ 10,500,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

## 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 1,737,200 บาท ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน 250,000 บาท รวมเป็นงบประมาณสำหรับกิจกรรมนี้ 1,987,200 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่

3.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่นครชัยบุรีรินทร์ การผลิตเส้นไหมที่ดีและได้มาตรฐาน งบประมาณ 1,737,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,438,920 บาท ร้อยละ 82.83 ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ

3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรินทร์ (การพัฒนา cluster ใหม่ นครชัยบุรีรินทร์ ซึ่ง เป็นงบประมาณที่ได้รับการเฉลี่ยจากจังหวัดชัยภูมิ) จำนวน 250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 250,000 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 โครงการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ดังนี้

## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

1. โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมหลัก ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 200,300,000 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 เบิกจ่าย 87,165,214.30 ร้อยละ 63.16 สำหรับงานก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ มีหน่วยงานรับผิดชอบ 2 หน่วยงาน ได้แก่

1. ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ทั้งหมด 4 กลุ่ม จำนวน 40 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,659,900 บาท มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 188,900 บาท ครุภัณฑ์บางอย่างต้องรออาคารสิ่งก่อสร้างเสร็จจึงจะเข้าไปติดตั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ได้

2. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยดำเนินการ งบประมาณ 129,500,000 บาท กิจกรรมการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ โดยบริษัท ปราสาทสุข จำกัด เริ่ม 28 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาภายใน 17 พฤศจิกายน 2561 เบิกจ่ายไปแล้ว 63 งวด จำนวน 92,008,200 บาท คงเหลือ 20 งวด ที่ยังไม่เบิก 37,491,800 บาท ผลงาน 94.65 % เร็วกว่าแผน 2.85 % ประกอบด้วย

DC01 อาคารศูนย์พักพิงสุนัข	DC19 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรองภายใน
DC02 อาคารร้านจำหน่ายอาหาร	DC20 ทางเท้าภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
DC03 อาคารร้านจำหน่ายของที่ระลึก	DC21 ขอบคันหินสำเร็จรูป
DC04 อาคารส่วนจัดแสดงสุนัข	DC22 รั้วรอบพื้นที่และรั้วด้านหน้าศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
DC05 อาคารคลินิกสุนัข 2 อาคาร	DC23 ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าสว่างภายในศูนย์
DC06 อาคารสำนักงานและแผนกช่าง 2 อาคาร	DC24 ระบบประปาภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
DC07 อาคารเก็บอาหารสัตว์ 2 อาคาร	DC25 ระบบระบายน้ำภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
DC08 อาคารพักพิงสุนัข 2 อาคาร	DC26 อาคารผลิตก๊าซชีววมวล
DC09 อาคารที่พักอาศัย 24 หน่วย	DC27 ระบบบำบัดน้ำเสียรวมภายใน
DC10 อาคารที่พักอาศัย 32 หน่วย 4 หลัง	DC28 หลังคาคลุมทางเดิน
DC11 อาคารโรงอาหาร	DC29 งานปลูกต้นไม้ยืนต้น
DC12 อาคารเก็บซาก ชั้นสูตร เผาซาก	DC30 งานปลูกต้นไม้ยืนต้น
DC13 อาคารโรงเรือน	DC31 งานปลูกต้นไม้ยืนต้น
DC14 แลนด์มาร์คสัญลักษณ์โครงการรูปคล้ายสุนัขทรงเลี้ยง	
DC15 ป้ายโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กกรุหินอ่อน	
DC16 ป้อมยาม	DC32 งานปลูกหญ้า
DC17 ลานจอดรถคอนกรีต	DC33 งานปรับสภาพพื้นที่
DC18 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักภายใน	DC34 งานติดตั้งกล่องวงจรปิด











2. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำงานแก้มลิงบ้านเขว้า ระยะ 2 พร้อมอาคารประกอบและระบบ เชื่อมโยงน้ำ ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา งบประมาณ 17,710,000 บาท (เงินเหลือจ่าย)

ผลการเบิกจ่าย 5,524,533.18 บาท ร้อยละ 18.66 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากรายการพัฒนาระบบ เชื่อมโยงน้ำระหว่างแก้มลิงบึงกระเสียว

– แก้มลิงบ้านเขว้า และแก้มลิงพิมาน ตำบลกำปิ่ง อำเภอโนนไทย ซึ่งกิจกรรมนี้จะทำการ ขุดลอกบึงบ้านเขว้าที่ตื้นเขิน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถผันน้ำจากบึงพุดซาเข้ามายังแก้มลิงบึง กระเสียว บึงบ้านเขว้า และสามารถส่งต่อไปยังบึงพิมาน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่อำเภอโนนไทย ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างลงงานเพื่อทำการขุดลอกบึงบ้านเขว้า สำหรับงานดำเนินการเอง เป็นงานวางท่อ คอนกรีตเพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่เกษตรกรรมความยาว 1,140 เมตร เป็นงานท่อ box convert ซึ่งเมื่อ ดำเนินการเสร็จและถมดินจะมีการปูหินบดอัดรถยนต์สามารถวิ่งบนแนวท่อได้









### จังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ออกติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเมื่อ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ



## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 82,971,382 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500,000บาท) ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 78,072,248.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.96 ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 1,625,955.83 บาท งบพันไป 3,273,117.25 บาท จังหวัดชัยภูมิ ยังคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร งบประมาณ 1,625,955.83 บาท จำนวน 3 รายการ ดังนี้

- รายการ ปรับปรุงการกักเก็บน้ำแก้มลิงกุดไข่นุ่นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองไผ่ อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ ยังไม่เบิกจ่าย 650,252.83 บาท
- รายการ ปรับปรุงกักเก็บน้ำแก้มลิงหนองสำโรงพร้อมอาคารประกอบ บ้านไร่ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ยังไม่เบิกจ่าย 437,400 บาท
- รายการ ปรับปรุงฝายหินทิ้งบ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ยังไม่เบิกจ่าย 538,303 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพันไป
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	5,871,800	5,863,800	100	-	8,000
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	2,582,000	2,571,400	100	-	10,600
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	1,270,200	1,270,200	100	-	-
4	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	42,719,002	39,530,848.92	99.12	1,625,955.83	1,562,197.25
5	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์	945,000	945,000	100	-	-
6	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก และแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม	525,000	-	-	-	525,000
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล	4,308,300	3,918,000	100	-	390,300
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนระบบรางและเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์	24,250,080	23,473,000	100	-	777,080
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ	500,000	500,000	100	-	-
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>82,971,382</b>	<b>78,072,248.92</b>	<b>97.96</b>	<b>1,625,955.83</b>	<b>3,273,177.25</b>

## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560) จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 4 โครงการงบประมาณ 756,559,800 บาท ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 เบิกจ่าย 629,877,964.38 บาท ร้อยละ 88.92 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 78,470,327.80 บาท เงินพับไป 48,211,507.82 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน 104,025,300 บาท เบิกจ่าย 94,740,134.74 บาท งบลงทุน 600,114,500 บาท เบิกจ่าย 482,767,829.64 บาท งบรายจ่ายอื่น 2,500,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบอุดหนุน 49,920,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ นครชัยบุรินทร์ครบวงจร และโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนที่

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบสะสมพับไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรินทร์	571,376,300	473,011,718.60	86.97	70,875,327.80	26,992,053.60
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ นครชัยบุรินทร์ครบวงจร	17,169,200	16,672,140	100	-	104,460
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	7,137,300	4,933,321	100	-	2,198,479
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล (รวมเงินเหลือจ่าย)	160,877,000	135,260,784.78	94.68	7,595,000	18,916,515.22
	รวมทั้งสิ้น	756,559,800	629,877,964.38	88.92	78,470,327.80	48,211,507.82



## 1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 571,376,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 473,011,718.60 บาท ร้อยละ 86.97 ได้แก่

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ มี 25 รายการหลัก งบประมาณ 407,308,700 บาท และรายการที่เป็นการขอใช้เงินเหลือจ่ายอีก 2 รายการ ผลการเบิกจ่าย 326,165,959 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.22 ยังไม่เบิกจ่าย 70,523,327.80 บาท มี ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 รายการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 รายการ

1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐ นครชัยบุรีรินทร์ มี กิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 40,792,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 26,697,665.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.70 ยังไม่เบิกจ่าย 352,000 บาท ยังคงค้างการส่งเบิกค่าชุดนิทรรศการ

1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐ นครชัยบุรีรินทร์ มี 3 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 19,275,600 บาท ผลการเบิกจ่าย 16,163,046 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.4 กิจกรรมปฏิรูปภาคการเกษตร มี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 104,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 103,985,047 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

## 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร งบประมาณ 17,169,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 16,672,140 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 15,551,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 15,162,520 บาท

2.2 กิจกรรมพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 320,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 312,000 บาท

2.3 พัฒนาลาดโคเนื้อมีชีวิตและเนื้อโคคุณภาพ งบประมาณ 1,130,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,029,620 บาท

2.4 กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 168,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 168,000 บาท

## 3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทยแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนงบประมาณ 7,137,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,933,321 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

3.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง  
งบประมาณ 250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 250,000 บาท

3.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ  
1,334,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,305,936 บาท

3.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่เป็นงาน  
ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5 รายการ ก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้ง  
พลังงานแสงอาทิตย์ 5 แห่ง เจาะบ่อบาดาล 2 แห่ง รวมทั้งหมด 12 รายการ งบประมาณ 4,913,000  
บาท ผลการเบิกจ่าย 3,070,485 บาท

3.4 กิจกรรมจัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640,000  
บาท ผลการเบิกจ่าย 306,000 บาท

## 4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน งบประมาณ  
160,877,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 135,260,784.78 บาท ร้อยละ 94.68 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ  
5 กิจกรรม ได้แก่

4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่น  
แก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นงานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์  
วงจรปิดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญมีทั้งหมด 5 รายการ งบประมาณ 15,000,000 บาท  
ผลการเบิกจ่าย 14,940,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอส  
ฟัลติกคอนกรีต 2 สายทาง งบประมาณ 22,500,000 บาท มีรายการขอใช้เงินเหลือจ่ายอีก 1  
รายการ งบประมาณ 18,855,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 30,665,300 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน เป็นงานซ่อมสร้าง  
ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 3 สายทางงบประมาณ 116,977,000 บาท ผลการ เบิกจ่าย  
87,291,484.78 บาท ร้อยละ 94.28 และมีรายการเพิ่มเติมจากเงินยกเล็ก เงินเหลือจ่ายอีก 4 รายการ  
งบประมาณ 30,882,300 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 รายการและอยู่ระหว่างดำเนินการ 1  
รายการ คือรายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 201 -  
แยกทางหลวงหมายเลข 2054 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 0.775 กิโลเมตร  
(เงินยกเล็ก) ยังไม่เบิกจ่าย 5,300,000 บาท

4.4 กิจกรรม พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของภาครัฐ งบประมาณ  
6,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,964,000 บาท ร้อยละ 46.11 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน 1 รายการ คือ รายการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
หมู่ที่ 3 บ้านเล่า หมู่ที่ 4 บ้านนุ่งสิบสี ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 2 แห่ง  
งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 2,295,000 บาท

4.5 กิจกรรมก่อสร้างอาคารที่พักบริการประชาชนของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  
งบประมาณ 400,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ



## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 95,691,700 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 เบิกจ่าย 65,383,992.52 บาท ร้อยละ 68.71 ยังไม่ได้เบิก 29,781,707.48 บาท สรุปได้ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	86,691,568.06	57,741,410.58	67.01	28,424,157.48
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	70,458,968.06	51,057,854.60	73.01	18,875,113.46
	1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	10,473,000	5,336,279.62	50.95	5,136,720.38
	1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	3,734,400	219,632.30	5.88	3,514,767.70
	1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	2,025,200	1,127,644.06	55.68	897,555.94
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	4,036,831.94	3,036,831.94	75.23	1,000,000
	2.1 ยกกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	2,286,831.94	2,286,831.94	100	-
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	750,000	750,000	100	-
	2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	1,000,000	-	-	1,000,000
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	4,463,300	4,255,080	95.33	208,220
	3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่ นครชัยบุรีรินทร์	3,213,300	3,005,080	93.52	208,220
	3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรีรินทร์	1,250,000	1,250,000	100	-
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ	500,000	350,670	70.13	149,330
	รวมทั้งสิ้น	95,691,700	65,383,992.52	68.71	29,781,707.48

## 1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีนทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีนทร์ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 86,691,568.06 บาท มีผลการเบิกจ่าย 57,741,410.58 บาท ร้อยละ 67.01 ได้แก่

1.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มี 8 รายการ งบประมาณ 70,458,968.06 บาท และมีรายการที่เป็นการขอใช้เงินเหลือจ่ายเพิ่มเติมอีก 1 รายการ งบประมาณ 7,000,000 บาท รวมเป็น 77,458,968.06 บาท มีผลการเบิกจ่าย 51,057,854.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.01 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 18,875,113.46 บาท มีรายการที่คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือมี จำนวน 3 รายการ คือ

- รายการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าวังเสมา ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 14,700,000 บาท

- รายการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหว้า ตำบลเนินสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 7,530,000 บาท

- รายการ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ สระบ้านหนองกระเทียม พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองกระเทียม ตำบลกะหาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 7,000,000 บาท

1.2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 11,151,000 บาท ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การจัดงานรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว ไปให้จังหวัดในกลุ่ม คงเหลืองบประมาณในกิจกรรมนี้ 10,473,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 5,336,279.62 บาท ร้อยละ 50.95 ยังไม่เบิกจ่าย 5,136,720.38 บาท คาดว่าขอเงินไว้เบิกเหลือมี รายการ ตรวจสอบรแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 372,000 บาท

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง งบประมาณ 2,645,000 บาท ต่อมาได้รับเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก จังหวัดในกลุ่มเพื่อดำเนินการ รวมงบประมาณสำหรับกิจกรรมนี้ 3,734,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 219,632.30 บาท ร้อยละ 5.88 ยังไม่เบิกจ่าย 3,514,767.70 บาท

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 1,141,200 บาท ต่อได้รับสนับสนุนเงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินการเพิ่มเติม รวมงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมนี้ 2,025,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,127,644.06 บาท ร้อยละ 55.68 ยังไม่เบิกจ่าย 897,555.94 บาท

## 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนทร์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนทร์ งบประมาณ 4,036,831.94 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,036,831.94 บาท ร้อยละ 75.23 ยังไม่เบิกจ่าย 1,000,000 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในสายทาง จำนวน 4 สายทาง งบประมาณ 2,286,831.94 บาท เบิกจ่าย 2,286,831.94 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 750,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 750,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.3 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 1,000,000 บาท เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาปั่นจักรยาน Tour of Nakhonchaiburin ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ครั้ง ดำเนินการเสร็จแล้วอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

## 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 5,213,300 บาท ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปให้จังหวัดในกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนา cluster ใหม่นครชัยบุรีรัมย์ คงเหลืองบประมาณสำหรับโครงการ 4,463,300 บาท เบิกจ่าย 4,255,080 บาท ร้อยละ 95.33 ยังไม่เบิกจ่าย 208,220 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่

3.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่นครชัยบุรีรัมย์ การผลิตเส้นไหมที่ดีและได้มาตรฐาน งบประมาณ 3,213,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,005,080 บาท ร้อยละ 93.52 ยังไม่เบิกจ่าย 208,220 บาท

3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรัมย์ การพัฒนา cluster ใหม่นครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 2,000,000 บาท ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปให้จังหวัดในกลุ่ม คงเหลืองบประมาณสำหรับกิจกรรมนี้ 1,250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,250,000 บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ



กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

**งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม**

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของภาครัฐ ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 6,000,000 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน 700,000 บาท เป็นงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว และจัดงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร "วิถีคนพรม" มีงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง 6 รายการ งบประมาณ 5,300,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,964,000 บาทหรือร้อยละ 46.11 ยังไม่เบิก 2,295,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
  1. ก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านเล่า หมู่ที่ 4 บ้านบุงสิบสี ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 2 แห่ง งบประมาณ 2,500,000 บาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม – เขียวดำ เป็นหน่วยดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
  2. ก่อสร้างอาคารศาลาเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว หมู่ที่ 3 บ้านเล่า หมู่ที่ 4 บ้านบุงสิบสี ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 2 แห่ง งบประมาณ 1,000,000 บาท
  3. ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านท่องเที่ยว หมู่ที่ 4 บ้านบุงสิบสี ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง งบประมาณ 1,000,000 บาท
  4. ก่อสร้างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 2 แห่ง งบประมาณ 20,000 บาท













### จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีก่อนที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์



## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดบุรีรัมย์ มีโครงการที่ดำเนินในพื้นที่ จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 91,824,800 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500,000 บาท) ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 90,390,566.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.44 งบพื้ไป 1,434,233.36 บาท ร้อยละ 1.56 จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพื้ไป
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	8,052,500	7,961,224	98.86	-	91,276
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	5,563,200	5,560,610	99.95	-	2,590
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	3,256,104	3,256,104	100	-	-
4	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	12,000,000	11,040,760.80	92	-	959,239.20
5	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	3,500,000	3,484,540	99.55	-	15,460
6	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม	3,524,400	3,398,400	96.42	-	126,000
10	โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ	1,576,223	1,456,223	92.38	-	120,000
12	โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน	3,883,373	3,809,900	98.10	-	73,473
13	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน	49,969,000	49,922,804.84	99.90	-	46,195.16
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ	500,000	500,000	100	-	-
	รวมทั้งสิ้น	91,824,800	90,390,566.64	98.44	-	1,434,233.36

## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการจัดสรร งบประมาณดำเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 831,693,400 บาท ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 610,505,960.54 บาท ร้อยละ 81.50 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 138,612,260.18 บาท งบประมาณพบไป 82,575,179.28 บาท ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่แล้วเสร็จ ยังคงเหลืองานพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ และงานที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย เงินยกเลิก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพบไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรีรินทร์	681,798,200	447,245,911.45	65.31	84,641,660.18	79,692,528.37
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	22,580,300	21,204,677.50	93.90	-	222.50
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	6,314,900	3,252,752.29	51.50	-	678,147.71
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	121,000,000	135,839,319.30	100	53,970,600.00	2,204,280.70
5	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำซู้ บ้านหัวหนองหมู่ที่ 8 ตำบลคอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (เหลือจ่ายน้ำท่วม งบประมาณ 2,963,300 บาท)	(เหลือจ่าย)	2,963,300	100	-	-
รวมทั้งสิ้น		831,693,400	610,505,960.54	73.40	138,612,260.18	82,575,179.28



## 1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มี 4 กิจกรรมหลัก งบประมาณรวม 681,798,200 บาท เบิกจ่ายไป 448,076,342.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.24 ยังไม่เบิกจ่าย 83,811,228.82 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ มีจำนวน 33 รายการ งบประมาณรวม 466,918,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 318,874,421.79 บาท ร้อยละ 79.19 มีรายการที่คาดว่าจะต้องขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 รายการ ได้แก่

- รายการ คลองเชื่อมลำปะเทีย – บ้านโคกเห็ด ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 44,067,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย 27,312,368.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.23 ยังไม่เบิกจ่าย 15,209,444.98 บาท

- รายการ คลองเชื่อมบ้านชุมแสง – อ่างห้วยตลาด บ้านชุมแสง ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 49,419,300 บาท มีผลเบิกจ่าย 29,483,790.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.44 ยังไม่เบิกจ่าย 16,267,952.75 บาท

- รายการ แก้มลิงพวงบ้านกระนังพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 39,400,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 19,497,060.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.48 ยังไม่เบิกจ่าย 7,777,929.75 บาท

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ ประชากรัฐนครชัยบุรินทร์ มี 4 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 99,748,200 มีผลการเบิกจ่าย 43,522,019.17 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ประชากรัฐนครชัยบุรินทร์ มี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 11,131,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย 10,535,600 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร มี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 104,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 75,114,301.85 ดำเนินการแล้วเสร็จ

## 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร มี 3 กิจกรรมหลัก งบประมาณรวม 22,580,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 21,204,677.50 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย

2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 22,312,300 บาท เบิกจ่ายไป 20,936,900 บาท

2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ่ายไป 99,777.50 บาท

2.3 กิจกรรมหลักที่ 3 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 168,000 บาท เบิกจ่าย 168,000 บาท

## 3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน มี 5 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 6,314,900 บาท เบิกจ่ายไป 3,252,752.29 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงใหม่ให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังใหม่ สูง งบประมาณ 250,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 234,840 บาท

3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวใหม่ให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 779,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย 637,842.29 บาท

3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่ด้วยพลังงานทดแทน งบประมาณ 2,087,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 890,000 บาท

3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาดันแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME งบประมาณ 2,558,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 908,000 บาท

3.5 กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 582,070 บาท



## 4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล มี 4 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 121,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 116,402,919.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.39 ประกอบด้วย

4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มี 4 รายการ งบประมาณ 15,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 13,189,504.04 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 1 รายการ งบประมาณ 30,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 29,962,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน 1 รายการ งบประมาณ 70,000,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 69,355,415.26 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีรายการที่ใช้เงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิกโอนเปลี่ยนแปลง อีก 4 รายการ งบประมาณ 71,528,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 19,436,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.18

4.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอพระราชรัฐ งบประมาณ 6,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,896,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.22 ยังคงค้างกิจกรรมการทำโคมไฟเสาสงส์ หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสายยาว งบประมาณ 7,900,000 บาท เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการยื่นเสนอราคาว่าไม่ได้คำนวณค่า Factor ในราคากลาง และอยู่ระหว่างวินิจฉัยของกรมบัญชีกลาง

## 5.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำซุง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำซุง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร งบประมาณ 2,963,300 บาท (เงินเหลือจ่าย) ดำเนินการแล้วเสร็จ

## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 116,771,800 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 100,069,125.65 บาท ร้อยละ 85.80 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 16,562,246.18 บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน 14,191,300 บาท เบิกจ่าย 13,029,752.37 บาท งบรายจ่ายอื่น 500,000 บาท เบิกจ่าย 398,320 บาท งบลงทุน 102,080,300 บาท เบิกจ่าย 86,641,053.28 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์	95,488,200	82,652,626.73	86.55	9,992,673.27
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	39,200,000	27,388,553.28	69.86	9,338,546.72
	1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง	49,000,000	48,755,000	99.5	-
	1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี สู่อสากล	2,286,100	1,592,570.21	69.66	603,529.79
	1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	3,614,000	3,528,803.24	97.64	50,596.76
	1.5 ส่งเสริมและพัฒนากาเรียนเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	1,387,700	1,387,700	100	-
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์	13,926,800	11,309,500	81.20	-
	2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	12,176,800	9,561,500	78.52	-
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์	750,000	750,000	100	-
	2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว นครชัยบุรีรัมย์ (เหลือจ่าย)	5,300,000	-	-	-
	2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์	1,000,000	998,000	99.8	-
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์	6,856,800	5,568,378.92	81.20	388,892.91
	3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่ นครชัยบุรีรัมย์	3,606,800	2,410,378.92	66.82	388,892.91
	3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรีรัมย์	3,250,000	3,158,000	97.16	-
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	500,000	398,320	79.66	101,680
	รวมทั้งสิ้น	116,771,800	99,928,825.65	85.57	10,483,246.18

## 1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีนทร์

งบประมาณรวม 95,488,200 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 82,652,626.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.21 มี 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย 3 รายการ งบประมาณ 39,200,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 27,388,553.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.57 ยังไม่ได้อเบิกจ่าย 9,338,546.72 บาท

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 2 รายการ งบประมาณรวม 49,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 48,755,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ประกอบด้วย 4 รายการ งบประมาณ 2,286,100 บาท เบิกจ่าย 1,592,570 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 603,529.79 บาท มีรายการที่คาดว่าจะขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ 1 รายการ คือ รายการตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 400,000 บาท

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง งบประมาณ 3,614,400 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 3,528,803.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.59 ยังไม่เบิก 50,596.76 บาท

1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ มี 2 รายการ งบประมาณ 1,387,700 บาท เบิกจ่าย 1,387,700 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

## 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนทร์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนทร์ งบประมาณ 13,926,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย 11,309,500 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

2.1 กิจกรรมหลักที่ 6 การยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 13 รายการ งบประมาณ 12,176,800 บาท มีผลเบิกจ่าย 9,561,500 บาท

2.2 กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีนทร์ งบประมาณ 750,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 750,000 1บาท

2.3 กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีนทร์ งบประมาณ 1,000,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 998,000 บาท

2.4 กิจกรรมหลัก สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรีนทร์ จำนวน 2 รายการ โดยเป็นการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งบประมาณ 5,300,000 บาท ยังไม่มีผลเบิกจ่าย ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว

## 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีนทร์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีนทร์ งบประมาณรวม 6,856,800 บาท เบิกจ่ายไป 5,568,378.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.47 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

3.1 กิจกรรมหลักที่ 10 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่นครชัยบุรีนทร์ งบประมาณ 3,606,800 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 2,410,378.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.11 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 388,892.91 บาท


3.2 กิจกรรมหลักที่ 11 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีนทร์ งบประมาณ 3,250,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 3,158,000 คิดเป็นร้อยละ 97.16 ดำเนินการแล้วเสร็จ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความคืบหน้า การดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 โครงการ ดังนี้


**งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561**

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนทร์ กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและส่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณรวม 12,176,800 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 85 ชุด (Overhang Sing จำนวน 55 ชุด และ ป้ายแนะนำ 3 แผ่น จำนวน 30 ชุด) โดยแบ่งการติดตั้งป้ายตามถนนสายทางหลวงต่างๆ ดังนี้


1) ถนนสายทางหลวงหมายเลข 348 ตำบลนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 1,064,200 บาท

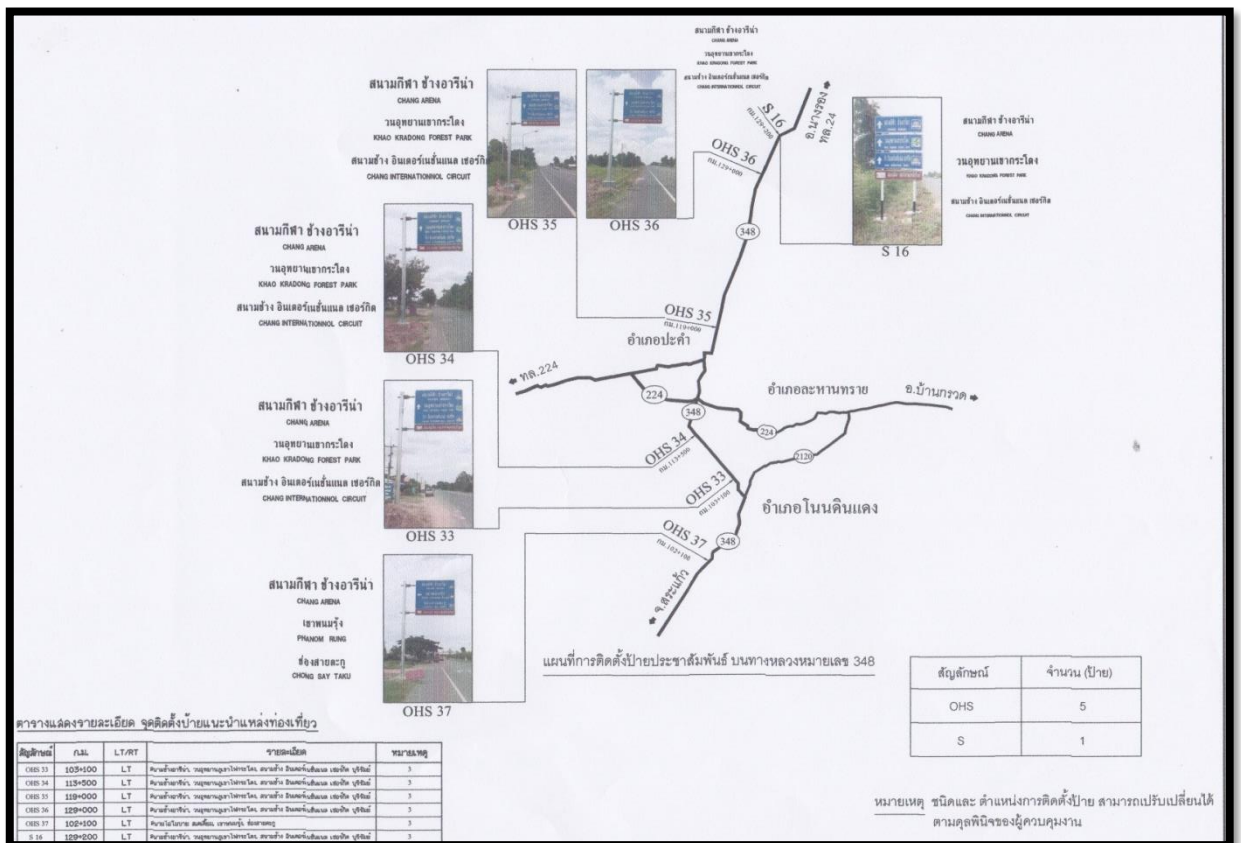


2) ถนนสายทางหลวงหมายเลข 2120 ตำบลลัมป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 232,600 บาท

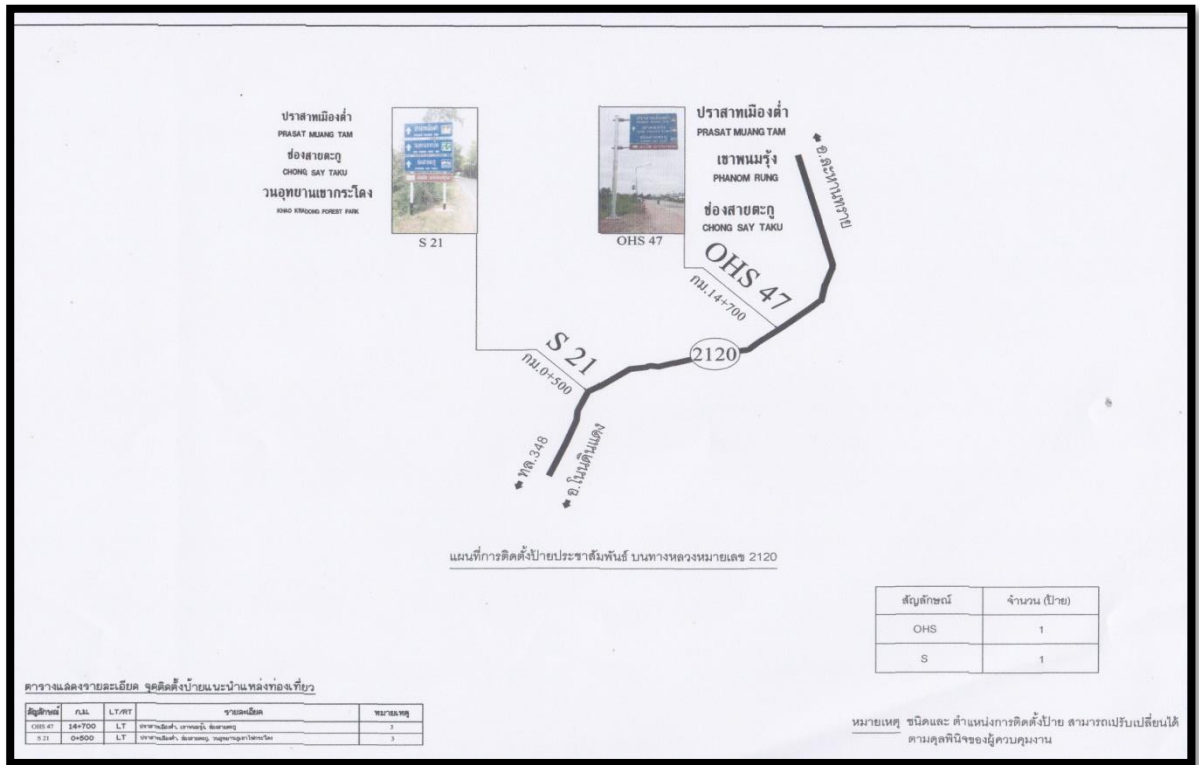


3) ถนนสายทางหลวงหมายเลข 226 ตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 1,554,300 บาท

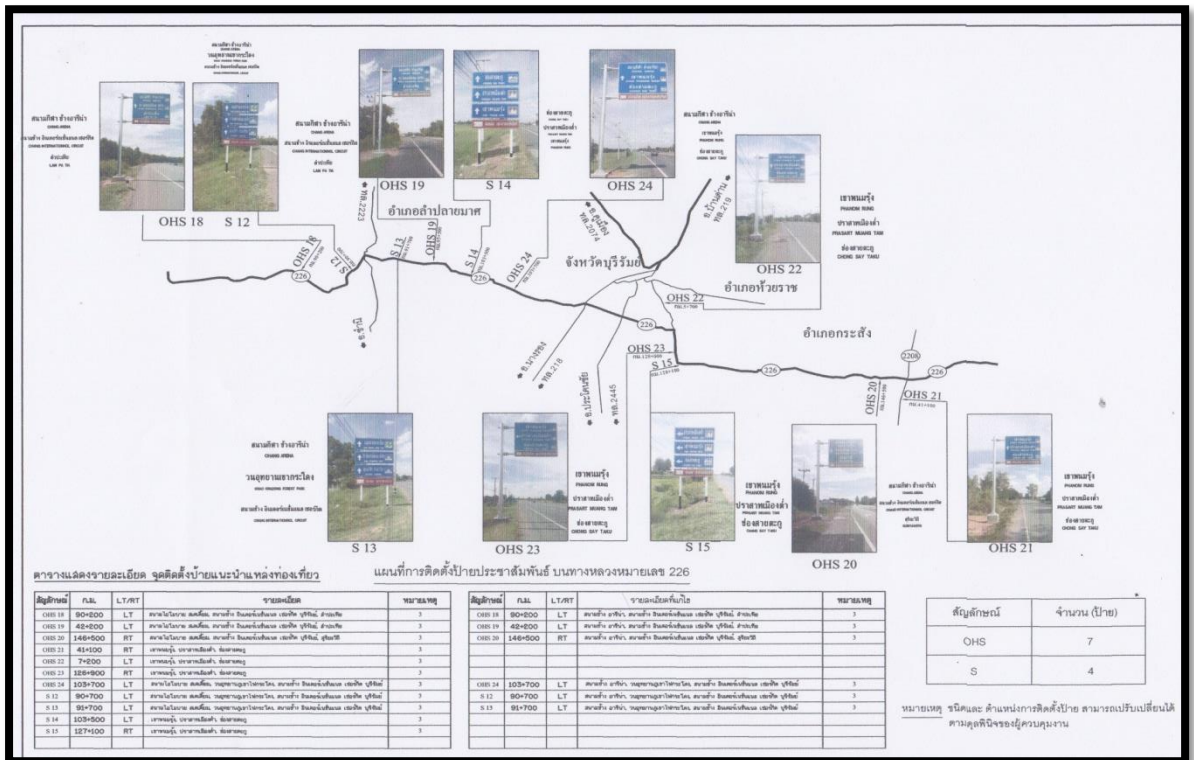

4) ถนนสายทางหลวงหมายเลข 24 ตำบลบุกระสัง อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  
งบประมาณ 1,663,200 บาท

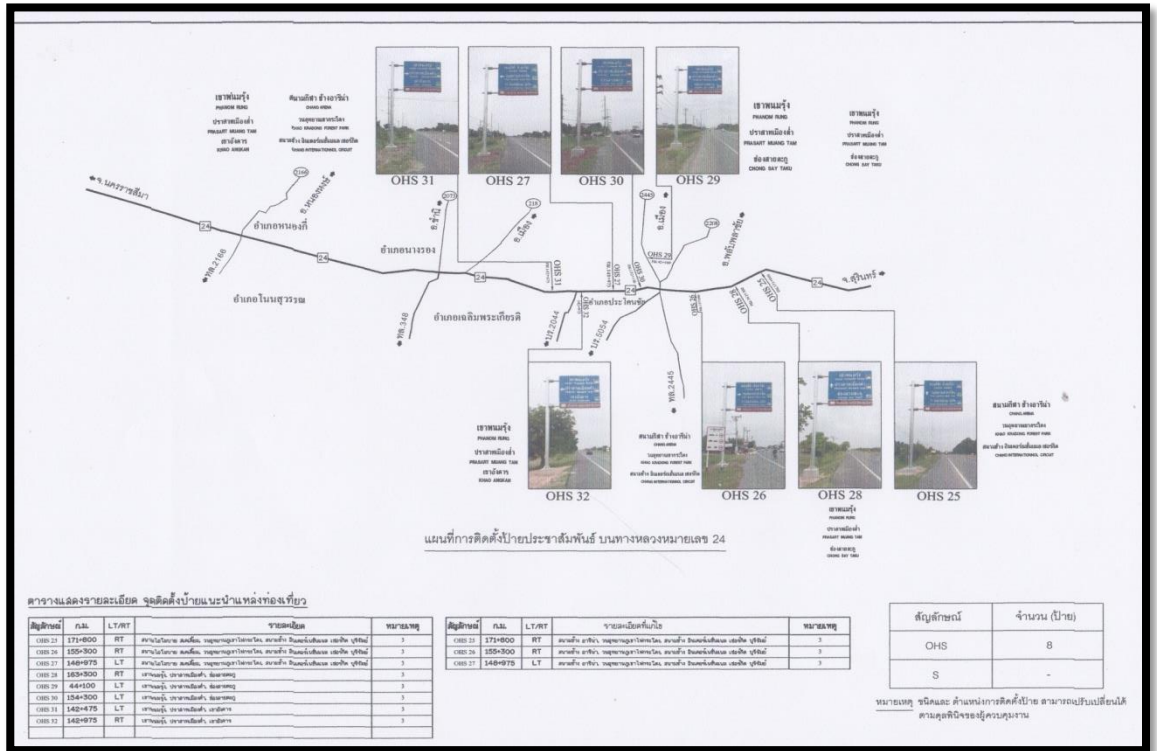


5) ถนนสายทางหลวงหมายเลข 219 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ  
856,300 บาท

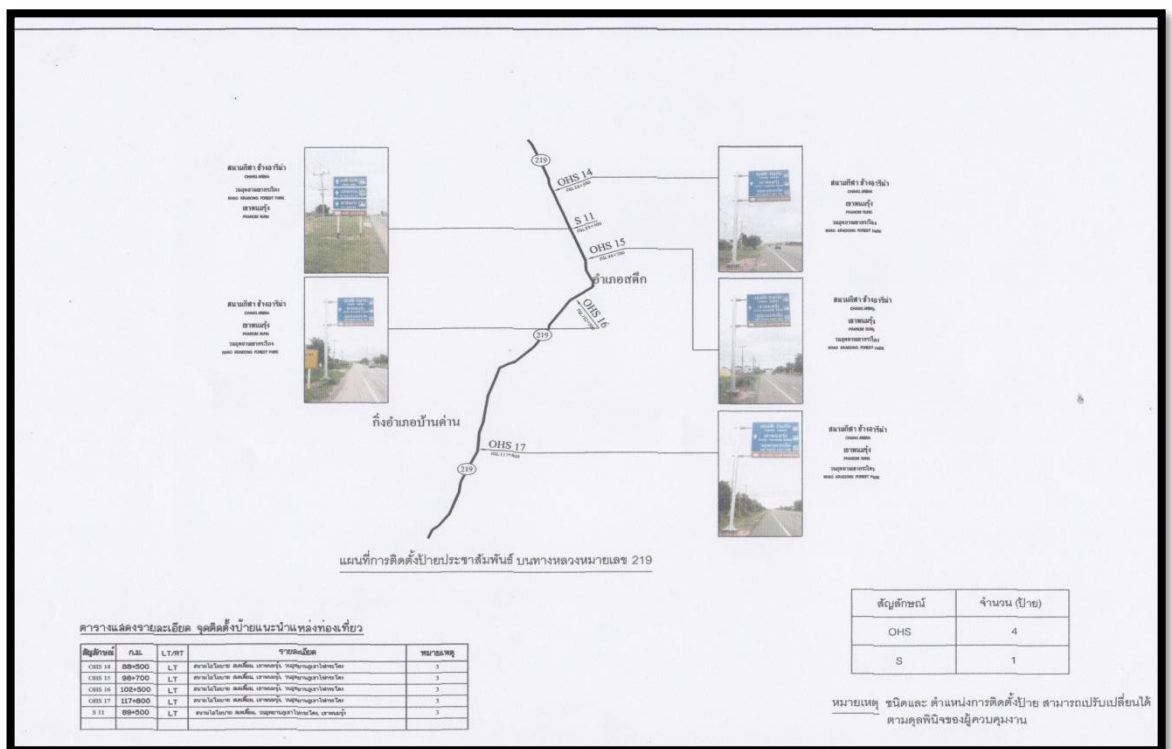





6) ถนนสายทางหลวงหมายเลข 2378 ตำบลชุมวาง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  
งบประมาณ 456,300 บาท

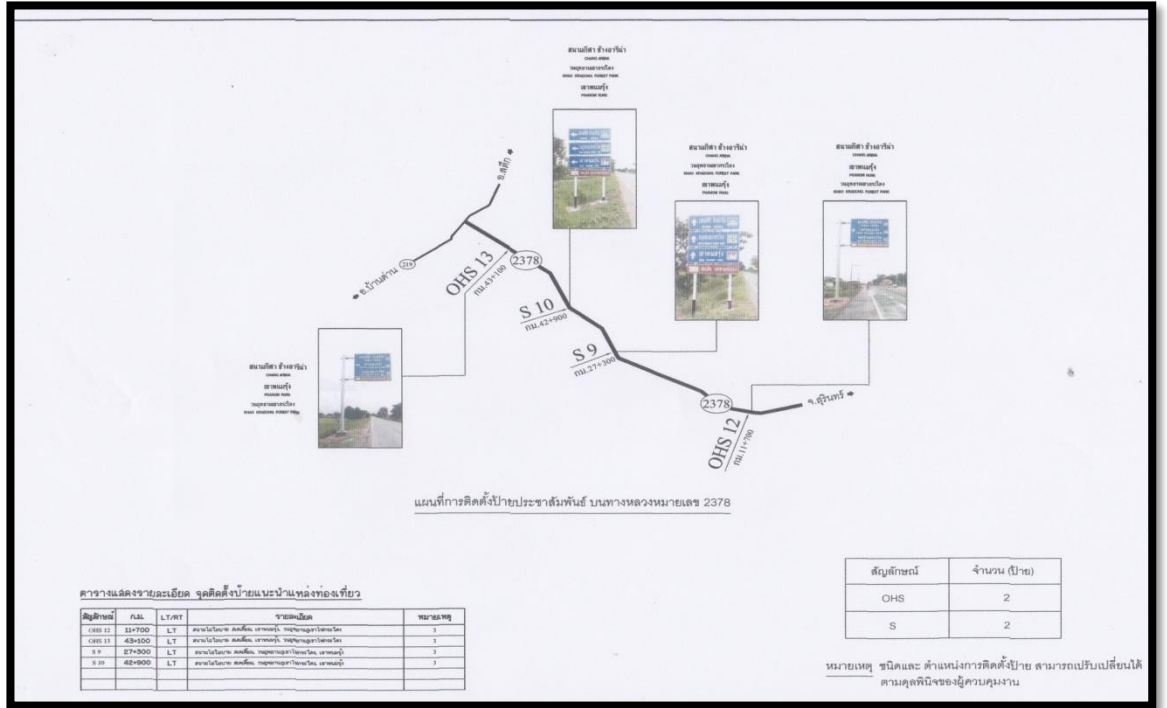


7) ถนนสายทางหลวงหมายเลข 202 ตำบลหนองเือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 1,603,800 บาท

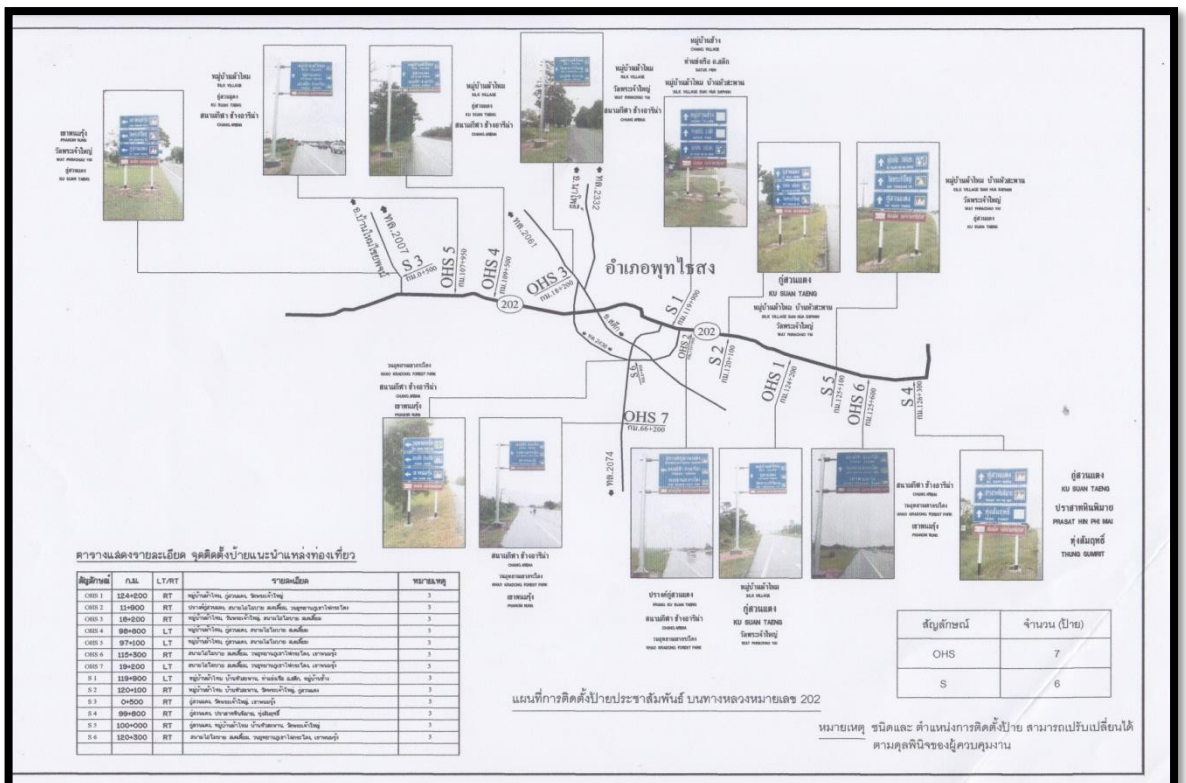


8) ถนนสายทางหลวงหมายเลข 224 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์  
งบประมาณ 1,970,100 บาท

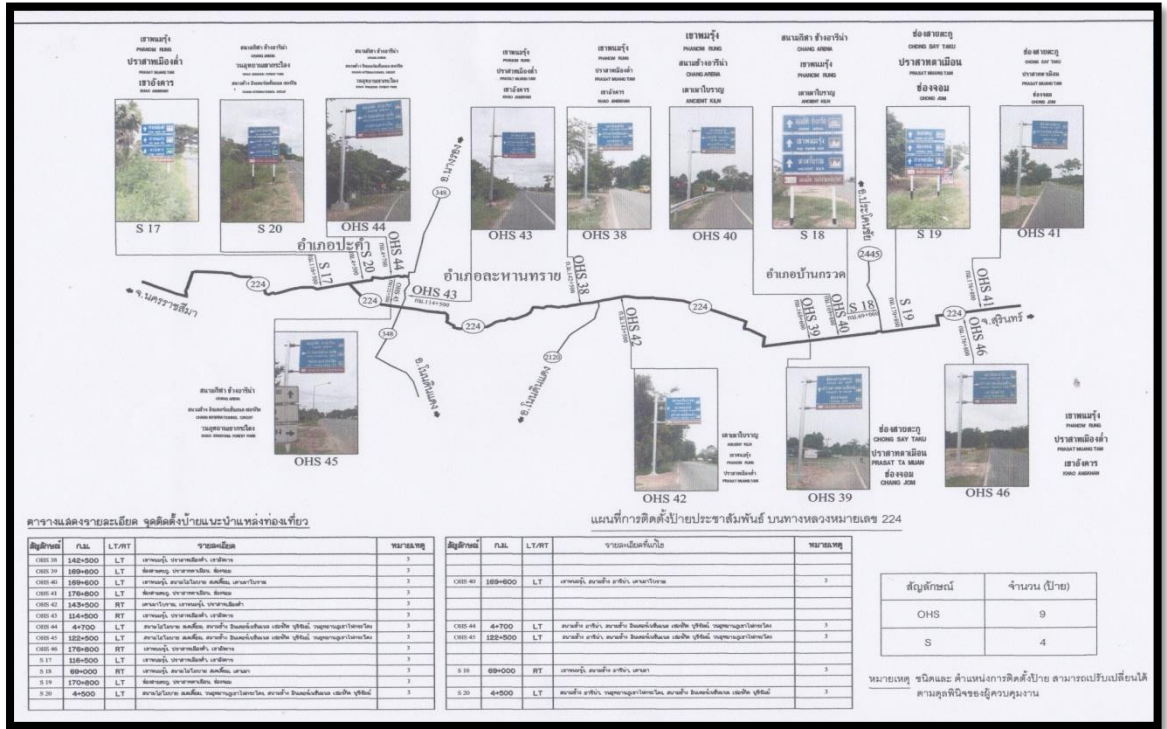


9) ถนนสายทางหลวงชนบทหมายเลข บร. 4013 ตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 856,300 บาท

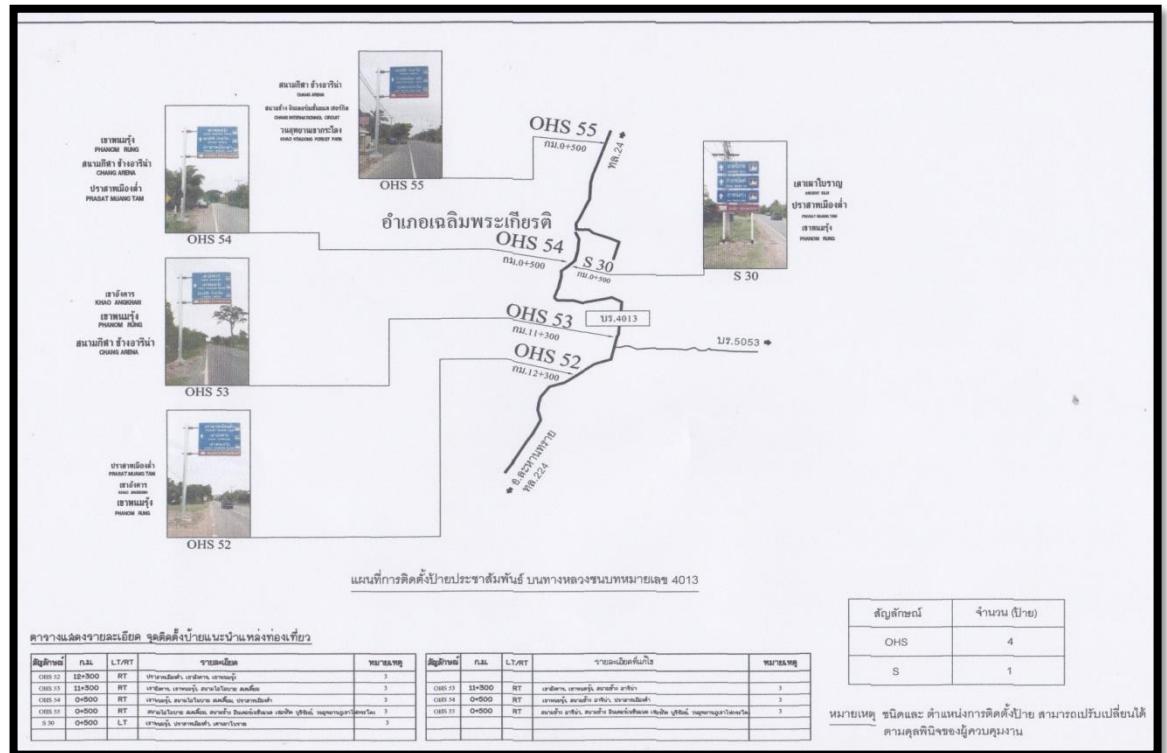


10) ถนนสายทางหลวงชนบทหมายเลข บร. 5053 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 306,900 บาท

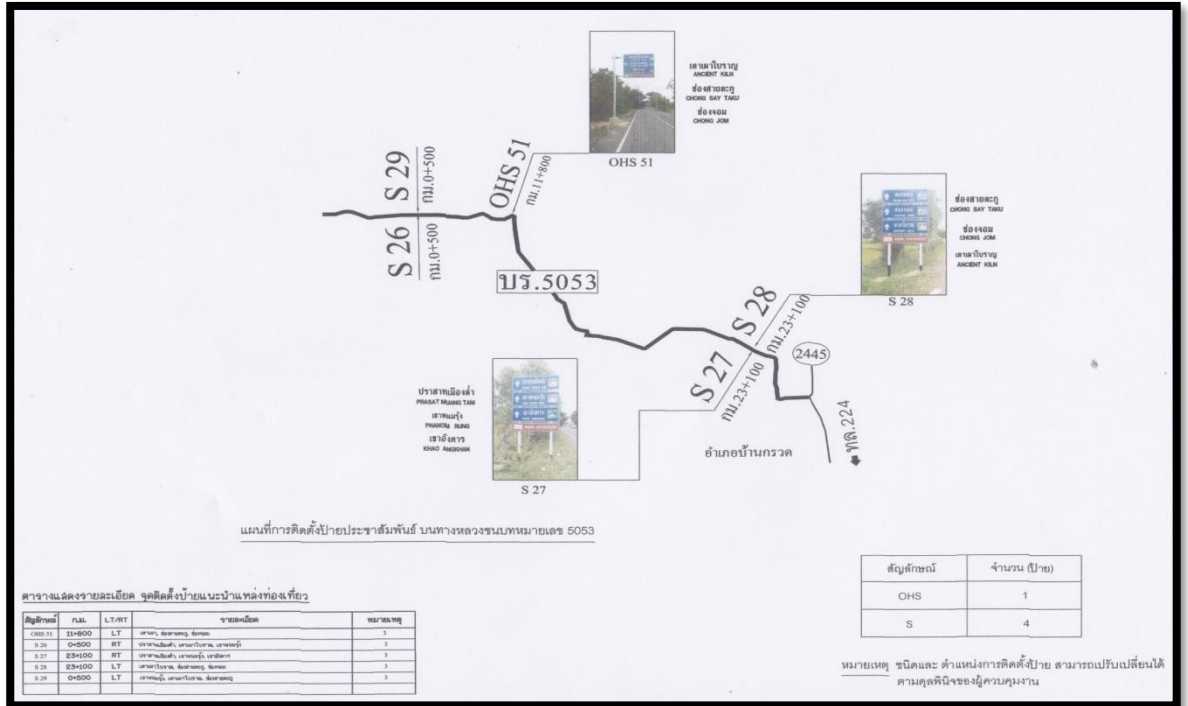


11) ถนนสายทางหลวงชนบทหมายเลข บร. 5054 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 623,700 บาท

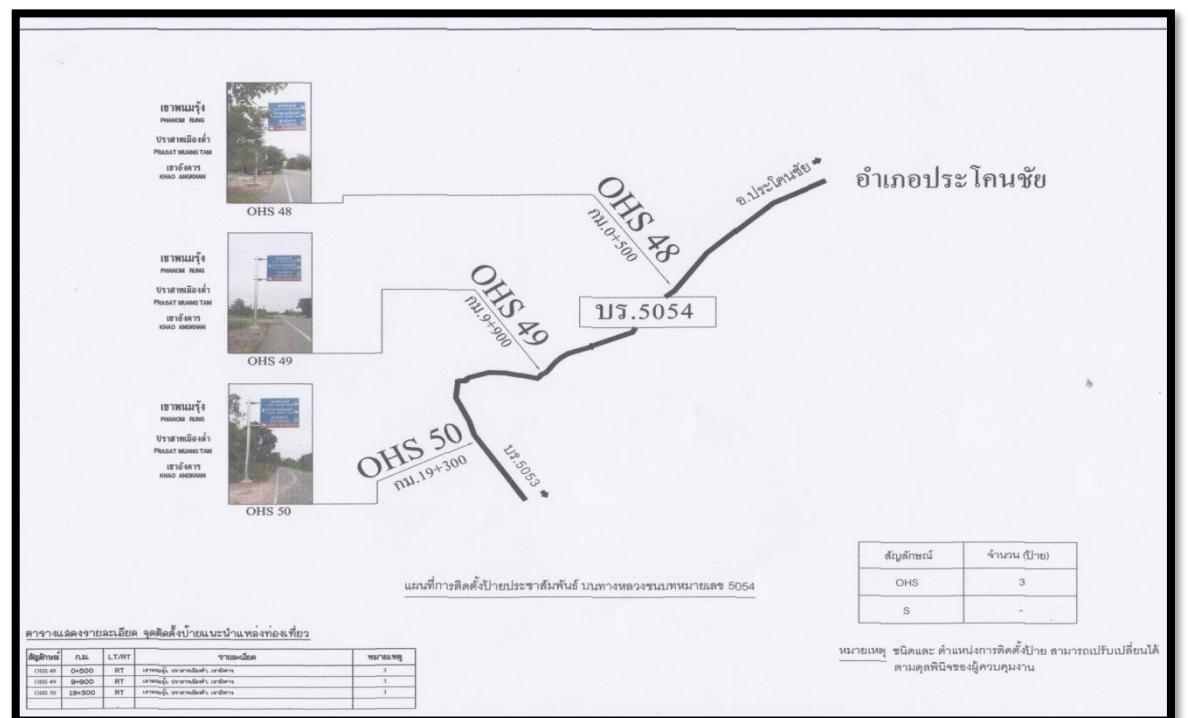

12) ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข บร. 2044 ตำบลตะโกตะพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 99,000 บาท

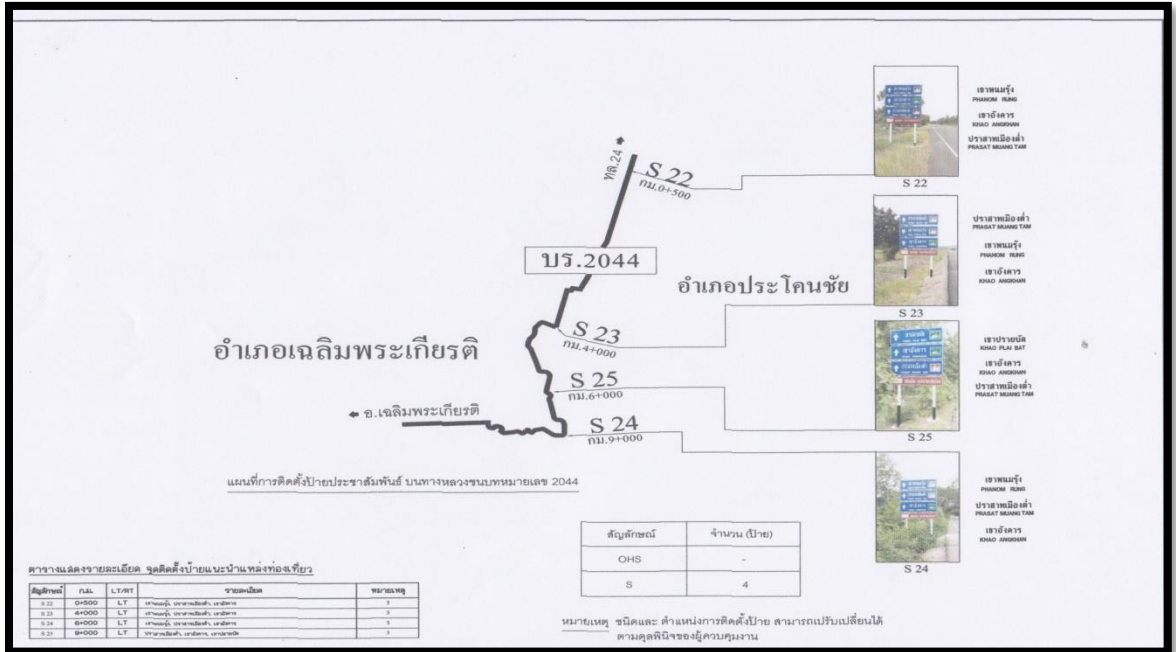


13) ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ถนนสายทางหลวงหมายเลข 2074 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 693,100 บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ติดตามในระดับพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยป้าย Overhang Sing 4 ชุด ป้ายแนะนำ 2 ชุด

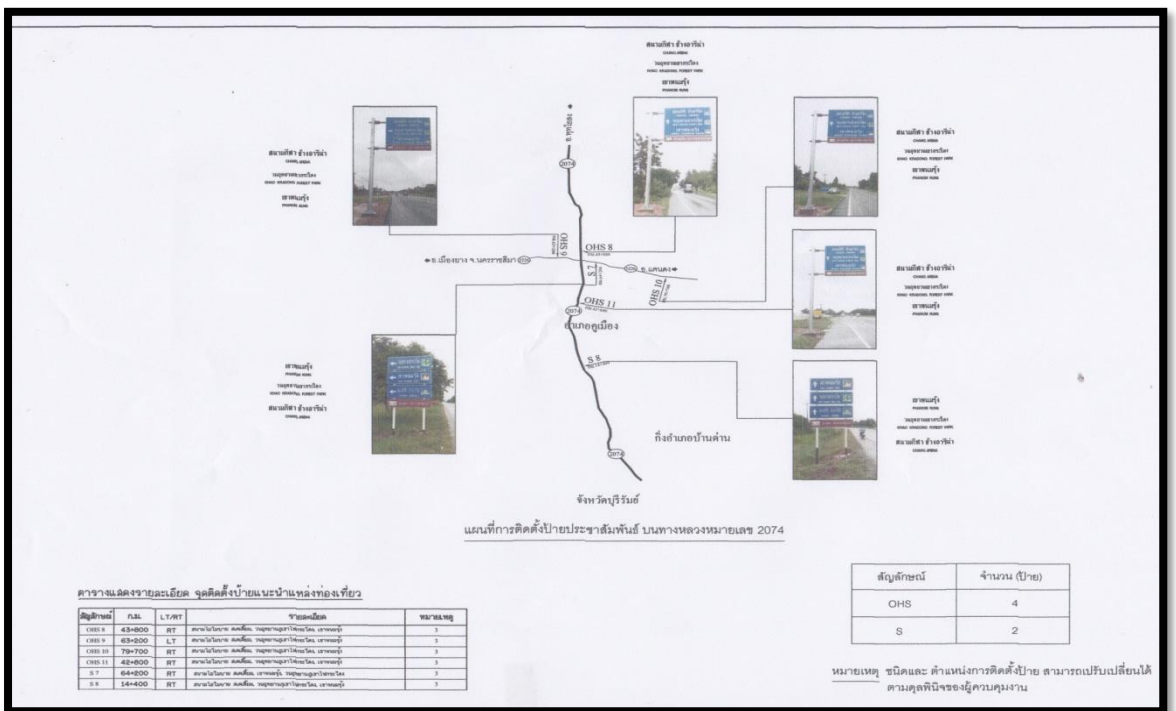





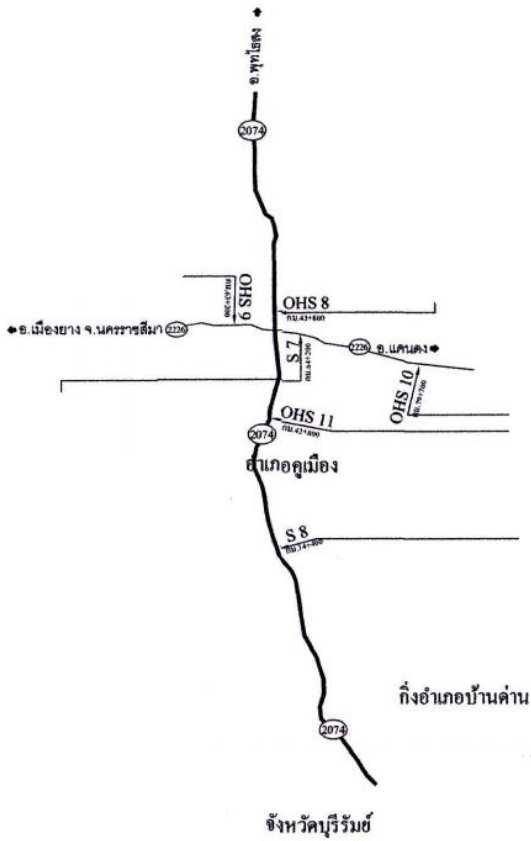

ตารางแสดงรายละเอียด จุดติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว แผนที่การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บนทางหลวงหมายเลข 2074

สัญลักษณ์	ก.ม.	LT/RT	รายละเอียด	หมายเหตุ
OHS 8	43+800	RT	สนามไฮโมบาย สดชื่น, วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เขาพนมรุ้ง	3
OHS 9	63+200	LT	สนามไฮโมบาย สดชื่น, วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เขาพนมรุ้ง	3
OHS 10	79+700	RT	สนามไฮโมบาย สดชื่น, วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เขาพนมรุ้ง	3
OHS 11	42+800	RT	สนามไฮโมบาย สดชื่น, วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เขาพนมรุ้ง	3
S 7	64+200	RT	สนามไฮโมบาย สดชื่น, เขาพนมรุ้ง, วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง	3
S 8	14+400	RT	สนามไฮโมบาย สดชื่น, วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เขาพนมรุ้ง	3

สัญลักษณ์	จำนวน (ป้าย)
OHS	4
S	2

หมายเหตุ ชนิดและ ตำแหน่งการติดตั้งป้าย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน



2. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 1,387,700 บาท ประกอบด้วย

- กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 704,500 บาท

- กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืชอาหารสัตว์ งบประมาณ 683,200 บาท กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามผล การดำเนินโครงการที่ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สนับสนุนพ่อพันธุ์แพะเนื้อลูกผสม 1 ตัว แม่พันธุ์แพะเนื้อลูกผสม 10 ตัว พร้อมเครื่อง สับย่อยพืชอาหารสัตว์ 1 เครื่อง ต่อเกษตรกร 1 ราย จากแม่พันธุ์แพะที่จัดซื้อ 100 ตัว จะผลิตลูกได้ไม่น้อยกว่า 168 ตัว/ปี สามารถสร้างมูลค่าได้ ดังนี้

1. หากลูกแพะที่คลอดเป็นเพศผู้ แล้วนำมาเลี้ยงเป็นแพะขุนจำหน่ายเมื่ออายุ 7-8 เดือน ที่น้ำหนัก 30 กิโลกรัม สามารถคิดรายได้เป็นตัวเงินจากแพะขุนเพศผู้ 50 ตัว ฤดูละ 3,000 บาท เป็นเงิน 150,000 – 157,000 บาท/ปี

2. หากลูกแพะที่คลอดเป็นเพศเมีย แล้วเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์จำหน่ายเมื่ออายุ 7-8 เดือน ที่น้ำหนัก 25 กิโลกรัม สามารถคิดรายได้เป็นตัวเงินจากแม่พันธุ์จำหน่าย 50 ตัว ฤดูละ 4,500 – 5,000 บาท เป็นเงิน 225,000 บาท/ปี

3. เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยคอกได้ปีละไม่น้อยกว่า 20 ตัน/ปี (จากการถ่ายมูลของแพะ วันละ 0.5 กิโลกรัม/ตัว) มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 20,000 บาท/ปี สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ และเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดต้นทุนการผลิตในการทำการเกษตร และยังสามารถนำมูลสัตว์ลดการใช้ปุ๋ยเคมี









### จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีก่อนที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์



## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสุรินทร์ มีโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 85,441,010 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 70,981,942.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.08 ยังไม่เบิกจ่าย 223,900 บาท ผลดำเนินงานแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณต่อไป
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	9,659,388	9,382,788	97.14	-	9,659,388
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	830,800	830,800	100	-	830,800
4	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	15,740,000	15,740,000	100	-	15,740,000
5	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	13,500,000	995,000	100	-	13,500,000
6	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง ตามเส้นทางอารยธรรมขอม	773,980	773,980	100	-	773,980
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล	383,630	383,630	100	-	383,630
10	โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ	1,921,500	1,862,774	97	-	1,921,500
11	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน ของภาครัฐและเอกชน	1,793,000	1,739,300	97	-	1,793,000
13	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม เพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน	25,398,912	25,398,912	100	-	25,398,912
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ	500,000	386,120	77.22	113,880	500,000
	รวมทั้งสิ้น	85,441,010	70,981,942.47	83.08	223,900	85,441,010



## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการจัดสรร งบประมาณดำเนินการ 4 โครงการ งบประมาณ 879,401,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 475,807,978.15 บาท ร้อยละ 59.46 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 324,451,807.33 บาท งบประมาณพับไป 79,141,214.52 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพับไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรีรินทร์	707,851,600	314,959,054.55	51.63	295,042,807.33	76,252,638.12
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	29,166,100	26,961,986	100	-	1,238,514
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	5,972,400	6,000,609.62	100	-	316,490.38
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	136,410,900	127,886,327.98	81.30	29,409,000	1,333,572.02
	รวมทั้งสิ้น	879,401,000	475,807,978.15	59.46	324,451,807.33	79,141,214.52

## 1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีนทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีนทร์มีกิจกรรม งบประมาณ 682,685,835.88 บาท มีผลการเบิกจ่าย 371,761,488.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.81 ดำเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ มี 28 รายการ งบประมาณ 465,371,635.88 บาท มีผลการเบิกจ่าย 228,633,621.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.13 มีรายการที่คาดว่าจะต้องขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่

- รายการ แก้มลิงหนองแต้ ตำบลแจนแวน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง งบประมาณ 8,142,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 110,956.10 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 4,034,643.90 บาท เนื่องจากมีปัญหาการปรับจ้าง ผู้รับจ้างเดียวกัน และเป็นพื้นที่ที่ยังมีน้ำและเกษตรกรไม่ยินยอมให้สูบน้ำ

- รายการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านนาทอง ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง งบประมาณ 10,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 213,491.65 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 4,696,328.35 บาท เนื่องจาก ผู้รับจ้างรายเดียวกับ รายการ แก้มลิงหนองแต้ ตำบลแจนแวน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสุรินทร์

- รายการ แก้มลิงกุดมน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง งบประมาณ 3,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,709,697 ยังไม่เบิกจ่าย 13,210,028 บาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจาก เป็นงานจ้างเหมา ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 50

- รายการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งราม ตำบลผักไหม อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่การเกษตร และเกษตรกรขอชะลอหลังการเก็บเกี่ยว

- รายการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง งบประมาณ 14,467,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย 25,990 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 8,500,748 บาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากพื้นที่การเกษตร และเกษตรกรขอชะลอหลังการเก็บเกี่ยว

- รายการ แก้มลิงหนองโนนยางร้าง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง งบประมาณ 15,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,973,929.66 ยังไม่เบิกจ่าย 4,363,134.34 บาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากปัญหาพื้นที่ยังเข้าดำเนินการไม่ได้

- รายการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำฝายโชคชัย (รำแดง) ตำบลกุดหวาย อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (เงินเหลือจ่าย) มีผลการเบิกจ่าย 4,863.25 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 27,957,936.75 บาท เนื่องจากเป็นพื้นที่เพาะปลูก ยังไม่ส่งเข้าทำงาน

- รายการ แก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลประตู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (เงินเหลือจ่าย) มีผลการเบิกจ่าย 690,710.80 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 29,252,809.20 บาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากขอหยุดงาน ผลการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 80



- รายการ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาของคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำอำปี้ล ตำบล เหนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ใช้เงินยกเล็ก) มีผลการเบิกจ่าย 4,863.25 ยังไม่เบิกจ่าย 9,933,136.75 บาท ขอยขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ 21 พ.ค. 2561 – 15 ก.พ. 2562 เนื่องจาก ฝนตกจึงไม่สามารถขุดอัดคันคลองได้

- รายการ แก้มลิงหนองตาลิง พร้อมอาคารประกอบบ้านโนนยาง ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ (ใช้เงินยกเล็ก) มีผลการเบิกจ่าย 3,745,141.21 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 12,115,858.79 บาท ขอยขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 35

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหม่ ประชากรชนกรชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 135,281,800 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 61,732,923 บาท งบประมาณพบไป 13,066,177 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ประชากรชนกรชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 7,851,600 บาท มีผลเบิกจ่าย 7,239,090 บาท งบประมาณ พบไป 612,510 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร งบประมาณ 117,000,000 บาท มีผลการ เบิกจ่าย 56,169,753.80 บาท งบประมาณพบไป 58,707,266 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

## 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร ได้แก่

2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ 663,500 บาท ยกเล็ก ไม่ดำเนินการ งบประมาณพบไป 663,500 บาท

2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 16,514,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย 16,280,986 บาท เงินพบไป 14 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ งบประมาณ 10,719,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 9,999,000 บาท เงินพบไป 18,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาระบบขนส่งเนื้อเย็นคุณภาพ งบประมาณ 817,000 บาท มีผล การเบิกจ่าย 260,000 บาท เงินพบไป 557,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.5 กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 284,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 284,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.6 กิจกรรมหลักที่ 6 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 168,000 บาท มีผล การเบิกจ่าย 156,000 บาท ดำเนินการแล้ว

### 3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน  
ได้แก่

3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงใหม่ให้ได้คุณภาพและผลผลิต  
รังใหม่สูง งบประมาณ 250,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 248,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวใหม่ให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ  
809,900 บาท มีผลเบิกจ่าย 753,6589.10 มีผลการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนไหมแบบแปลงใหญ่ด้วย  
พลังงานทดแทน งบประมาณ 2,087,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 1,925,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาด้านแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME 3  
กลุ่ม และมีรายการที่ใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณ 2,185,500 บาท มีผลเบิกจ่าย 2,548,450.52 มีผล  
การเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

3.5 กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ  
640,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 540,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

### 4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่า  
สู่สากล ได้แก่

4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่น  
แก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณรวม 13,430,900 บาท  
มีผลการเบิกจ่าย 13,330,000 บาท งบประมาณพับไป 100,900 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ดำเนินการแล้วเสร็จ  
งบประมาณ 28,800,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 25,145,000 บาท งบประมาณพับไป 146,000 บาท  
ยังไม่เบิกจ่าย 3,400,000 บาท

4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน  
งบประมาณ 88,180,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 86,494,367.98 บาท งบประมาณพับไป 1,003,632.02  
บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของภาครัฐ  
งบประมาณ 6,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 2,916,960 บาท งบประมาณพับไป 83,040 บาท  
ดำเนินการแล้วเสร็จ

## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 60,884,700 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 20,209,161 บาท ร้อยละ 33.29 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 40,492,793.16 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ไม่ขอรับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	41,421,700	200	9,512,595.81	33.29	40,492,793.16
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	34,649,200	-	6,181,395.81	17.84	28,467,788.16
	1.2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	1,382,960	-	821,500	59.90	549,960
	1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	1,555,340	200	1,029,500	66.22	525,140
	1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	3,215,200	-	1,480,200	46.18	1,725,000
	1.5 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช อินทรีย์ (ใช้เงินเหลือจ่าย)	619,000	-	-	-	619,000
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	10,325,000	-	2,187,200	21.18	8,137,760
	2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	4,630,000	-	492,240	10.63	4,137,760
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	720,000	-	719,960	100	-
	2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว นครชัยบุรีรินทร์ (เหลือจ่าย)	4,000,000	-	-	-	4,000,000
	2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว นครชัยบุรีรินทร์	975,000	-	975,000	100	-
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	8,638,000	-	8,329,851.52	98.26	147,659
	3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่ นครชัยบุรีรินทร์	1,278,600	-	1,124,123.52	99.71	3,259
	3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่นคร ชัยบุรีรินทร์	7,359,400	-	7,205,728	98.04	144,400
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	500,000	-	179,514	35.90	320,486
	รวมทั้งสิ้น	60,884,700	200	20,209,161	33.29	40,492,793.16

## 1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 41,421,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย 9,512,595.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.98 มี 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มี 2 รายการ งบประมาณ 34,649,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 6,181,395.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.84 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 28,467,788.16 บาท มีรายการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนี้

- รายการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำและก่อสร้างระบบกระจายน้ำ บ้านตะแบก ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 29,280,000 บาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 60

- รายการ ขุดลอกแก้มลิงโคกโครง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 5,369,200 บาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 14

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 1,382,960 บาท มีผลการเบิกจ่าย 821,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.90 ยังไม่เบิกจ่าย 549,960 บาท มีรายการที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้

- รายการ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการผลิตข้าวหอมมะลิและการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นตามมาตรฐานอินทรีย์ งบประมาณ 394,000 บาท คั้นเงินงบประมาณ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับฤดูกาลผลิต

- รายการ การติดตามผลการดำเนินงาน การถอดบทเรียน การประชาสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินโครงการ งบประมาณ 155,960 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 115,960 บาท แจกคั้นงบประมาณไม่มีการดำเนินการ ตามรายการข้างต้น

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง งบประมาณ 1,553,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,029,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.22 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 525,140 บาท มีรายการ แจกคั้นงบประมาณ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับกิจกรรม คือ

- รายการ การติดตามผลการดำเนินงาน การถอดบทเรียน การประชาสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินโครงการฯ งบประมาณ 58,140 บาท

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 3,215,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,480,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.18 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 1,725,000 บาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2561

1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์ งบประมาณ 619,000 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

## 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์ มี 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 10,325,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,187,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.18 ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

2.1 กิจกรรมหลักที่ 6 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 4,630,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 492,240 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.63 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 4,137,760 บาท เป็นการก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ตามถนนสายต่างๆ และมีรายการที่รอการอนุมัติอนุญาต แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ ดังนี้

- รายการ ก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ถนนสายทางหลวงหมายเลข 214 อำเภอทาบเชิง – อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

- รายการ ก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ถนนสายทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 2 ชุด

- รายการ ก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ถนนสายทางหลวงหมายเลข 226 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 4 ชุด

- รายการ ก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ถนนสายทางหลวงหมายเลข 2077 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 4 ชุด

2.2 กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 720,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 719,960 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.3 กิจกรรมหลักที่ 8 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 4,000,000 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 4,000,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงบประมาณ

2.4 กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 975,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 975,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

## 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 8,638,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 8,329,851.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.26 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 147,659 บาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

3.1 กิจกรรมหลักที่ 10 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่นครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 1,278,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,124,123.52 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.2 กิจกรรมหลักที่ 11 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 7,359,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 7,205,728 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.04 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 144,400 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ



กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

**งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561**

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์

- รายการ การส่งเสริมการผลิตพืชผักอินทรีย์ด้วยสารเสริมประสิทธิภาพจากพืชสมุนไพร และถ่านไบโอชาร์ งบประมาณ 253,5000 บาท บ้านสำโรง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



ถ่านชีวภาพสู่ภัยแล้ง “ไบโอชาร์โคล”

การใช้ถ่านชีวภาพไบโอชาร์ (Biochar) ในการปรับปรุงดิน ถ่านชีวภาพหรือไบโอชาร์ (Biochar) คือวัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอนผลิตจากการให้ความร้อนมวลชีวภาพ (Biomass) โดยไม่ใช้ออกซิเจนหรือใช้น้อยมาก เรียกกระบวนการนี้ว่า การแยกสลายด้วยความร้อน (Pyrolysis)

คุณสมบัติถ่านไบโอชาร์ 1. องค์ประกอบของธาตุคาร์บอน (C) 2. ความคงตัว สลายตัวช้า มีอายุการใช้งานยาวนาน ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดโลกร้อน 3. มีพื้นผิวภายในสูง ช่วยดูดซับธาตุอาหารไว้บนพื้นที่ผิวทั้งภายนอกและภายในรูพรุนได้ 4. มีความพรุนสูง ช่วยกักเก็บน้ำ ทำให้ดินมีรูพรุนไม่จับตัวแน่นและเป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์ 5. มีสถานะเป็นประจุลบ ช่วยดูดซับธาตุอาหารที่เป็นประจุบวก ทำให้ดินมีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชอย่างช้าๆ และช่วยปรับค่า pH ของดินและน้ำ



ประโยชน์ของถ่านไบโอชาร์ สามารถสรุปได้ 4 ประการหลัก ดังนี้ 1. ช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เนื่องจากถ่านชีวภาพสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศในระยะยาวได้ด้วยการกักเก็บคาร์บอนในดิน 2. ช่วยปรับปรุงดินและผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากเมื่อนำถ่านชีวภาพลงดินลักษณะความเป็นรูปพรุนของถ่านชีวภาพจะช่วยกักเก็บน้ำและอาหารในดินและเป็นที่อยู่ให้กับจุลินทรีย์สำหรับทำกิจกรรมเพื่อสร้างอาหารให้ดิน เมื่อดินอุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 3. ช่วยผลิตพลังงานทดแทน เนื่องจากกระบวนการผลิตถ่านชีวภาพจากมวลชีวภาพด้วยการแยกสลายด้วยความร้อนจะให้พลังงานชีวภาพที่สามารถใช้เพื่อเป็นพลังงานทดแทนเพื่อการขนส่งและในกระบวนการอุตสาหกรรมได้ 4. ช่วยในกระบวนการจัดการของเสียประเภทอินทรีย์วัตถุได้ เนื่องจากเทคโนโลยี ไบโอชาร์มีศักยภาพในการกำจัดของเสียที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นมิตรได้

**การปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีปรับปรุงดินโดยวิธีธรรมชาติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของปุ๋ยหมัก**

1. ชนิดของมูลสัตว์ที่นำมาช่วยเร่ง ขั้นตอนกระบวนการย่อยสลาย
2. วัสดุอินทรีย์ (พืชสด/พืชแห้ง) ที่นำมาใช้ทำปุ๋ยหมัก การใช้เศษหรือพืชหลายชนิดช่วยให้มีชนิดและปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยหมักเพิ่มขึ้น
3. วิธีการ หรือกระบวนการขั้นตอนการทำปุ๋ยหมัก


จาก กรมวิชาการเกษตร (2549) ได้กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ พบว่า

วัสดุอินทรีย์	ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส (total P2 O5) จากการอ้างอิง	ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส (total P2 O5) จากการทดสอบ
มูลโคกับเปลือกถั่วลิสง	ไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์	3.44 เปอร์เซ็นต์
มูลโคกับผักตบชวา	ไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์	2.84 เปอร์เซ็นต์
มูลโคกับใบกระถินแห้ง	ไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์	2.52 เปอร์เซ็นต์
มูลโคกับกระถินเทพา	ไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์	2.45 เปอร์เซ็นต์

แสดงว่าปุ๋ยหมักที่ได้มีคุณภาพในเรื่องของปริมาณธาตุฟอสฟอรัส





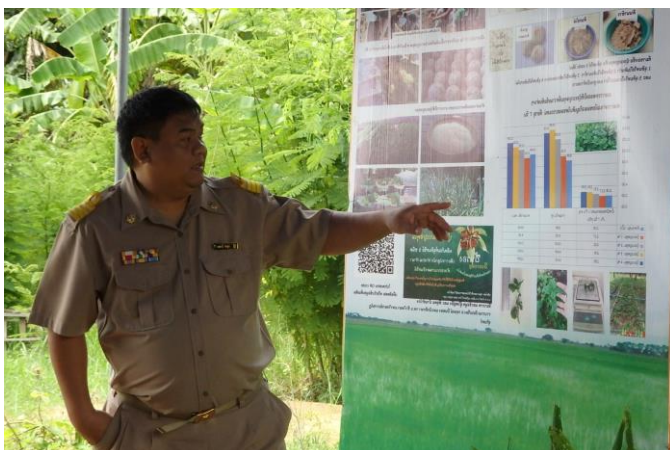










สภาพการเปลี่ยนแปลงของปุ๋ยก้อนเบญจคุณ



วันที่ 1



วันที่ 3-5



วันที่ 15



ปลีกล้วยที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเบญจคุณ



ปลีกล้วยที่ใช้ปุ๋ยเบญจคุณ



2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนทร์  
กิจกรรมหลัก ยกกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว  
- ก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ถนนสายทางหลวงชนบทหมายเลข  
สร 2077 อำเภอสังขระ จังหวัดสุรินทร์ 2 ชุด งบประมาณ 16,800 บาท



## คณะผู้ติดตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1



ชื่อ นางพรทิพย์ ยุทธวาริชัย  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน  
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
โทร/โทรสาร 0 4424 3090  
สป.มท. 36601  
E-mail : osm\_ne1@moi.go.th



ชื่อ นางสาวอรุณี ชาญหัด  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ  
แผนชำนาญการ  
โทร/โทรสาร 0 4424 3090  
สป.มท. 36601  
E-mail : osm\_ne1@moi.go.th.th



ชื่อ นางสาวไชตรีศ มีอำนาจ  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
ปฏิบัติการ  
โทร/โทรสาร 0 4424 3090  
สป.มท. 36601  
E-mail : osm\_ne1@moi.go.th



ชื่อ นางสาวอิสริยา เดียงวิมลรัตน์  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ  
แผนชำนาญการ  
โทร/โทรสาร 0 4424 3090  
สป.มท. 36601  
E-mail : osm\_ne1@moi.go.th.th



ชื่อ นางสาวทองคำ รักวงษ์  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์  
นโยบายและแผน  
โทร/โทรสาร 0 4424 3090  
สป.มท. 36601  
E-mail : osm\_ne1@moi.go.th



ชื่อ นางสาวนัฐวรรณ หลงศรี  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์  
นโยบายและแผน  
โทร/โทรสาร 0 4424 3090  
สป.มท. 36601  
E-mail : [osm\\_ne1@moi.go.th.th](mailto:osm_ne1@moi.go.th.th)



ชื่อ นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์  
นโยบายและแผน  
โทร/โทรสาร 0 4424 3090  
สป.มท. 36601  
E-mail : osm\_ne1@moi.go.th



ชื่อ นางสาวสุกัญญา อิมพิมพ์  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์  
นโยบายและแผน  
โทร/โทรสาร 0 4424 3090  
สป.มท. 36601  
E-mail : osm\_ne1@moi.go.th



## ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถนนมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด  
นครราชสีมา 30000  
โทร/โทรสาร : 0 4424 3090  
สป.มท. 36601 E-mail : osm\_ne1@moi.go.th  
เว็บไซต์ : <http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/>
